



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.4

Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании

часть 3

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 ЭТАП 1. Формирование заказов ТОРО на основе регламентов ППР	
4 ЭТАП 2. Включение заказов ТОРО в годовой план-график воздействий на ПА	6
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Правила отзыва и переноса заказов.
2. Принципы разнесения затрат, возникающих при выполнении заказа.
3. Правила проверки заказа по наполнению МТР, операциями, рабочими местами (исполнителями).
4. Действия, которые необходимо предпринять при отсутствии МТР и исполнителей к требуемой дате выполнения заказа.
5. Правила расчёта затрат по заказу.
6. Принципы синхронизации заказов по загрузке ресурсов, КТГ, остановов ПА.
7. Как и в каких случаях должна выполняться синхронизации заказов между службами/подразделениями.
8. Как и в каких случаях заказы создаются вручную.
9. Условия создания заказов на восстановление ОФ и закупки новых компонентов.
10. Статусную схему согласования программы ППА.
11. Принцип объединения заказов из сообщений по КИПиА.
12. Расчёт рабочего времени исполняющих рабочих мест.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Отзывать заказы из предварительного плана-графика.
2. Переносить время выполнения заказов в плане-графике.
3. Проверять присвоение заказу СПП-элемента.
4. Проверять заказы на доступность МТР и исполнителей работ к требуемой дате.
5. Менять МТР и исполнителей в заказах.
6. Проверять наличие и заносить информацию в заказ для расчёта его полной стоимости.
7. Синхронизировать заказы со смежными службами.
8. Создавать заказы для реализации требований ЭПБ, закупки РПМ, и т.п.
9. Формировать графики потребности в закупке компонентов и восстановления ОФ.
10. Выявлять в системе заказы, нуждающиеся в корректировке после согласования.
11. Проверять доступное время исполняющих рабочих мест .

ВВЕДЕНИЕ

На первом этапе формирования годовой программы ППА мы проверили на актуальность все необходимые данные и смоделировали предварительный план ППА. Он дал нам ориентировочное значение КТГ парка, которое будет достигнуто при выполнении всех работ, включенных в план, но не отразил информацию о затратах, которые требуются для выполнения этих работ. Кроме того, в предварительный план не вошли некоторые работы, связанные с закупкой РПМ, выполнением требований ЭПБ и т.п., их тоже нужно включить в годовой план-график.

В этом учебном модуле мы рассмотрим второй этап процесса годового планирования. Нам предстоит оценить бюджет, который потребуется для выполнения всех работ, включенных в программу ППА на год. Для решения этой задачи нам будет необходимо сформировать все необходимые заказы, которые должны быть выполнены, после чего рассчитать, каким при этом будет КТГ и как распределится бюджет по центрам затрат Компании.


На этом этапе мы должны учесть:

- планируемые длительные остановки ПА;
- ввод в эксплуатацию, списание ПА в течение года;
- время и продолжительность сезонных простоев ПА;
- стоимость, доступность и количество требуемых МТР и подрядчиков для выполнения каждого заказа.

Этапы и итерации годового планирования




ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

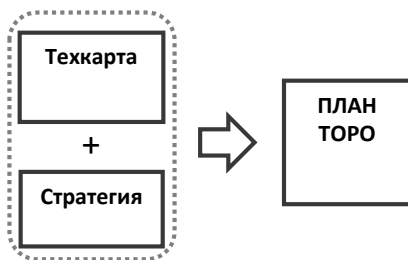

РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.


ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.


ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.


ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.


ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



РЕЗУЛЬТАТ:


Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

ЭТАП 2. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ ППА

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

(с учетом предварительных ориентиров)


ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

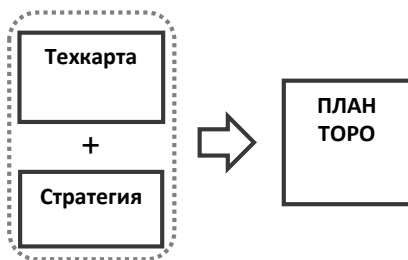

РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг с длительным сроком поставки/исполнения


Какие воздействия будут выполняться?
Какие будут затраты?



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.


ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.


ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА




РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

Цель этого этапа – передать расчётный КТГ для производственной программы и сформировать предварительные затраты по МВЗ (Цех/участок/парк..) и ЦФО (эл./КИПиА/мех.)

Для этого важно создать только актуальные заказы ТОРО, которые будут помещены в годовой план воздействий на ПА, определить объем работ на год, и выполнить приоритизацию работ.



На этом этапе Планировщик работает с:

- Сообщениями ТОРО (мероприятия по устранению предписаний надзорных органов на планируемый год, заявки на консервацию и расконсервацию ЕО, заявки на диагностику).
- Данные по фактическому выполнению планов воздействий на ПА предыдущего года.
- Графики технологических остановов производственных мощностей.
- Значение оценки технического состояния ПА.
- Заключение по результатам диагностики ПА.

Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

Я понял. Моя задача — рассчитать КТГ, на который будет ориентироваться производство при составлении своих производственных планов, и оценить, сколько денег потребуется на достижение этого КТГ.

В качестве исходной информации на этом этапе я буду использовать актуализированные данные, полученные на первом этапе годового планирования, в т.ч. модель графика ППР.



Планировщик

Да. Но не только!

Нужно учитывать доступность ОФ, МТР, Исполнителей работ и т.д.

Какое-то оборудование будет приобретаться и списываться, консервироваться и вводиться в эксплуатацию.

Безусловно, будут и другие задания, которые нужно учесть в годовой программе.

Дальше мы разберем, какие шаги надо выполнять на данном этапе.




ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Программа сформирована в полном объеме с присвоением СПП элементов (центры затрат)

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?
Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупа компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 1

Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

- Отозвать из предварительного плана работы с учётом консервации, расконсервации, запуска и списания ЕО.
- Включить ранее созданные заказы (текущего года), сроки выполнения которых были перенесены на рассматриваемый годовой период.
- Проверить автоматическое присвоение заказа к СПП-элементу планируемого года.

Актуальный реестр
планов ППР в системе

Предварительный
график ППР

Создание заказов
и сообщений из планов
ТОРО



Планировщик
ТОиР

Заказы ТОРО APP1, ATS1, ADI1:
Планово-предупредительные
• По состоянию
• Диагностика
в статусе «ПЛАН» - Планируется

Сообщения ТОРО по КИП и Метрологии
(вид «AD – КИП/ Метрология»)
в статусе «ОТКР» - открыто


ДАЛЕЕ

Последовательность выполнения:

в первую очередь создаются заказы и графики для основного производственного оборудования, во вторую — для вспомогательного.

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

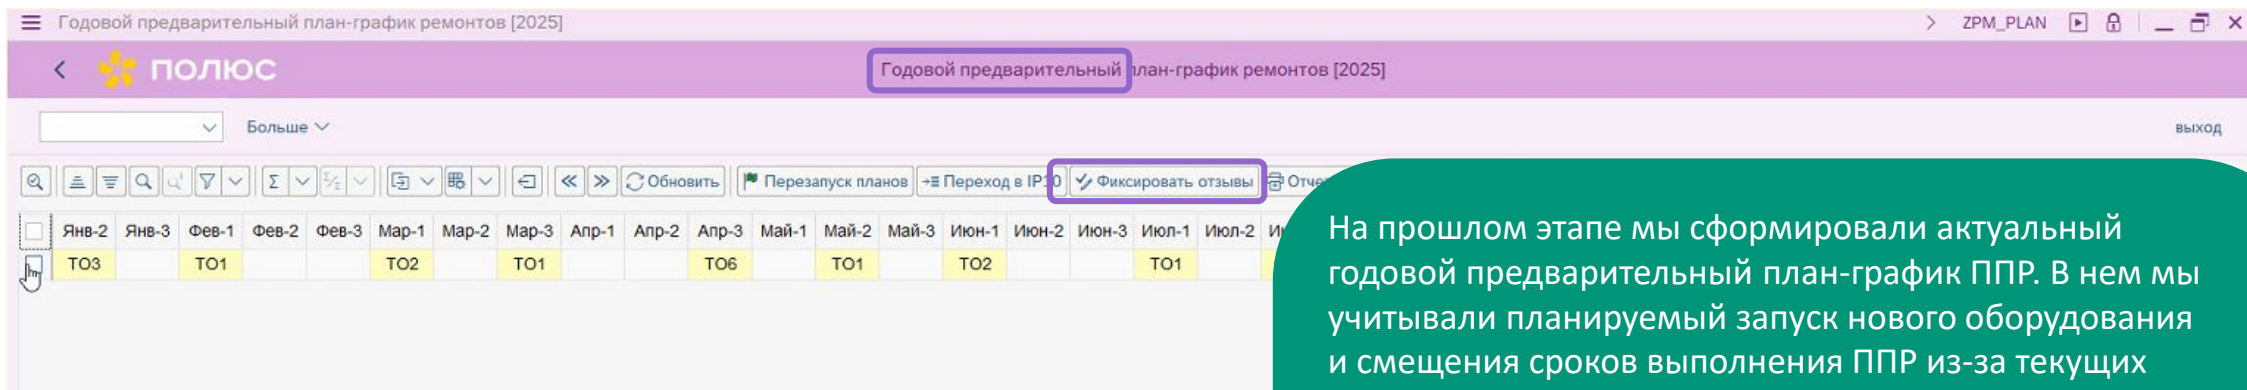


На прошлом этапе мы сформировали актуальный годовой предварительный план-график ППР. В нем мы учитывали планируемый запуск нового оборудования и смещения сроков выполнения ППР из-за текущих простоев.

Теперь приступим к формированию годового графика ремонтов (выполнения годовой программы ППА).

В предварительном план-графике (заказы выделены желтым цветом) нажимаем на кнопку «Фиксировать отзывы».

В итоге мы получим отозванные заказы в годовом графике, которые на графике будут выделены светло-зеленым цветом.

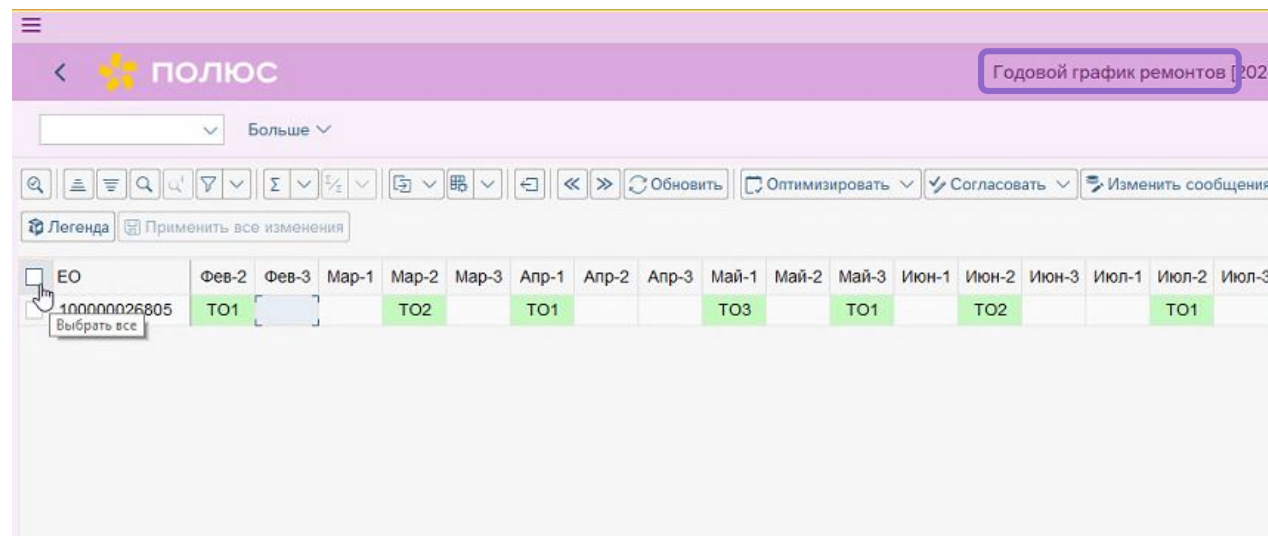

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

[illegible]

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

Бывают ситуации, когда оборудование в планируемом году будет планово выводиться на определённое время из эксплуатации.

Это может происходить в двух случаях:

- Консервация/Расконсервация/Списание.
- Время простоя сезонного характера.

Такую ситуацию смоделировать при запуске плана ТОРО нельзя. Поэтому ППР в этом случае мы должны удалять/смещать вручную после отзыва планов.



Понятно, я должен смотреть планируемые длительные остановки оборудования, и на время этих остановок приостанавливать выполнение заказов, а после окончания остановок продолжать очередные плановые работы или пересматривать планы.



Планировщик

Формирование годовой программы ППА



Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ПОЛЮС

АРМ планировщика ТОиР

Сохранить как вариант...

Больше

Искл. СистСтатусы заказа ТОРО:

Искл. ПользСтатусы заказа ТОРО:

СПП-элемент:

Состояние произв. установки:

По:

По:

По:

По:

Данные местоположения

ЗаводРасположТехнОб:

Ресурс:

По:

По:

Прочие параметры

Выводить оборудование, на которое отсутствуют заказы ТОРО

Отображать при запуске подчиненный отчет по позициям графика

Не заполнять поля структуры ТМ (ускорение работы отчета)

Отображать позиции с фактическими сроками

Отображать позиции по СГ:

Группировка:

Продолжительность простоя в шахматке

Трудоёмкость в шахматке:

Учитывать рем простой предшеств. заказов в оптимизациях (04, 05, 05a и 05b)

* Вывод актуальной наработки на основании:

Плана предупредительного ТОРО

Выводить утвержденный график в шахматке

Включать название модели в группировку оборудования в печатных формах

Режим метролога

Выводить не ремонтные простои

Вариант отображения гл. отчёта:

ISV

Вариант отображ. подч. отчёта:


/YGRAF_V1

Рассмотрим ситуацию с плановыми простоями по причине консервации.

Для того, чтобы увидеть в графике плановые выводы на консервацию, нужно в транзакции ZPM-PLAN отметить поле «Выводить не ремонтные простои»





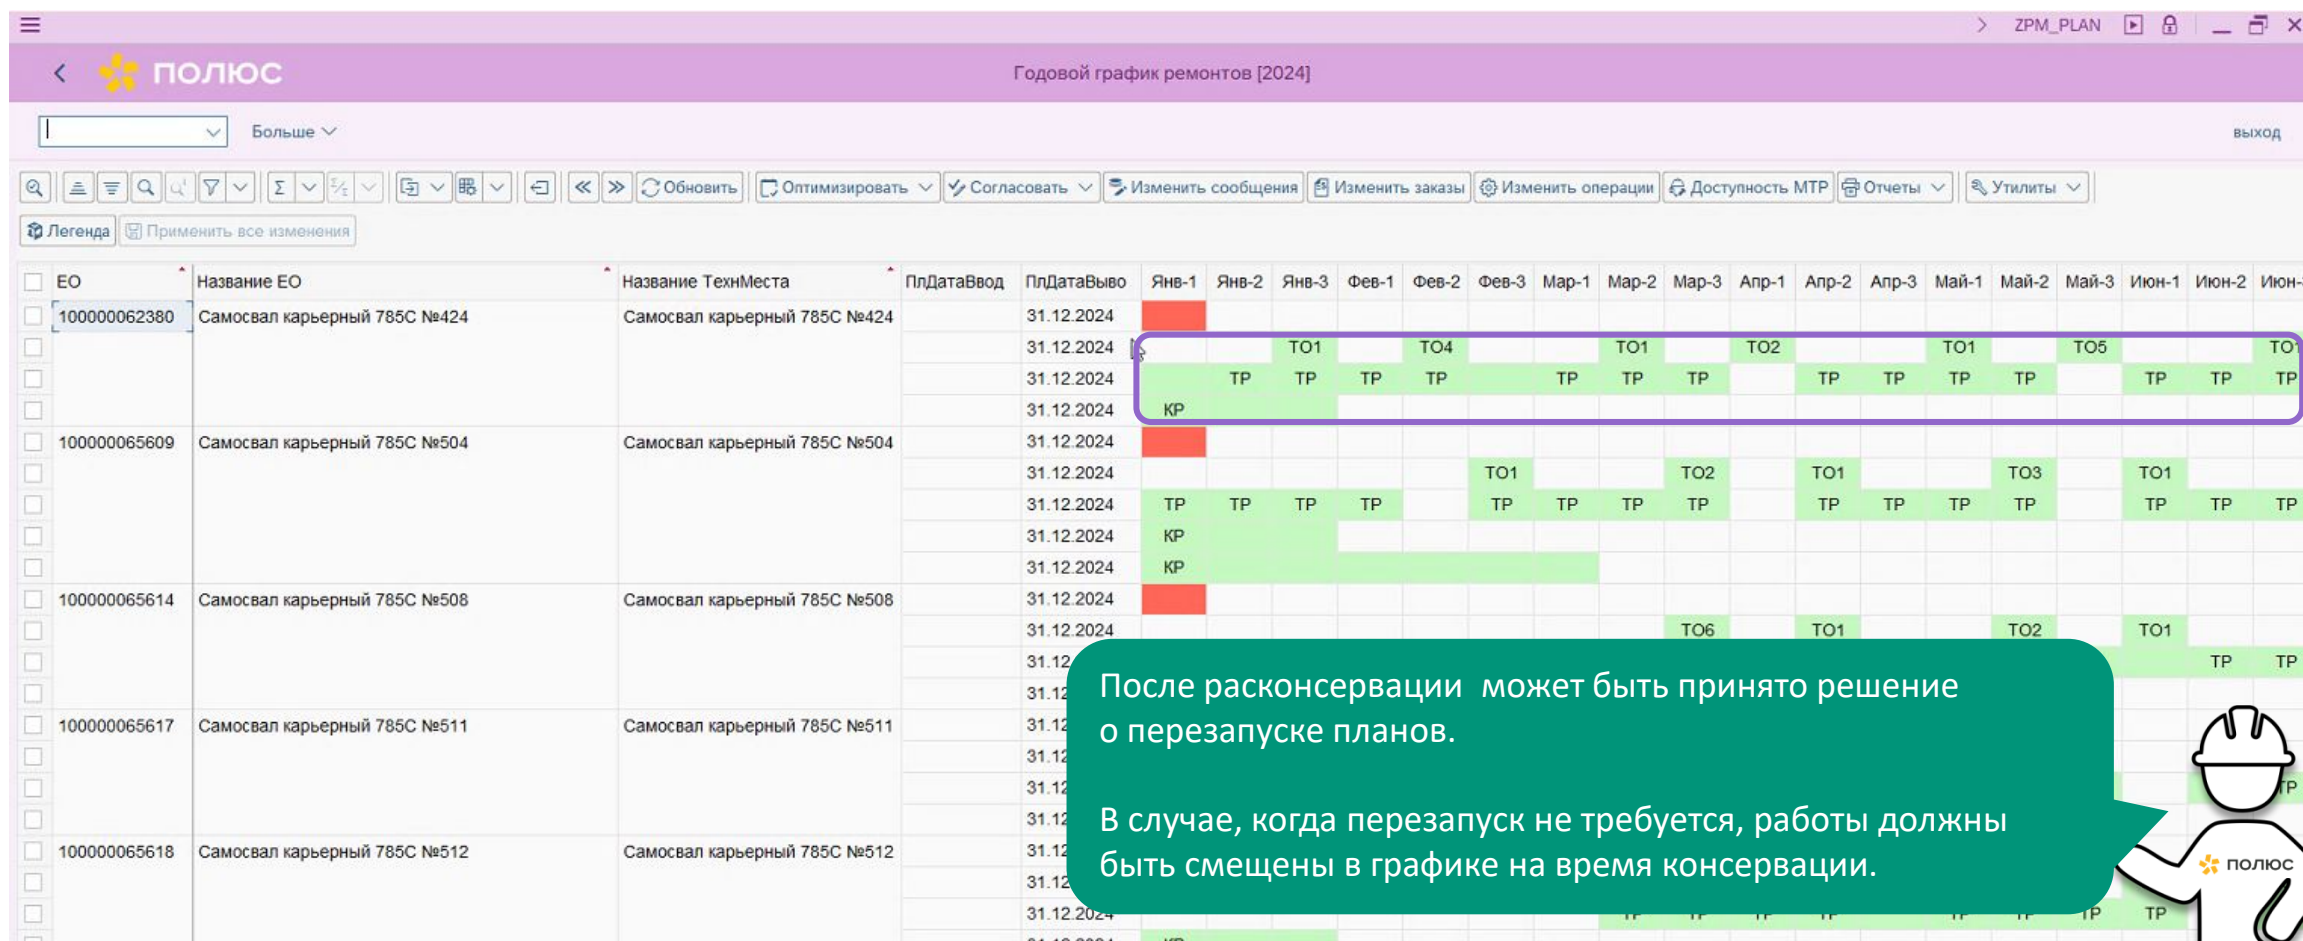



Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

Годовой график ремонтов [2024]: 01.Ручное изм-е сроков

Большее ▾

Легенда Применить все изменения

EO	Название ТехнМеста	ПлДатаВыво	ПланПредуп	ТекстПланаПредупрТОРО	Янв-1	Янв-2	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1
100000065609	Самосвал карьерный 785С №504	31.12.2024									
		31.12.2024	100000058616	Самосвал карьерный 785С №504 ...	ТО1			ТО2		ТО1	
		31.12.2024	100000058616	Самосвал карьерный 785С №504 ...	ТО1			ТО2		ТО1	
		31.12.2024	100000141145	ТР 250мч 785С №504	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР
		31.12.2024	100000141145	ТР 250мч 785С №504	ТР	ТР	ТР	ТР		ТР	ТР

При перемещении одного заказа в графике будут перемещены все заказы этого плана.

В примере мы переместили на одну декаду заказы по ТО и ТР из-за простоя оборудования на консервации.

Применить рез. корректировки



Формирование годовой программы ППА



Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

Если требуется удалить, а не передвинуть заказы, то через функцию «Изменить заказы» выбираем необходимые к удалению заказы.

Так же заказы потребуются к удалению при списании оборудования. Информацию о списании нужно запросить у отдела эксплуатации.

Годовой график ремонтов [2023]

Функции: Легенда, Применить все изменения, Изменить заказы


Изменение заказов ТОРО: список заказов

Число записей (без фильтрации): 3

	Дата ввода	Ввел	Изменил	ПлЗв	ГП	ОтвРаомст	МВЗ	ВидЗкз	Заказ	Краткий текст	БазНачало	БазОконч	ВРТ	Системный статус	ПользСт...	ПользСта...	Мо...
☐	18.02.2023	POSTOVALOV...		1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101153507	ТР 250мч 785С №424	18.12.2023	19.12.2023	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	ПЛАН	
☐	18.02.2023	POSTOVALOV...		1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101153508	ТР 250мч 785С №424	31.12.2023	01.01.2024	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	ПЛАН	
☐	18.02.2023	POSTOVALOV...		1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101154480	ТР 250мч 785С №504	21.12.2023	22.12.2023	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	ПЛАН	

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

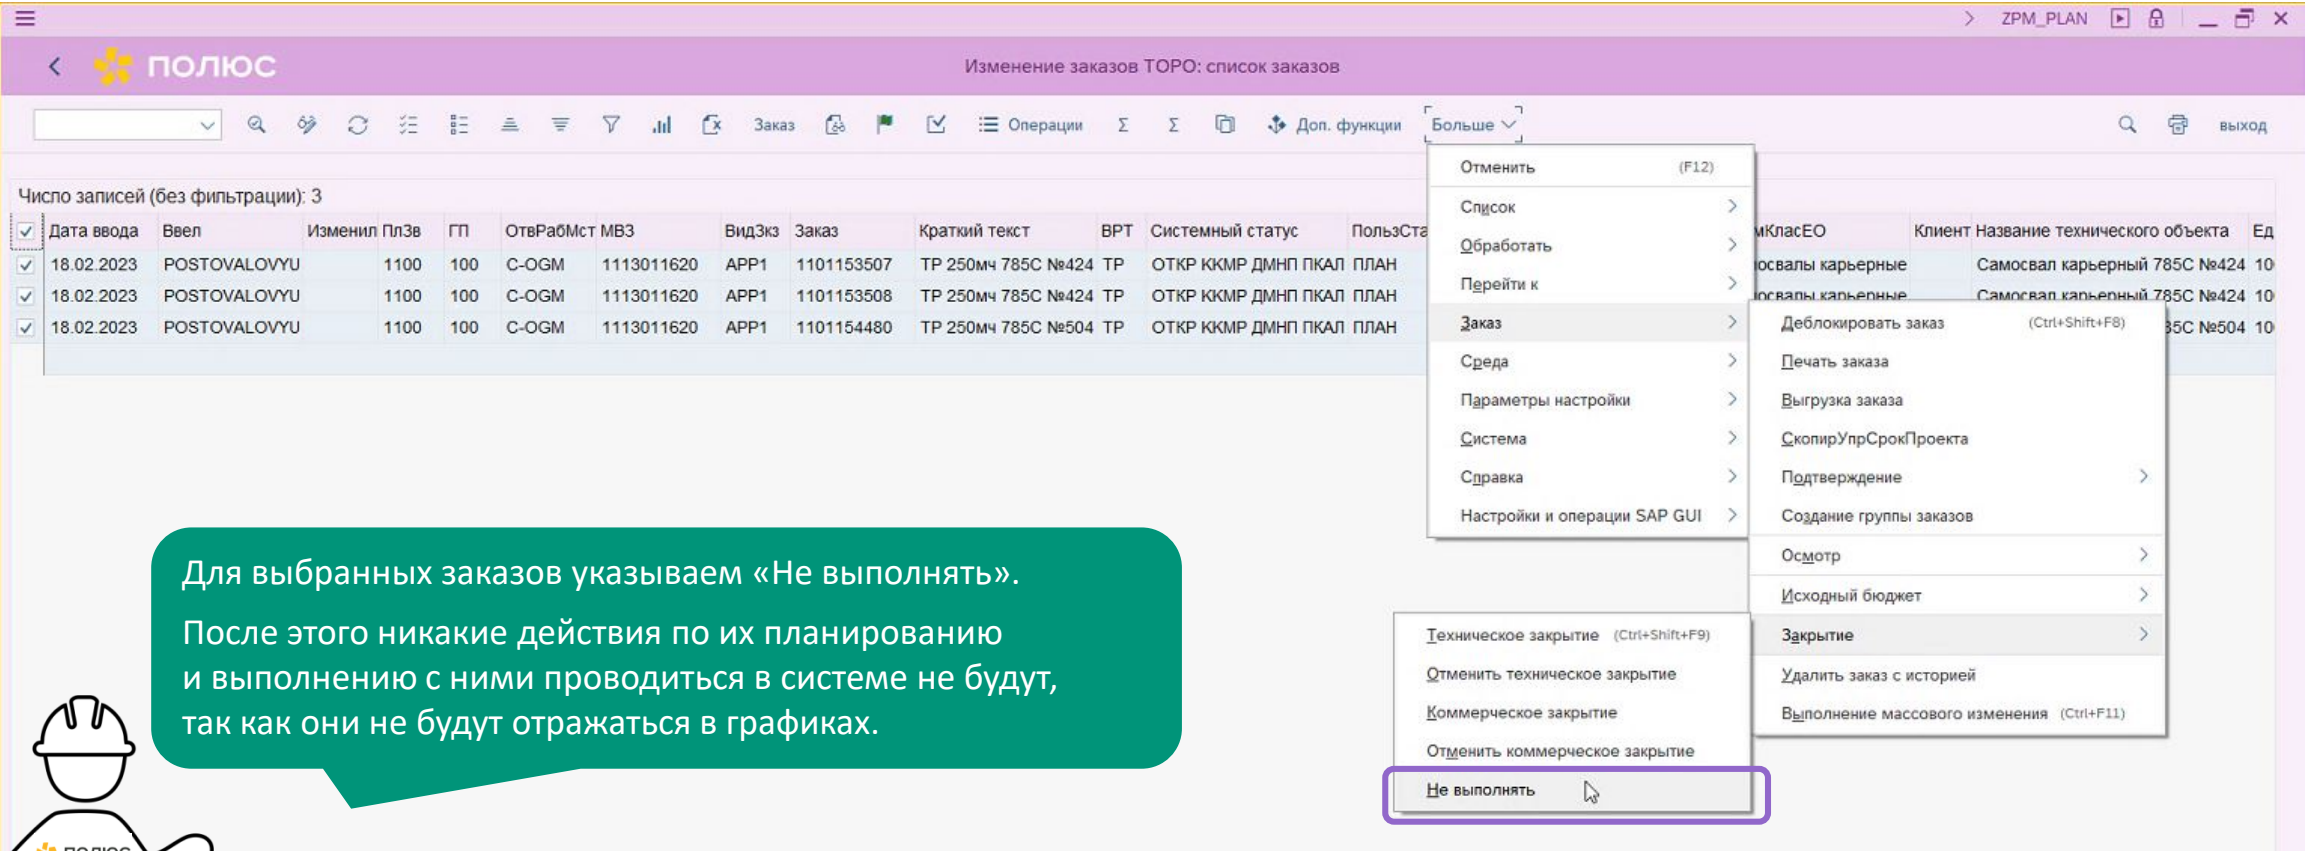

Число записей (без фильтрации): 3

Дата ввода	Ввел	Изменил	ПлЗв	ГП	ОтвРабМст	МВЗ	ВидЗкз	Заказ	Краткий текст	ВРТ	Системный статус	ПользСтат
18.02.2023	POSTOVALOVYU	1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101153507	ТР 250мч 785С №424	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	
18.02.2023	POSTOVALOVYU	1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101153508	ТР 250мч 785С №424	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	
18.02.2023	POSTOVALOVYU	1100	100	C-OGM	1113011620	APP1	1101154480	ТР 250мч 785С №504	ТР	ОТКР ККМР ДМНП ПКАЛ	ПЛАН	

Для выбранных заказов указываем «Не выполнять».
После этого никакие действия по их планированию и выполнению с ними проводиться в системе не будут, так как они не будут отражаться в графиках.


Контекстное меню:

- Отменить (F12)
- Список
- Обработать
- Перейти к
- Заказ**
 - Деблокировать заказ (Ctrl+Shift+F8)
 - Печать заказа
 - Выгрузка заказа
 - СкопирУпрСрокПроекта
 - Подтверждение
 - Создание группы заказов
 - Осмотр
 - Исходный бюджет
 - Заккрытие**
 - Удалить заказ с историей
 - Выполнение массового изменения (Ctrl+F11)
- Среда
- Параметры настройки
- Система
- Справка
- Настройки и операции SAP GUI
- Техническое закрытие (Ctrl+Shift+F9)
- Отменить техническое закрытие
- Коммерческое закрытие
- Отменить коммерческое закрытие
- Не выполнять**

Формирование годовой программы ППА




Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

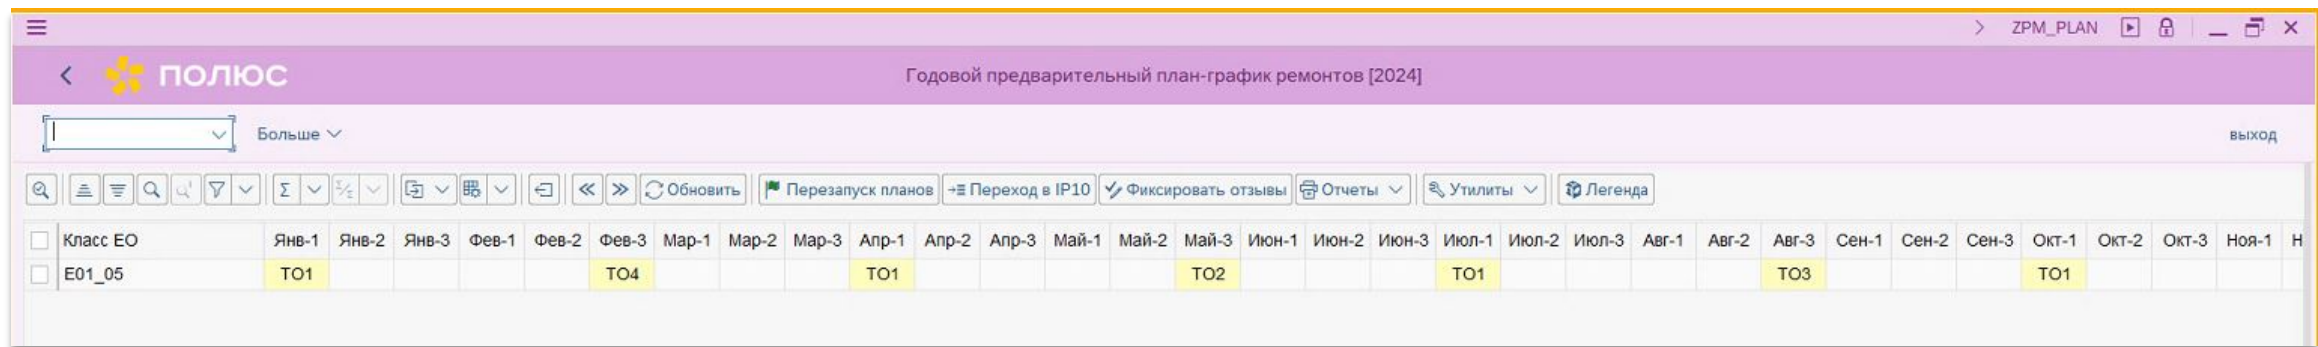

В случае, когда оборудование работает сезонно (Поливооросительная машина работает с мая по октябрь), интервал сезонного простоя в системе не указывается. Планировщик самостоятельно должен уточнить сезонность работы оборудования в зоне своей ответственности у отдела эксплуатации.



Для редактирования графика по срокам выполнения работ нужно отозвать все работы из предварительного плана-графика и сформировать годовой график ремонтов.

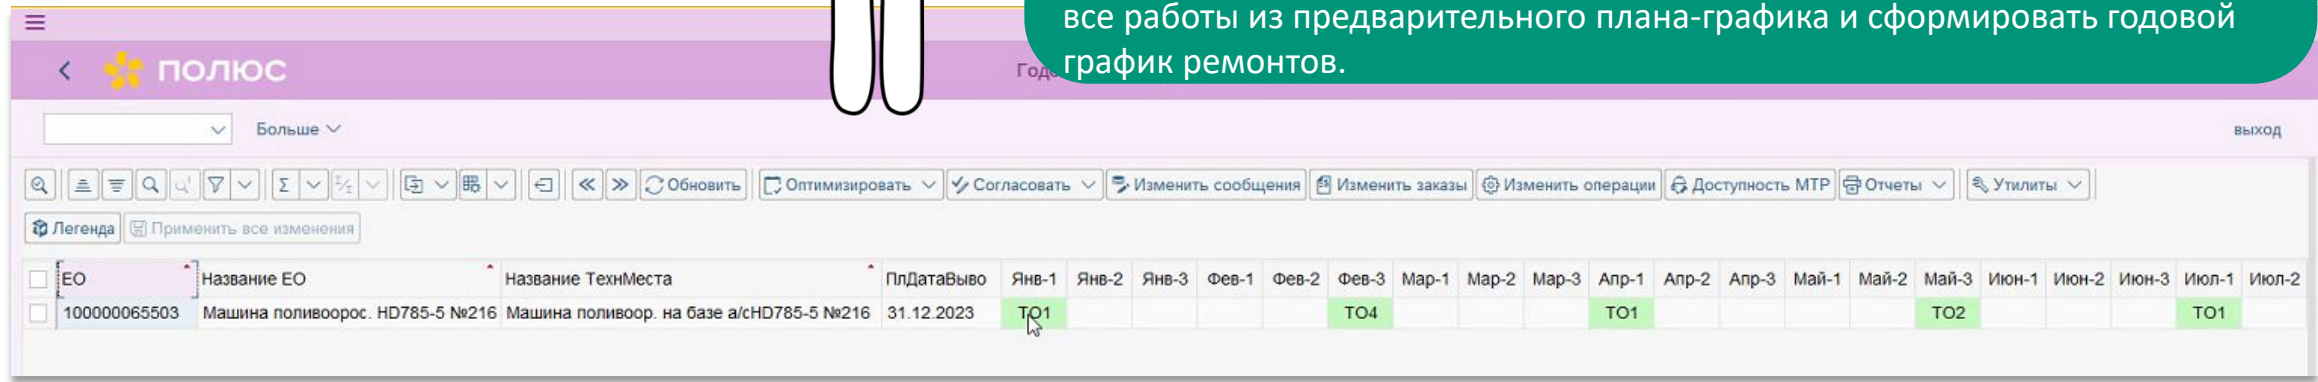

Формирование годовой программы ППА



Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

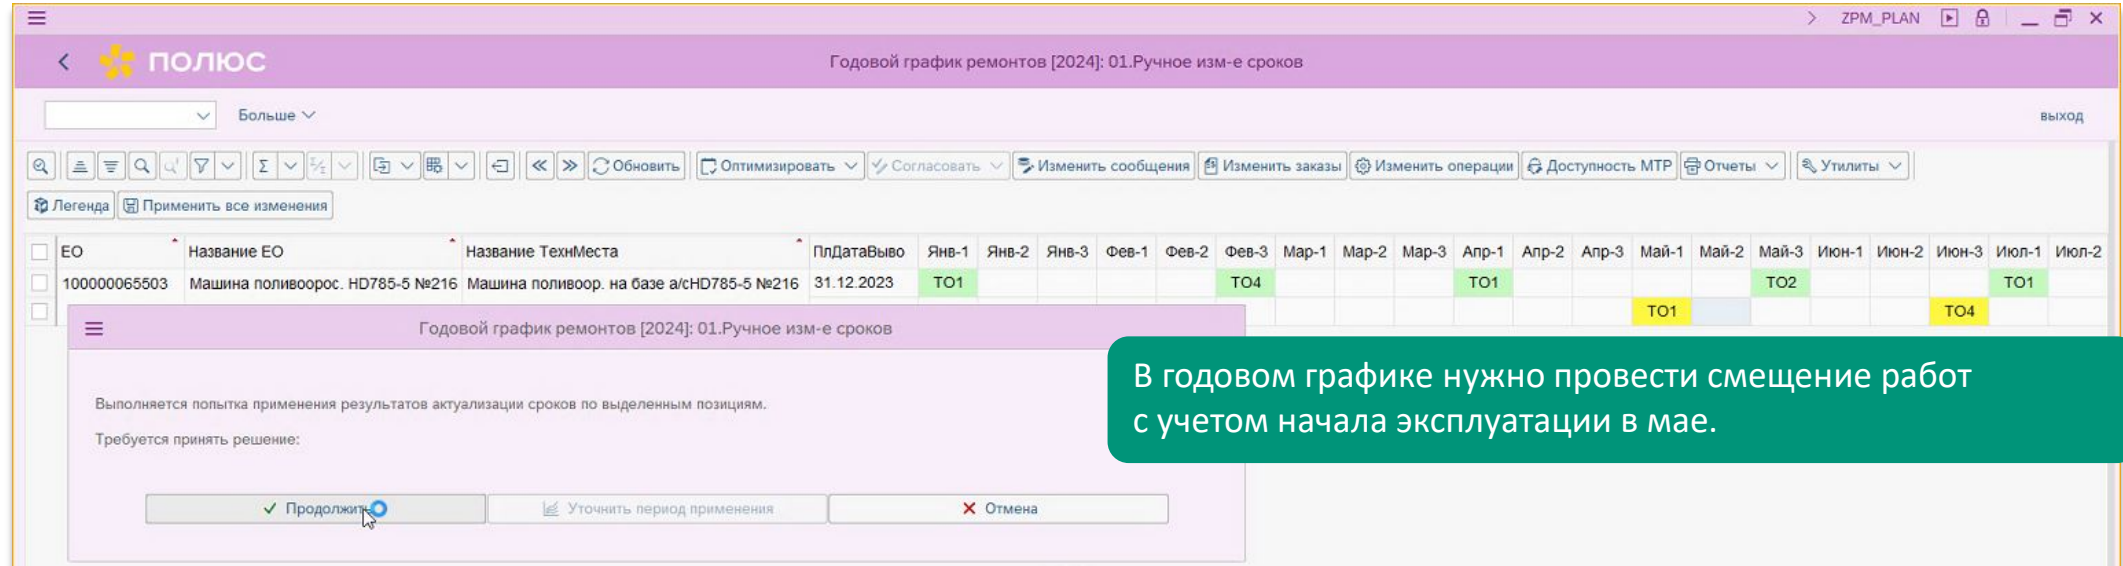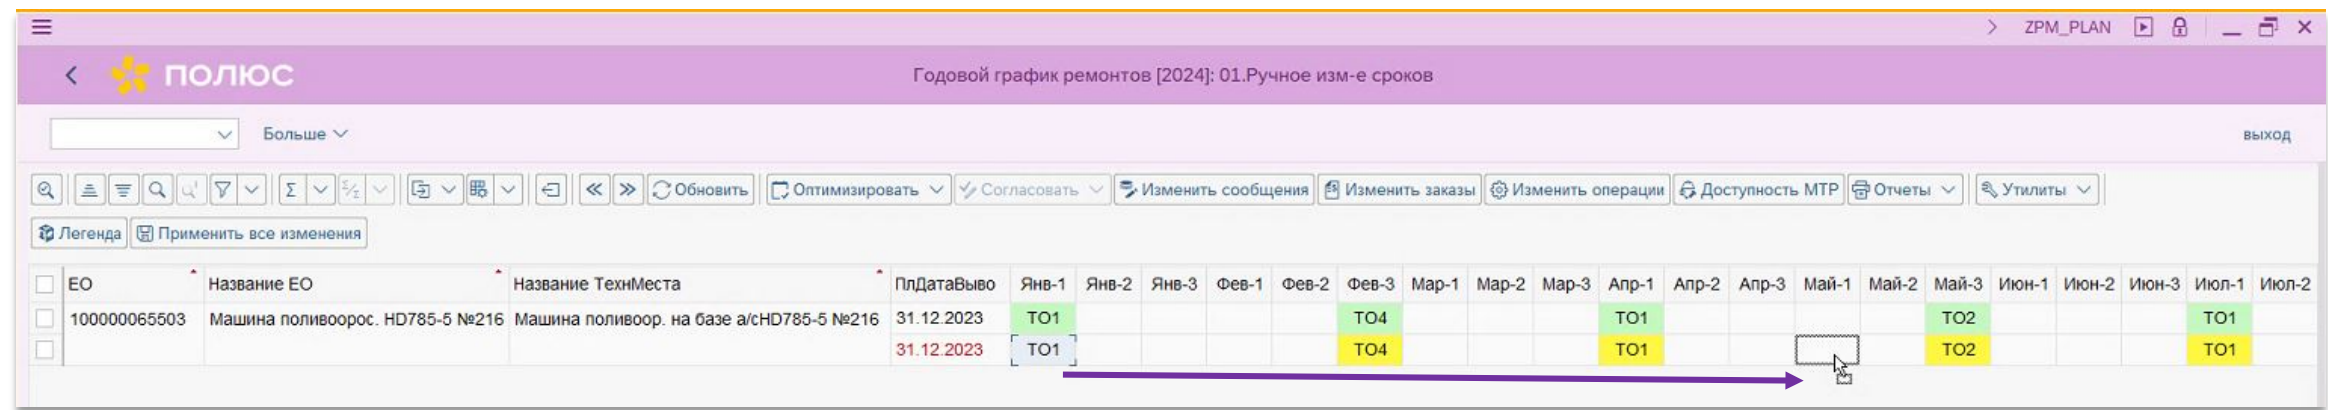

< ПОЛЮС

Годовой график ремонтов [2024]

Большее ▾

Выход

🔍 📄 ⌵ 🔍 ↶ 🔼 ∑ ▼ ½ ▽ 🗒️ 🗂️ 👤 <> Обновить Оптимизировать Согласовать Изменить сообщения Изменить заказы Изменить операции Доступность МТР Отчеты Утилиты

Легенда Применить все изменения

	Янв-3	Фев-1	Фев-2	Фев-3	Мар-1	Мар-2	Мар-3	Апр-1	Апр-2	Апр-3	Май-1	Май-2	Май-3	Июн-1	Июн-2	Июн-3	Июл-1	Июл-2	Июл-3	Авг-1	Авг-2	Авг-3	Сен-1	Сен-2	Сен-3	Окт-1	Окт-2	Окт-3	Ноя-1	Ноя-2	Ноя-3	Дек-1	Дек-2	Дек-3	
☐																																			
☒											ТО1					ТО4						ТО1					ТО2			ТО1					ТО3

Надо удалить работы, которые система спланировала после окончания сезона эксплуатации.

Заказы на ноябрь и декабрь, а так же заказы на 2025 год необходимо удалить вручную.

Все заказы ТОРО Перечень Е... ть сообщения Изменить заказы Изменить операции Доступность МТР Исп. МТР в заказах ТОРО Анализ результатов ППМ

	Приоритет	ТипЗаказа	ВидЗаказа	Заказ	КраткийТекст заказа	СистСтатус	ПользСтатус	ПланДатаНа	ПлВремНач	ПланДатаОк	ПлВремОкон	НовДатаНач	НовВремНач	НовДатаОко	НовВрОкон	ФактНачало	ФактВремя
☐		30	APP1	1101159903	TO1 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	06.01.2024	09:00:00	06.01.2024	18:00:00	06.05.2024	09:00:00	06.05.2024	18:00:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159910	TO4 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	21.02.2024	09:00:00	22.02.2024	17:30:00	21.06.2024	09:00:00	22.06.2024	17:30:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159904	TO1 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	07.04.2024	09:00:00	07.04.2024	18:00:00	07.08.2024	09:00:00	07.08.2024	18:00:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159907	TO2 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	24.05.2024	09:00:00	25.05.2024	00:24:00	24.09.2024	09:00:00	25.09.2024	00:24:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159905	TO1 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	09.07.2024	09:00:00	09.07.2024	18:00:00	09.11.2024	09:00:00	09.11.2024	18:00:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159909	TO3 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	25.08.2024	09:00:00	26.08.2024	13:12:00	25.12.2024	09:00:00	26.12.2024	13:12:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159906	TO1 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	10.10.2024	09:00:00	10.10.2024	18:00:00	10.02.2025	09:00:00	10.02.2025	18:00:00		00:24:00
☐		30	APP1	1101159908	TO2 HD785-5 №216	ОТПР ПКАО ОШОЗ ДМП	МТРН ПЛАН	26.11.2024	09:00:00	27.11.2024	00:24:00	26.03.2025	09:00:00	27.03.2025	00:24:00		00:24:00

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ПОЛЮС

Изменение заказов ТОРО: список заказов

Заказ

Операции

Доп. функции

Больше

Выход

Число записей (без фильтрации): 8

Ввел	Изменил	ПлЗв	ГП	ОтвРабМст	МВЗ	ВидЗкз	Заказ	Краткий текст	ВРТ	БазНачало	БазОконч	Системный статус	П
☒	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159908	ТО2 HD785-5 №2...	ТО2	26.03.2025	27.03.2025	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☒	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159906	ТО1 HD785-5 №2...	ТО1	10.02.2025	10.02.2025	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☒	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159909	ТО3 HD785-5 №2...	ТО3	25.12.2024	26.12.2024	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☒	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159905	ТО1 HD785-5 №2...	ТО1	09.11.2024	09.11.2024	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☐	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159907	ТО2 HD785-5 №2...	ТО2	24.09.2024	25.09.2024	ОТКР ДМНП ПКЛ
☐	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159904	ТО1 HD785-5 №2...	ТО1	07.08.2024	07.08.2024	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☐	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159910	ТО4 HD785-5 №2...	ТО4	21.06.2024	22.06.2024	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ
☐	INCHINSV	INCHINSV	1100	100	C-OGM	1113011823	APP1	1101159903	ТО1 HD785-5 №2...	ТО1	06.05.2024	06.05.2024	ОТКР ДМНП ОШОЗ ПКЛ

Отменить (F12)

Список

Обработать

Перейти к

Заказ

Среда

Параметры настройки

Система

Справка

Настройки и операции SAP GUI

Техническое закрытие (Ctrl+Shift+F9)

Отменить техническое закрытие

Коммерческое закрытие

Отменить коммерческое закрытие

Не выполнять

Наименование класса ЕО

Клиент

Название технического

Машины поливооросительн...

Машина поливоорос...

Машины поливооросительн...

Машина поливоорос...

Деблокировать заказ (Ctrl+Shift+F8)

Печать заказа

Выгрузка заказа

СкопирУпрСрокПроекта

Подтверждение

Создание группы заказов

Осмотр

Исходный бюджет

Закрытие

Удалить заказ с историей

Выполнение массового изменения (Ctrl+F11)

Удаление производим аналогично, как и в случае с удалением при консервации работ.


Используем функцию «Не выполнять» для выделенных заказов.

ПОЛЮС

Формирование годовой программы ППА



Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

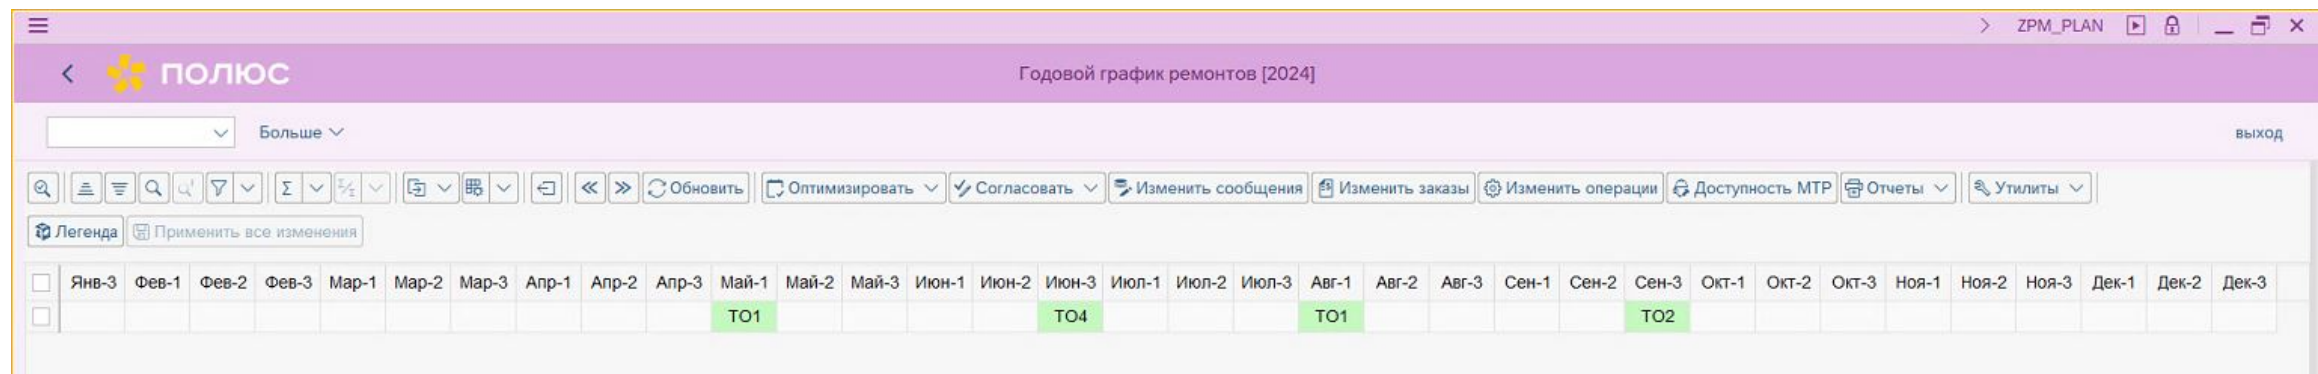

Я выполнил все эти действия с поливооросительной машиной и получил график, в котором есть заказы, выполняемые только во время плановой эксплуатации оборудования.



Планировщик
ТОиР

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

В текущем году есть оборудование, которое простаивало больше запланированного времени, и часть отозванных заказов плана текущего года не успеет быть выполнено. Кроме этого, есть работы, которые не будут выполнены из-за отсутствия запасных частей и других ресурсов.

Как мне поступать с ними?



Планировщик

Такие заказы не нужно удалять и создавать заново (как частный случай — отзывать из предварительного плана, если они были им сформированы из перезапущенного плана) в планируемом году. Необходимо их перенести на конкретную дату.

Если работы в перемещаемом заказе влияют на выполнение других работ, то такие работы необходимо переместить/изменить/удалить. Например, заказы по КР влияют на цикл ТО, и связаны с МД и, возможно, с ТР (замена форсунок и .т.д.)

Если перенос работы (например, ТР по ремонту ступеньки лестницы самосвала) не влияет на другие запланированные работы, то такая работа переносится без изменений в других заказах.





Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ПОЛЮС

ТОРО по ППР 1100812161: изменение: заголовок/общее

Заказ: APP1 1100812161 Ожидание запчастей SMARTROC D65 №19

СистСтатус: ДЕБЛ ДМНП ПКЛЛ ПРВВ ПЛАН ГИП ГОД КОРР МЕС МТРЦ

ДаннЗагол Операции Компоненты Затраты Партнер Объекты ДопДанные Местопол. Планиров. Управление Расширение

Ответственные

ГруппаПлан: 100 / 1100 Механика

*ОтвРабМст: С-ОГМ / 1100 ОГМ

Сообщение: 7100801624

Затраты: 0,00 RUB

*ВидРабТОРО: ТР Текущий ремонт

СостПрУст:

Адрес:

Сроки

БазНачало: 01.01.2024 00:00

БазОконч: 15.01.2024 00:00

Приоритет: 3-средний

Ревизия:

Ссылочный объект

ЕО: 100000061901

ДаннНеисправн КартинаПовреж Сроки сообщения

НачНеиспр: 14.03.2023 14:59:20

КонецНеисп: 00:00:00

Отказ

ПродолжПростоя: 0,00 ч

Первая операция

Операция: Очистка бурового станка

КлчВчсл: Расчет продолжительности

РабМ/Завод: С-CRGRGV / 1100

*УпрвКлюч: РМ01

Вид работ: 121028

ВПС


Указываем актуальные сроки, рассчитанные исходя из времени простоя (отставания в графике) и/или сообщенные специалистами, компетентными в причинах, по которым происходит изменение сроков.



Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ВНИМАНИЕ! После отзыва заказа необходимо проверить присвоение заказов ТОРО к СПП-элементам. В случае выявления заказов без СПП-элементов, следует передать информацию специалисту по планированию бюджета об отсутствии присвоения статуса.

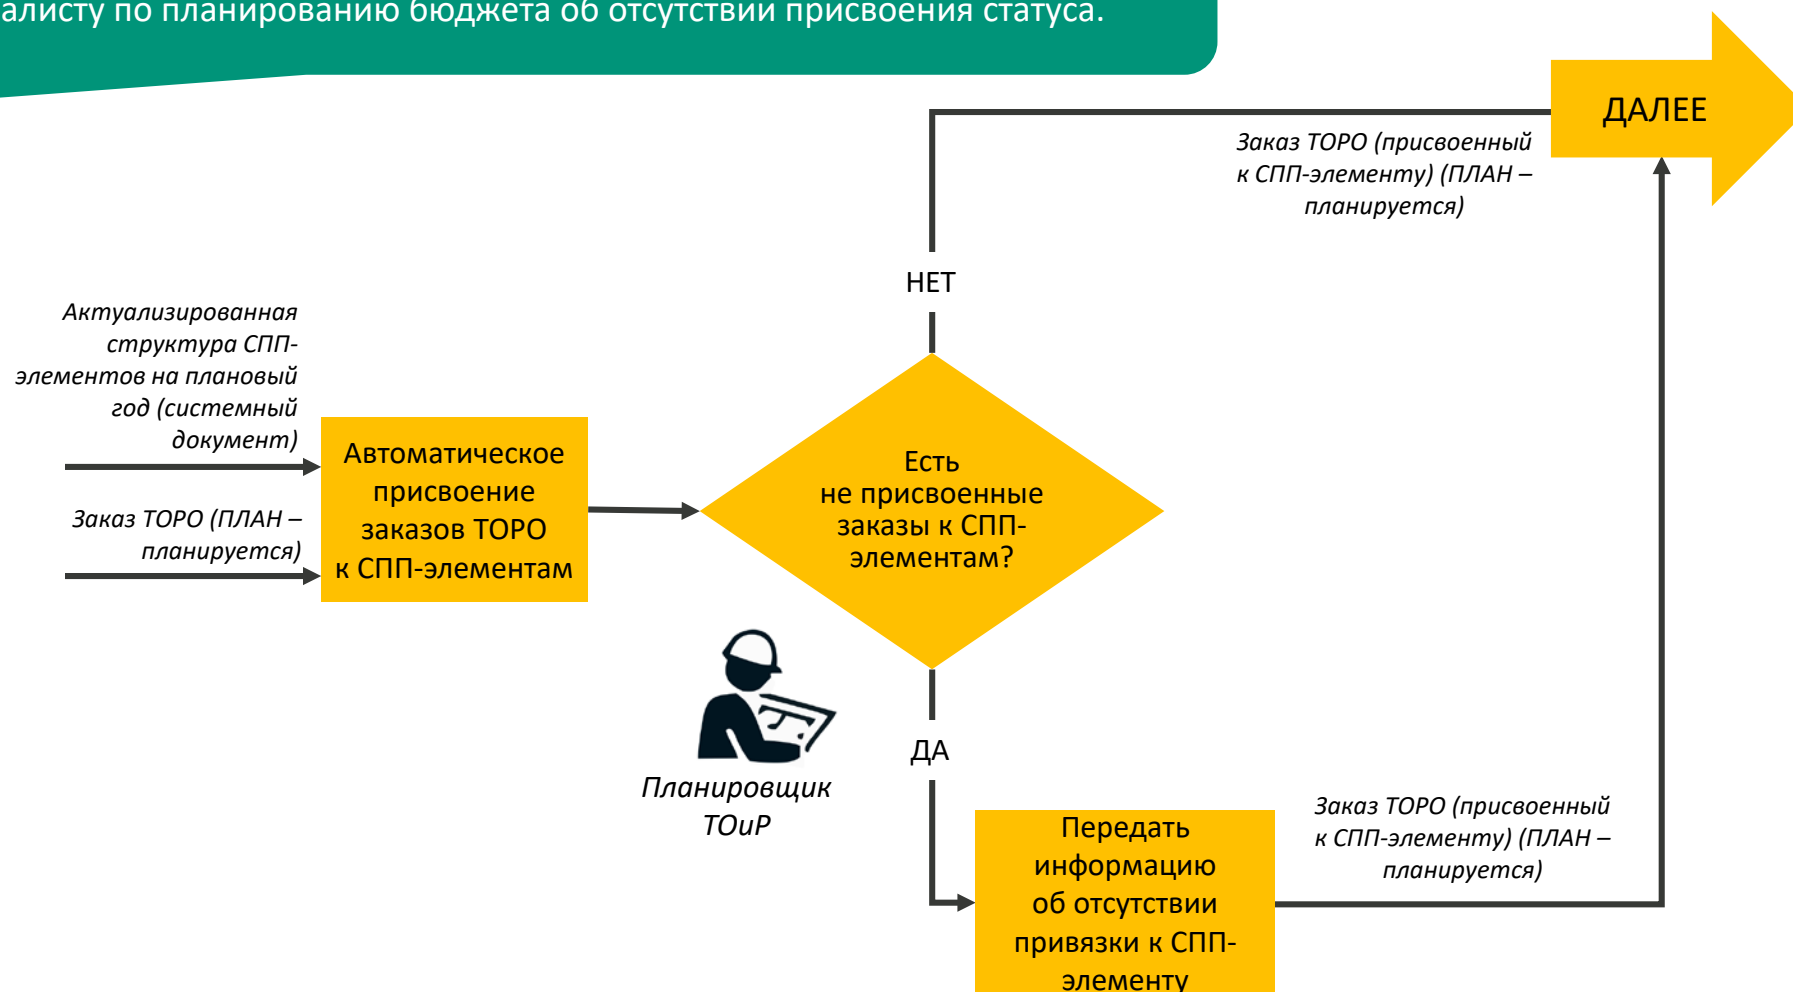

Формирование годовой программы ППА




Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

<

Удобно проверить присвоение СПП-элемента для всех заказов в своей зоне ответственности используя транзакцию IW39 «Просмотр заказов ТОРО».

Если в строчке с заказом поле «СПП-заголовок заказа» будет пустое, это означает, что в системе был сбой и автоматически СПП элемент не привязался. О сбое в системе необходимо уведомить «полюс сервис».


Если оставить поле пустым, то затраты на этот заказ в размере 75 563,40 рублей не войдут в расчёт бюджета и на выполнение этих работ денег не будет запланировано.



Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

В каждом УО СПП-элементы имеют следующую структуру: УО / ЦЗ / Статья затрат / Группа планирования / МВЗ.
В примере выделен СПП-элемент по заказу на капитальный ремонт двигателя самосвала модели 793D (СПП элемент – ЦЗ Транспортировка (Мех КР). Его номер LT-1100-2022-2-012-01-01).
Каждый год номера СПП элементов меняются для определения к бюджету какого года будут относиться затраты.

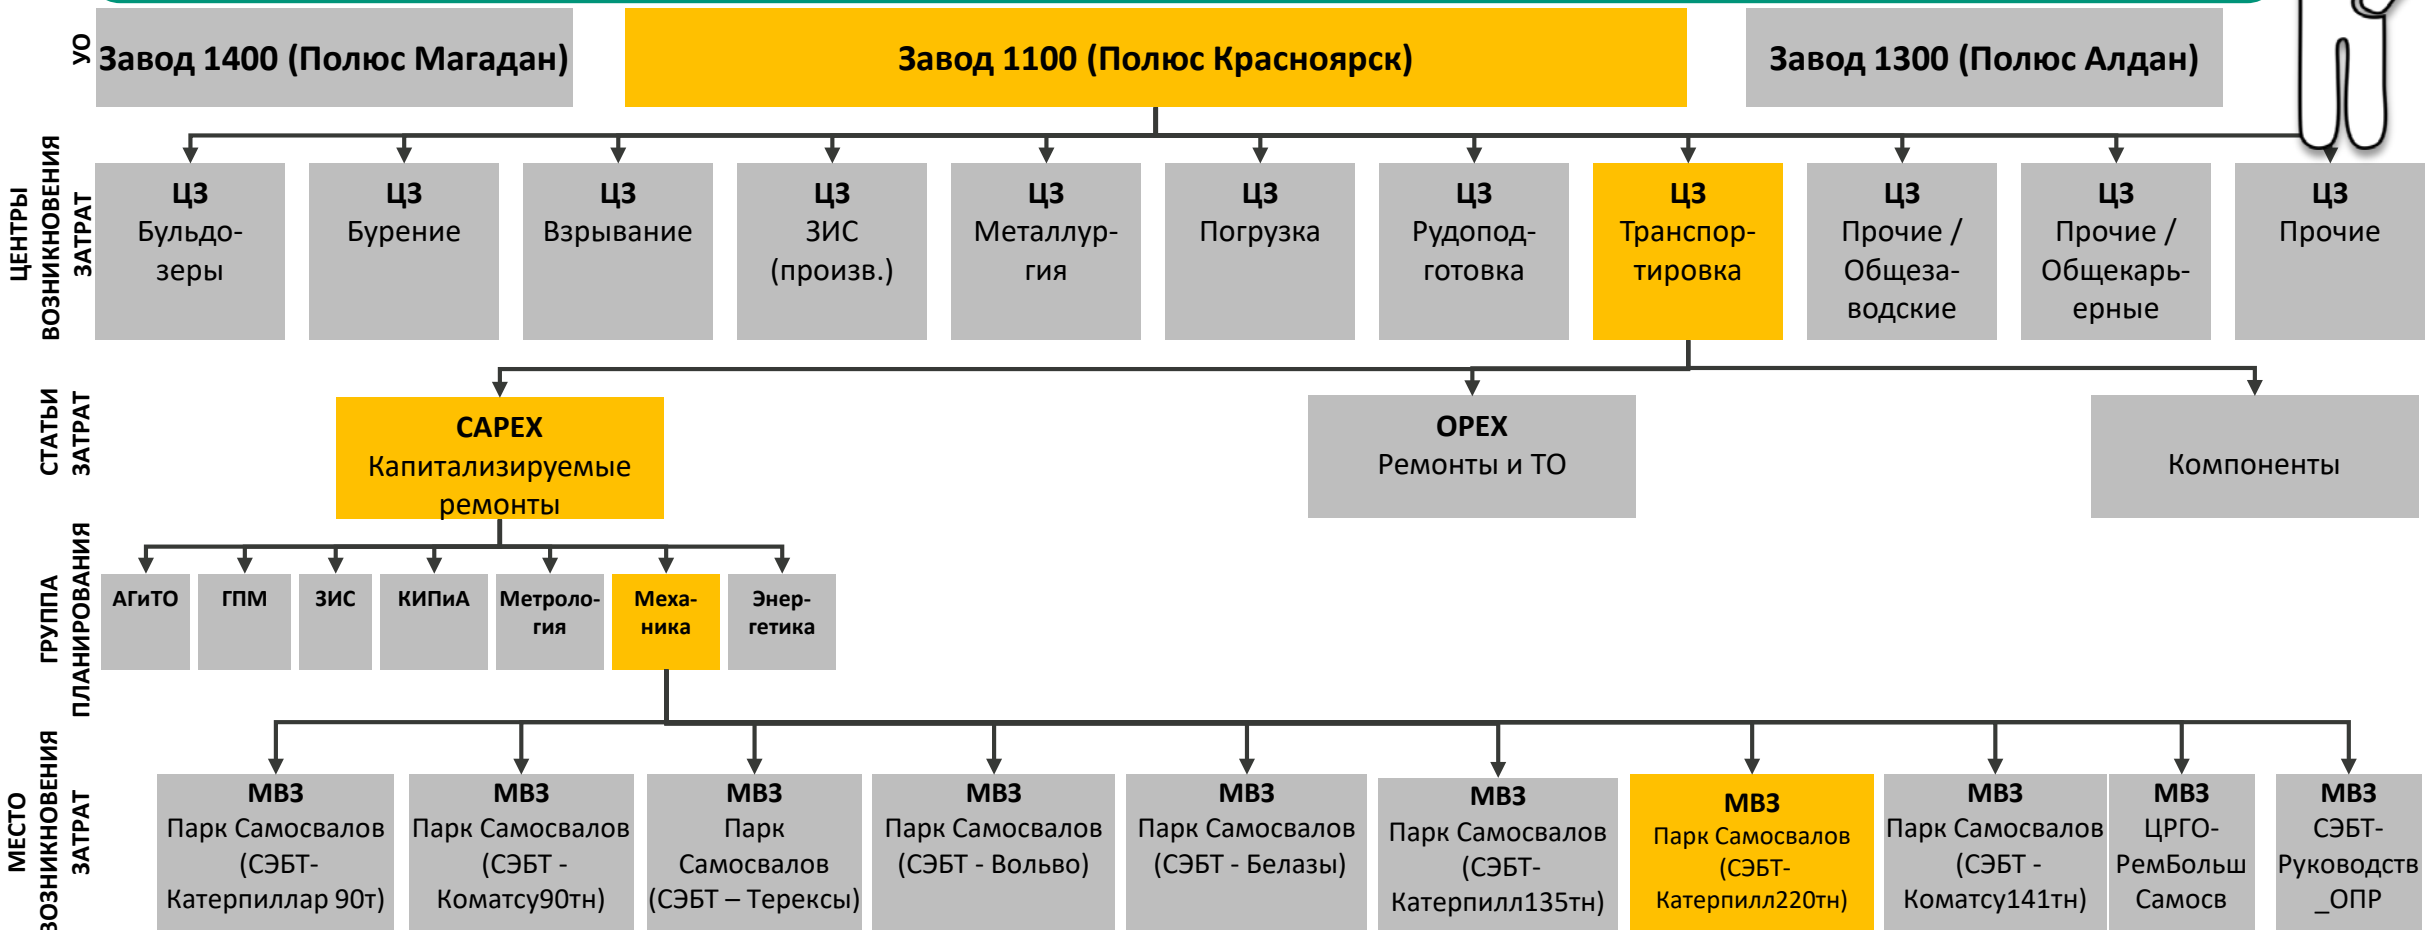

Формирование годовой программы ППА

Шаг 1. Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

В таблице приведены примеры обозначения СПП-элементов.
На каждый год создаётся свой СПП-элемент для управления годовыми бюджетами.



1	СПП-элемент	Обозначен.	Наименование ЦФО	Завод	Название фирмы	Статус	Пользовательский статус	Название
2	LT-1100-2023-2-012-01-01	ЦЗ Транспортировка (Мех КР) Олимпиада	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	ТРКБ СДПА УТВА	Капитализируемые ремонты
3	LT-1100-2023-2-012-02	ЦЗ Транспортировка (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
4	LT-1100-2023-2-012-01-03	ЦЗ Транспортировка (Мех КР) Благодатное	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	ТРКБ СДПА	Капитализируемые ремонты
5	LT-1400-2023-2-013-02	ЦЗ ЗИФ Рудоподготовка (Мех) (ОРЕХ)	Механика	1400	АО "Полюс Магадан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
6	LT-1100-2023-2-008-01-01	ЦЗ Карьер Погрузка (Мех КР) Олимпиада	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	ТРКБ СДПА УТВА	Капитализируемые ремонты
7	LT-1400-2023-2-011-02	ЦЗ Транспортировка (Мех) (ОРЕХ)	Механика	1400	АО "Полюс Магадан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
8	LT-1300-2023-2-016-02	ЦЗ Транспортировка (Мех ОРЕХ)	Механика	1300	АО "Полюс Алдан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
9	LT-1200-2023-2-018-02	ЦЗ Рудоподготовка (Мех ОРЕХ)	Механика	1200	АО "Полюс Вернинское"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
10	LT-1100-2023-2-026-02	ЦЗ ЗИФ4 Рудоподготовка (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
11	LT-1400-2023-2-011-01-01	ЦЗ Транспортировка (Мех) (КР)	Механика	1400	АО "Полюс Магадан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП СДПА ТРКА УТВА	Капитализируемые ремонты
12	LT-1400-2023-2-007-01-01	ЦЗ Карьер Погрузка (Мех) (КР)	Механика	1400	АО "Полюс Магадан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП СДПА ТРКА УТВА	Капитализируемые ремонты
13	LT-1100-2023-2-008-02	ЦЗ Карьер Погрузка (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
14	LT-1100-2023-2-014-02	ЦЗ ЗИФ1,2 Рудоподготовка (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
15	LT-1100-2023-2-020-02	ЦЗ ЗИФ3 Рудоподготовка (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
16	LT-1400-2023-2-007-02	ЦЗ Карьер Погрузка (Мех) (ОРЕХ)	Механика	1400	АО "Полюс Магадан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
17	LT-1100-2023-2-004-02	ЦЗ Карьер Бурение (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
18	LT-1100-2023-2-006-02	ЦЗ Карьер Бульдозеры (Мех ОРЕХ)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВП	ОРЕХ (ремонт и ТО)
19	LT-1100-2023-2-006-01-03	ЦЗ Карьер Бульдозеры (Мех КР) Благодатн	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	ТРКБ СДПА	Капитализируемые ремонты
20	LT-1100-2023-2-004-01-01	ЦЗ Карьер Бурение (Мех КР) Олимпиада	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	ТРКБ СДПА УТВА	Капитализируемые ремонты
21	LT-1100-2023-2-014-01-01	ЦЗ ЗИФ1,2 Рудоподготовка (Мех КР)	Механика	1100	АО "Полюс Красноярск"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	УТВК СДПА УТВА	Капитализируемые ремонты
22	LT-1300-2023-2-019-01-01	ЦЗ ЗИФ Рудоподготовка (Мех КР)	Механика	1300	АО "Полюс Алдан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	АКТС СДПА	Капитализируемые ремонты
23	LT-1300-2023-2-007-02	ЦЗ Карьер Бурение (Мех ОРЕХ)	Механика	1300	АО "Полюс Алдан"	ДЕБЛ БЮСО КНТР	АКТС	ОРЕХ (ремонт и ТО)

Практика №2



Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

1. Создать заказы и сообщения путем отзыва ППР из предварительно сформированного графика.
2. Определить какому СПП-элементу относится заказ.
3. Найти невыполненные заказы по своим ЕО в текущем году, которые планируется перенести на следующий год.

Планирование МТР

Шаг 1. Анализ МТР в заказах ТОРО, замена МТР

Теперь мне надо понять целесообразность и доступность запасных частей, указанных в каждом заказе.

Есть ли в системе инструмент, который поможет это сделать?



Планировщик

Да. В системе нужно сформировать «Отчет по целесообразности использования МТР в заказах ТОРО». В нем можно увидеть:

- Наличие плановых цен.
- Целесообразность замены или восстановления.
- Возможность обеспечения МТР к началу запланированных работ (по Lead Time).
- Возможность замены МТР на более экономически выгодные:
 - Аналоги.
 - ЗЧ собственного производства.




ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 2

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

- В заказах, выпущенных по техкартам, не содержащих операций и компонентов (материалов), добавить недостающие операции, компоненты, рабочие места.
- Проверка наличия плановой цены МТР в системе.
- Изменить МТР и/или сроки работ при необходимости.
- Актуализировать:
 - сами рабочие места;
 - в заказах — исполняющие рабочие места.

*Все отозванные заказы ТОРО
по оборудованию в своей зоне
ответственности*

Корректировка
МТР/цен/сроков
работ

Заказы ТОРО с:

- Датой выполнения учитывающей доступность МТР
- Всеми необходимыми операциями и МТР
- Со стоимостью МТР



Планировщик
ТОиР

Дальше посмотрим как это
нужно сделать.




Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 2

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

- В заказах, выпущенных по техкартам, не содержащих операций и компонентов (материалов), добавить недостающие операции при необходимости, компоненты, рабочие места.
- Проверка наличия плановой цены МТР в системе.
- Изменить МТР и/или сроки работ при необходимости.
- Актуализировать:
 - сами рабочие места;
 - в заказах — исполняющие рабочие места.

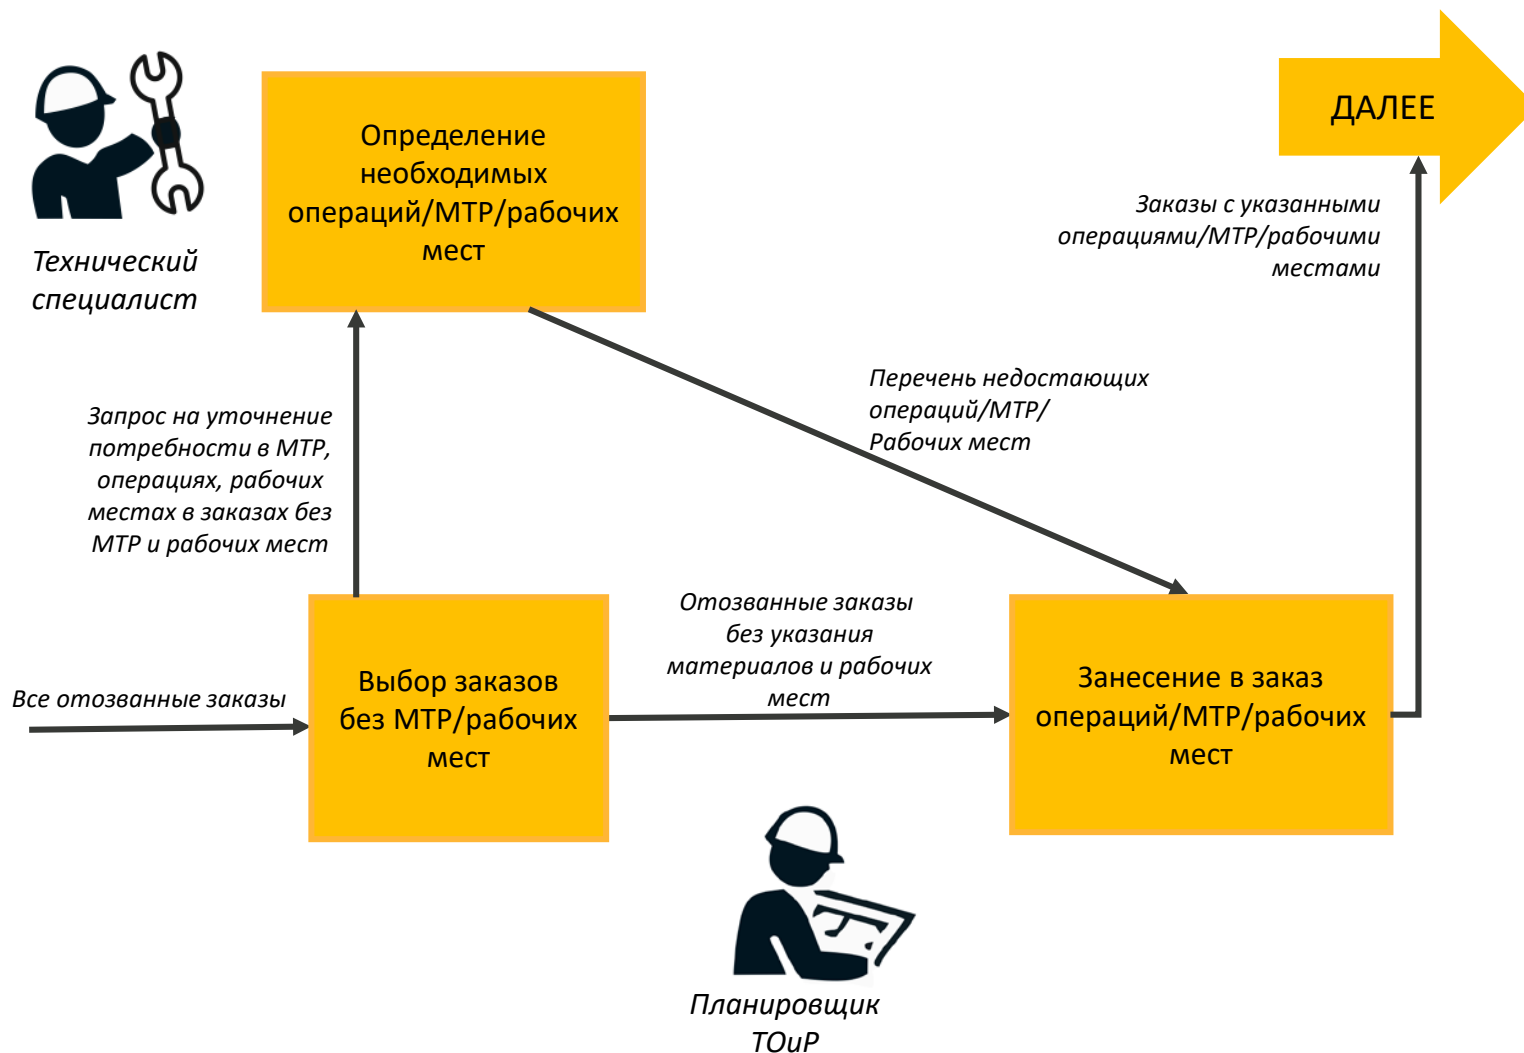


Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 2

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

- В заказах, выпущенных по техкартам, не содержащих операций и компонентов (материалов), добавить недостающие операции, компоненты, рабочие места.
- Проверка наличия плановой цены МТР в системе.**
- Изменить МТР и/или сроки работ при необходимости.
- Актуализировать:
 - сами рабочие места;
 - в заказах — исполняющие рабочие места.

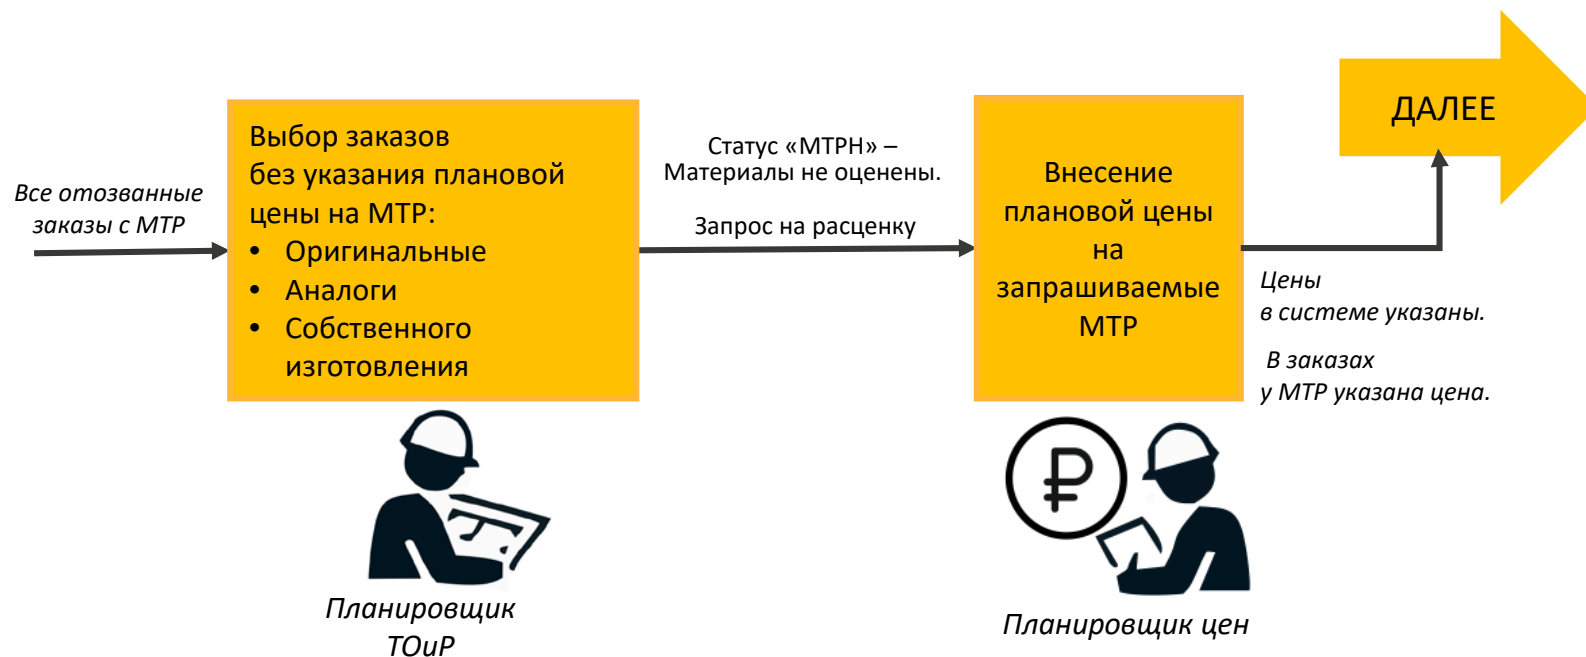

Если на возможные замены нет утвержденных плановых цен, то заказ будет иметь статус «МТРН» - Материалы не оценены.

Установление плановой цены МТР в заказах ТОРО и уведомление Планировщика ТОиР осуществляет Планировщик цен, после чего на заказе ТОРО автоматически снимается статус «МТРН» и проставляется статус МТРЦ.

После установления плановой цены (статус МТРЦ), Планировщик ТОиР выполняет перекалькуляцию всех заказов ТОРО для корректного отображения затрат.



Формирование годовой программы ППА




Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 2

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

- В заказах, выпущенных по техкартам, не содержащих операций и компонентов (материалов), добавить недостающие операции, компоненты, рабочие места.
- Проверка наличия плановой цены МТР в системе.
- Изменить МТР и/или сроки работ при необходимости.**
- Актуализировать:
 - сами рабочие места;
 - в заказах — исполняющие рабочие места.

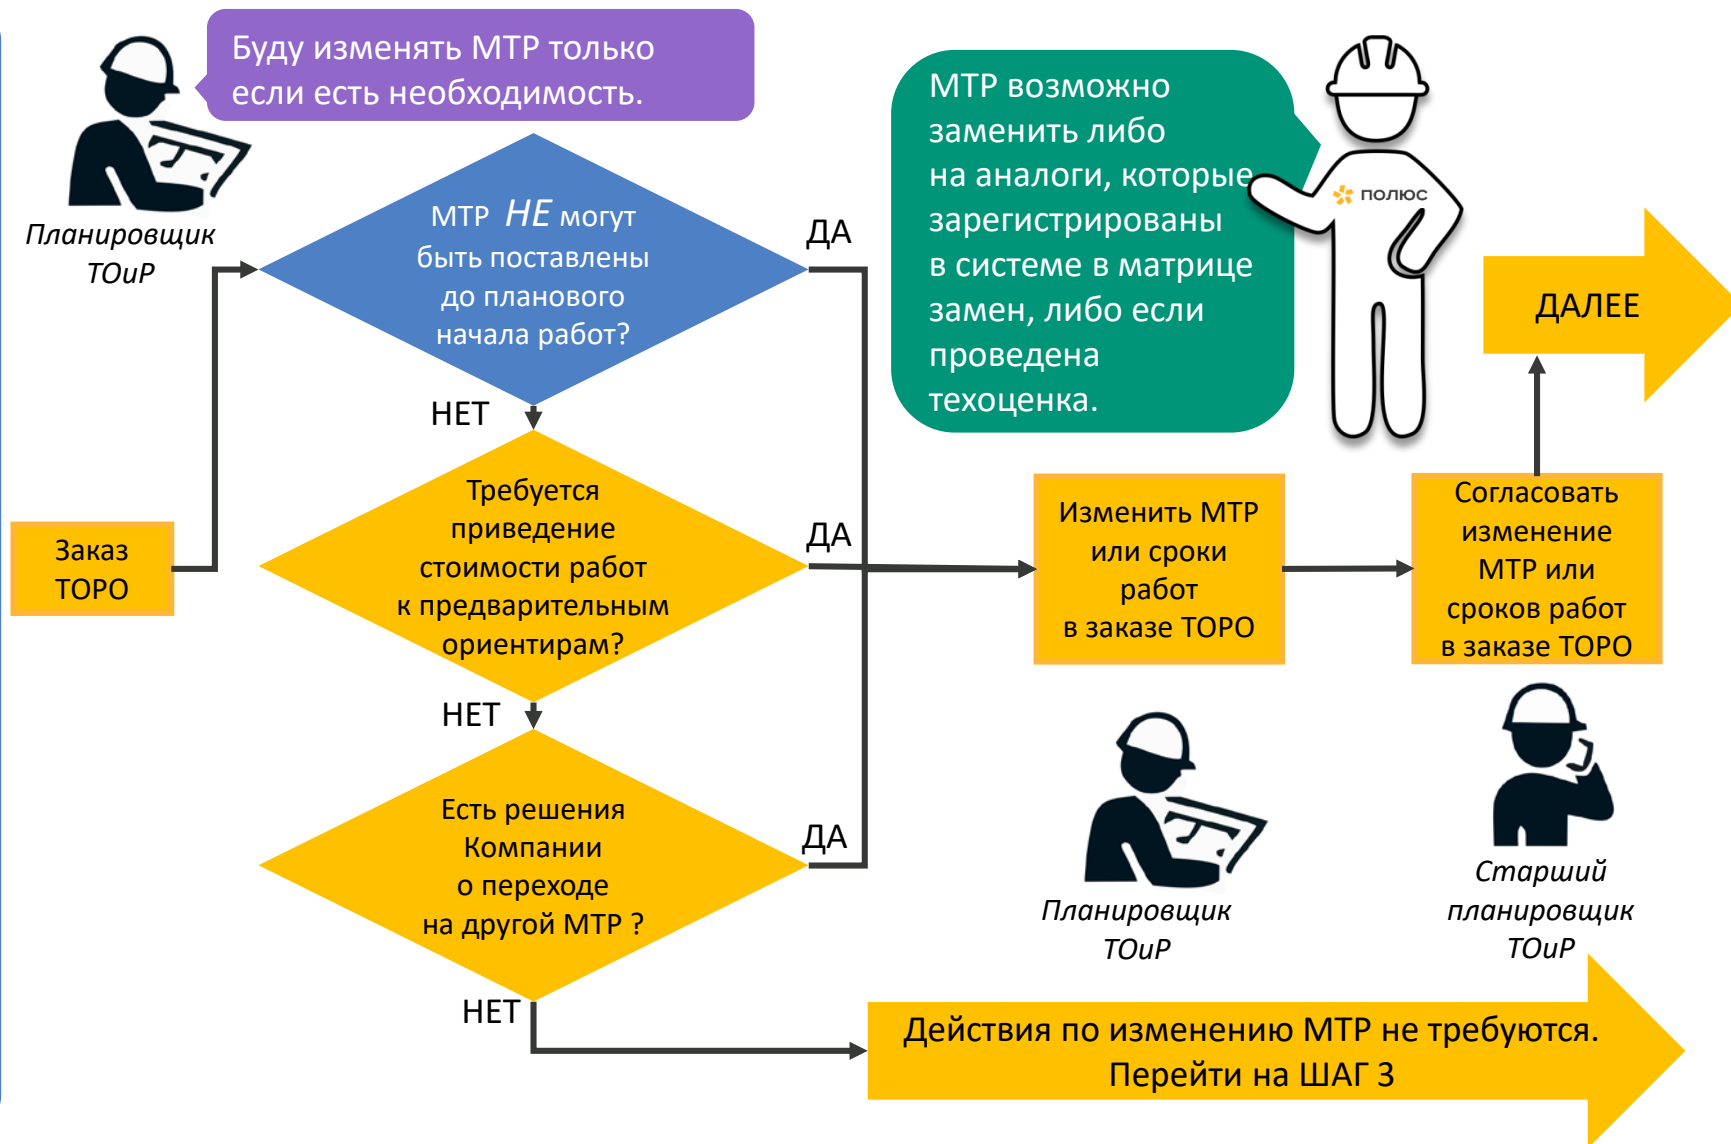

Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

Этот шаг годового планирования требует выполнения большого количества действий. Мне требуются более подробные инструкции.



Планировщик
ТОиР


Пока мы рассмотрели только условия, при которых действия этого шага должны выполняться.
Давайте теперь пройдем все эти шаги и попробуем разобрать алгоритм каждого действия и его реализацию в системе.



Формирование годовой программы ППА




Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

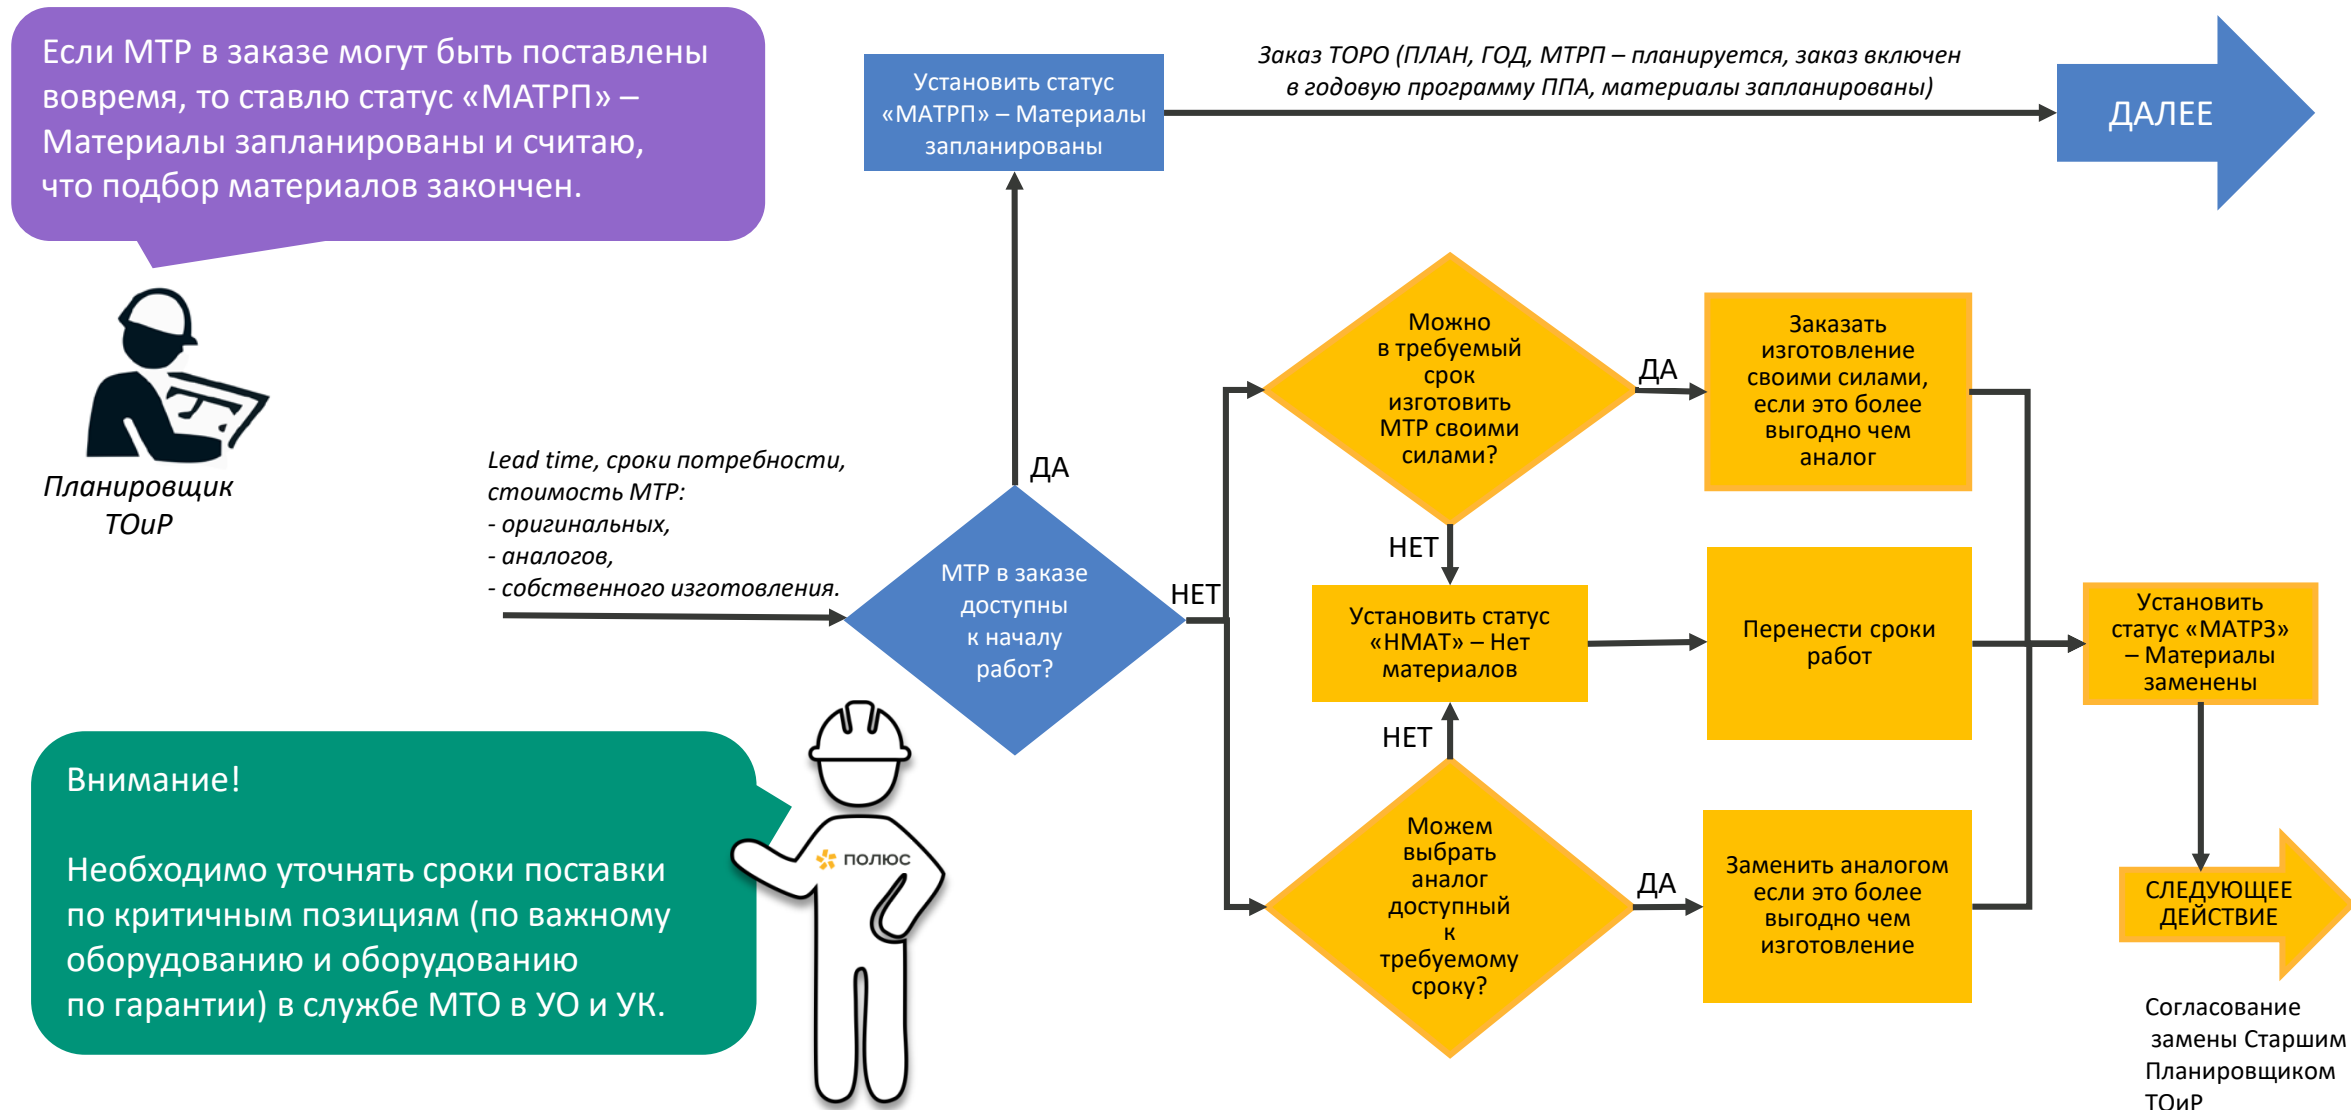

Формирование годовой программы ППА




Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

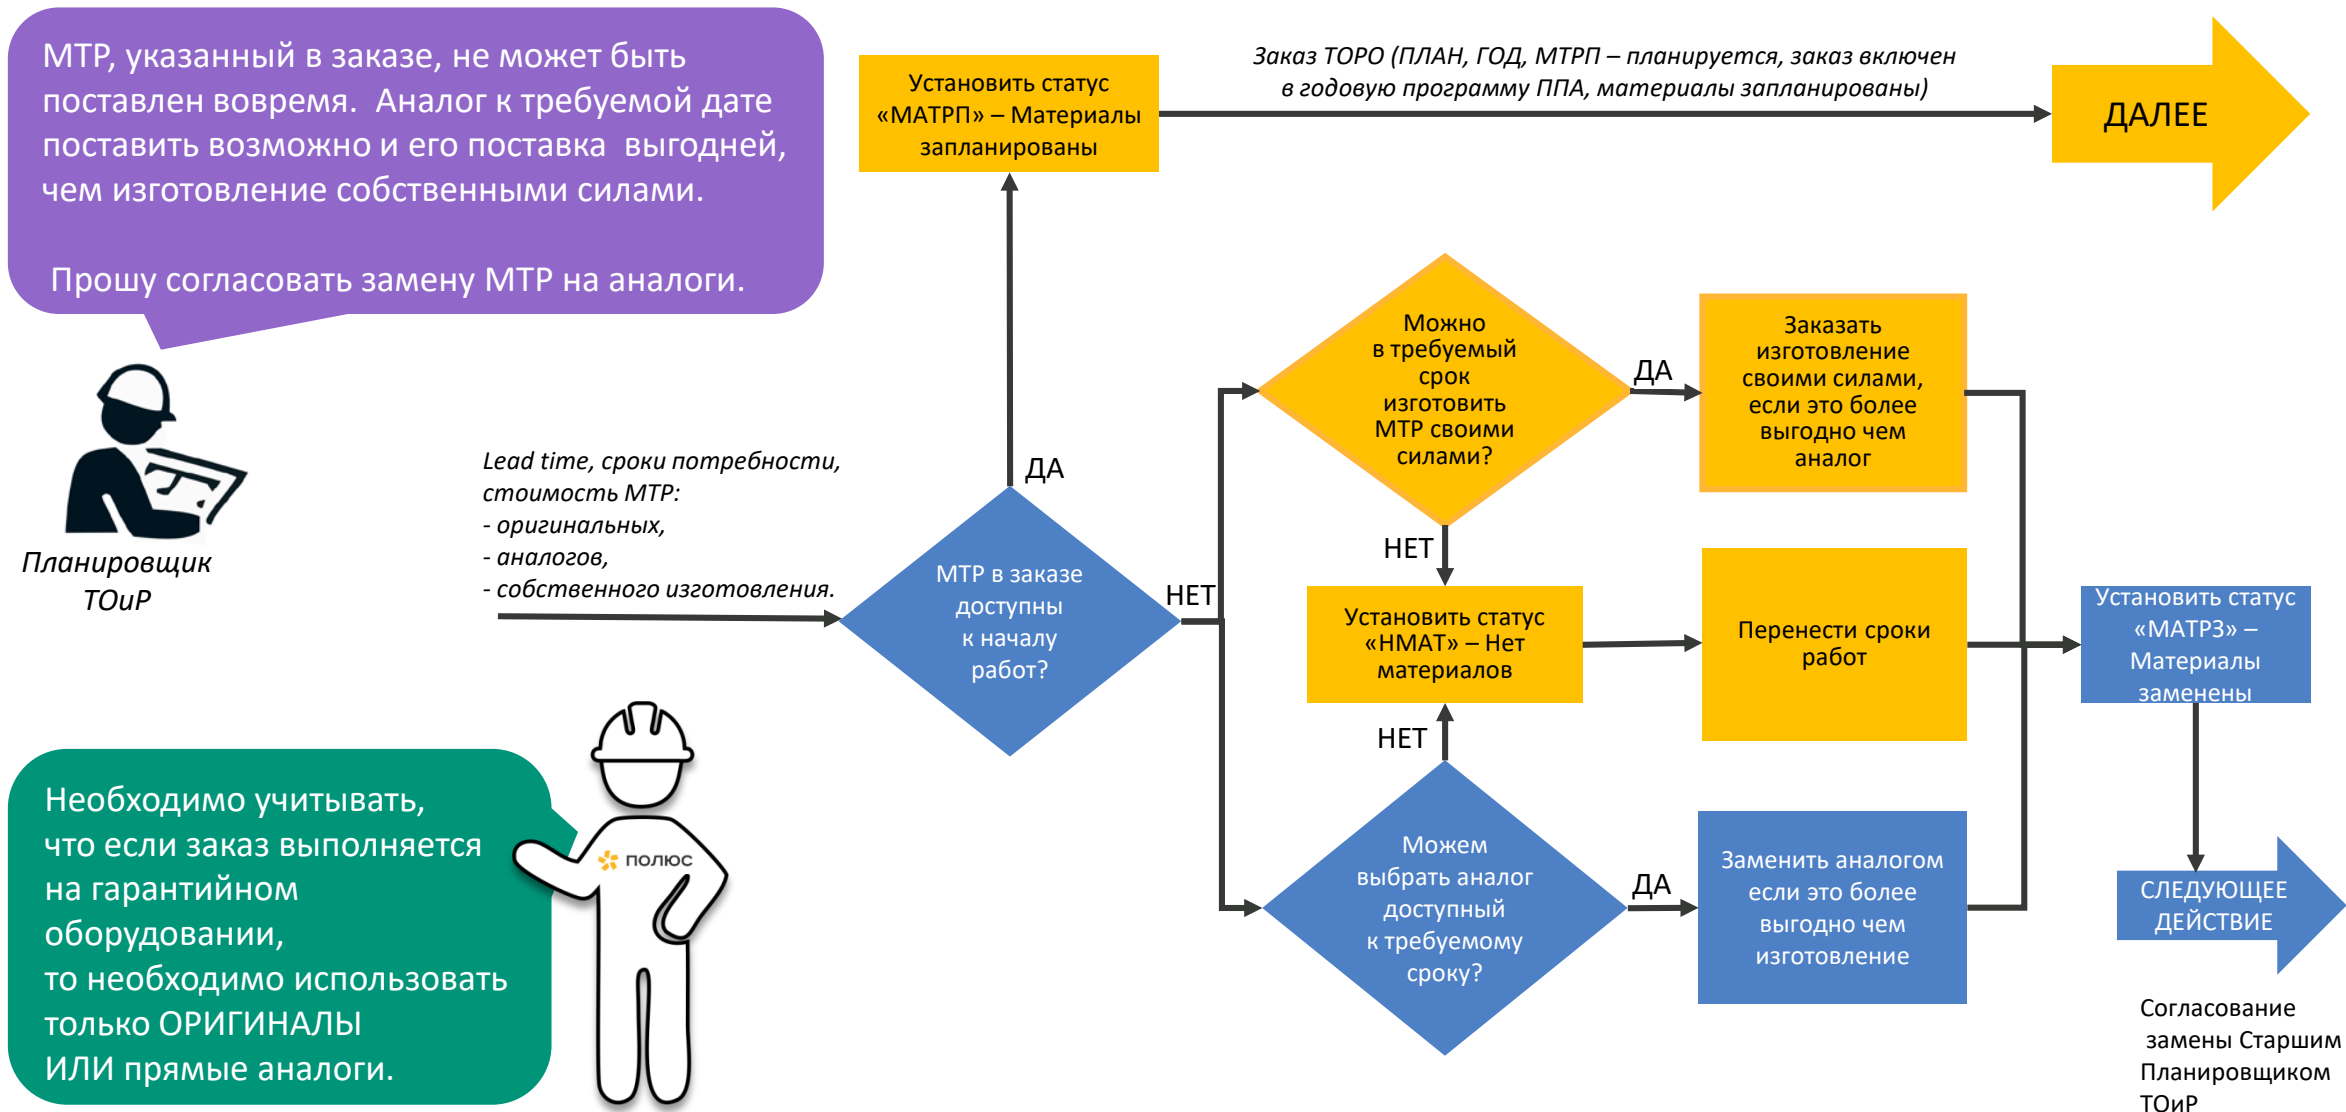

Формирование годовой программы ППА




Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

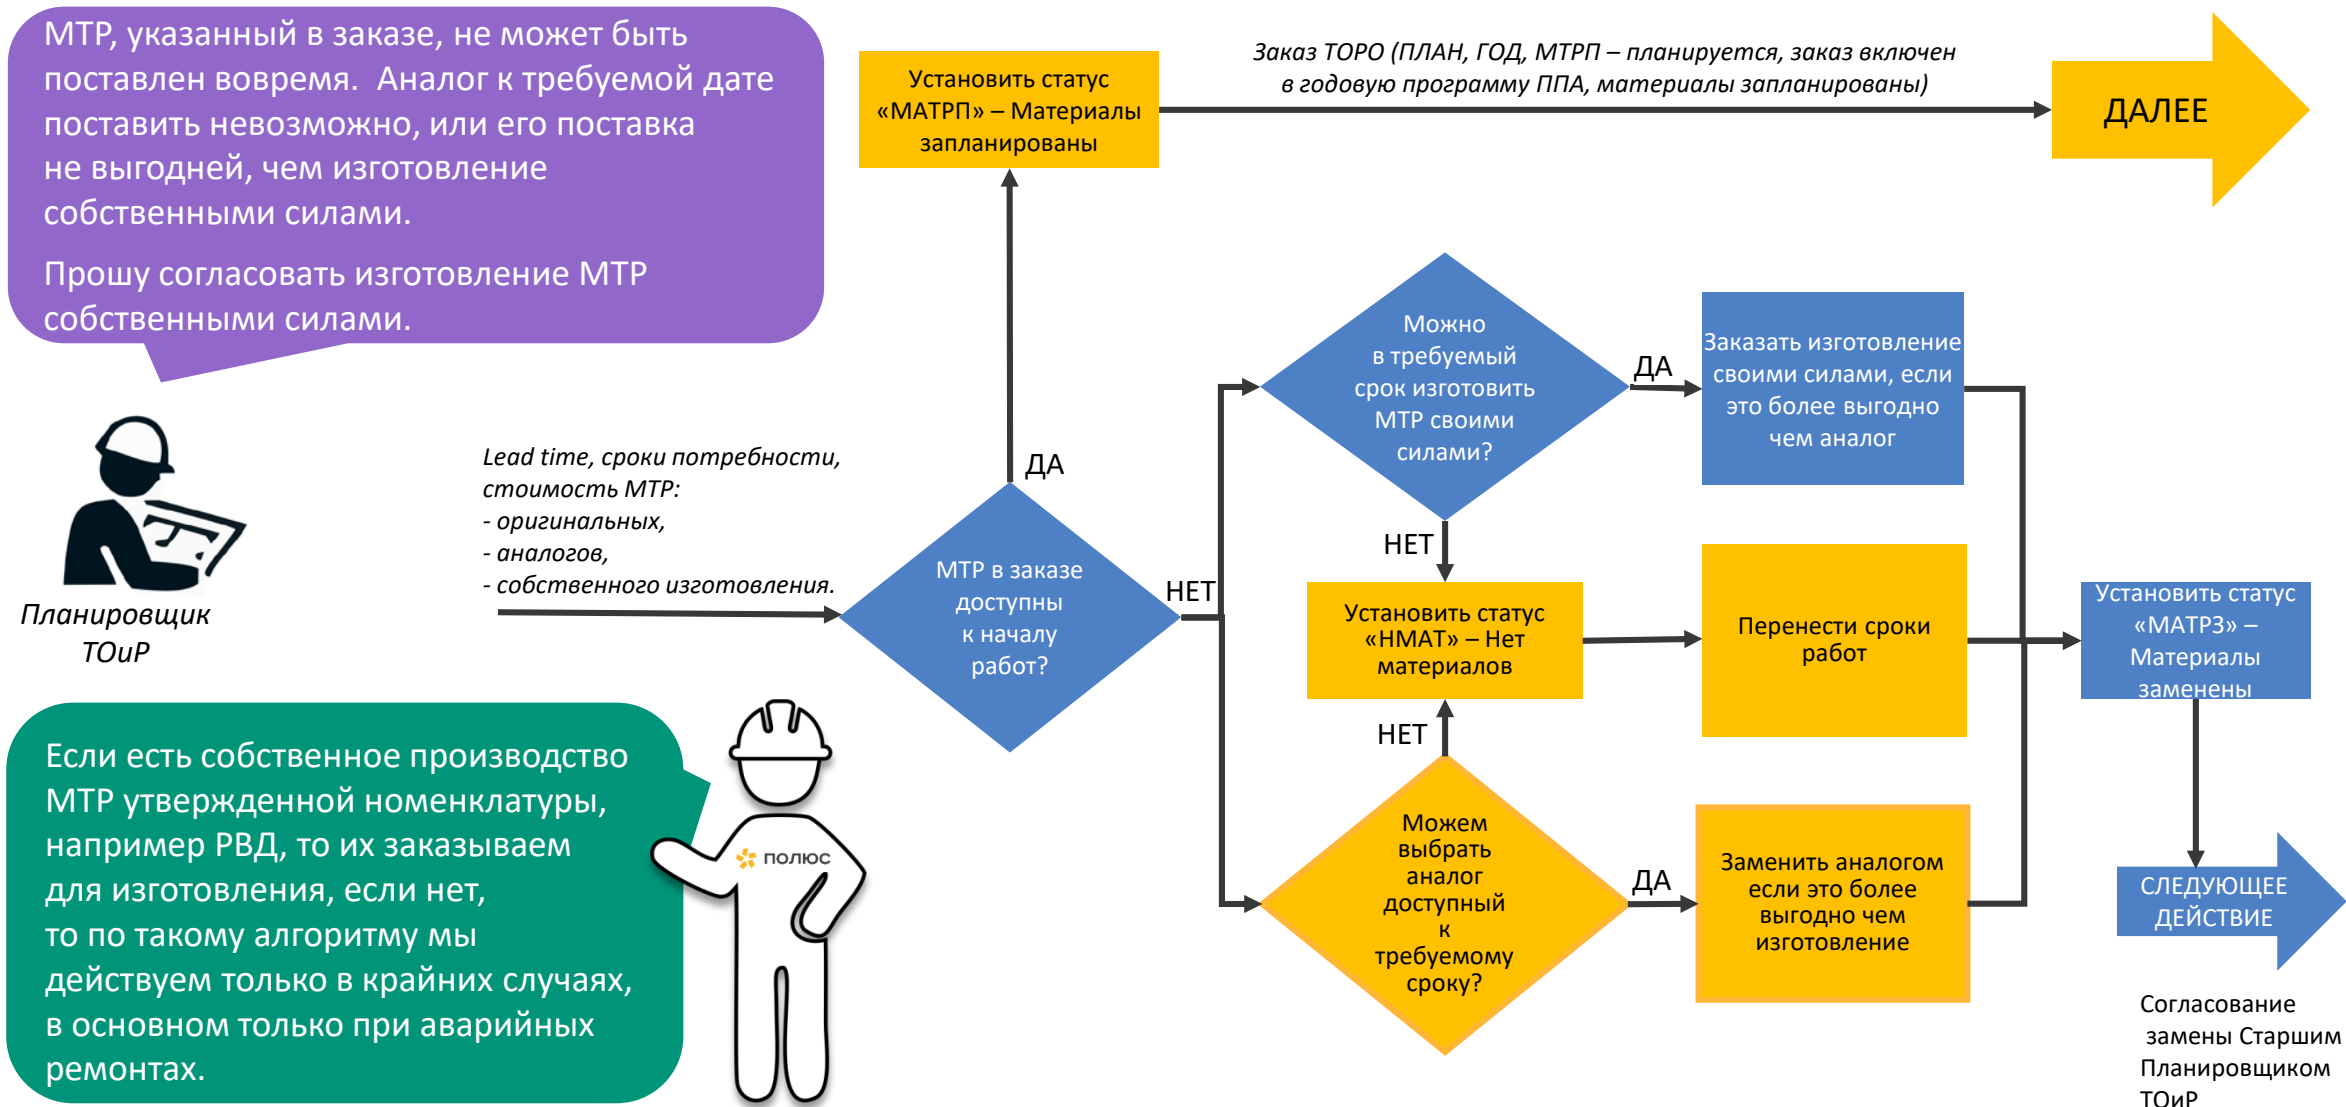

Формирование годовой программы ППА




Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

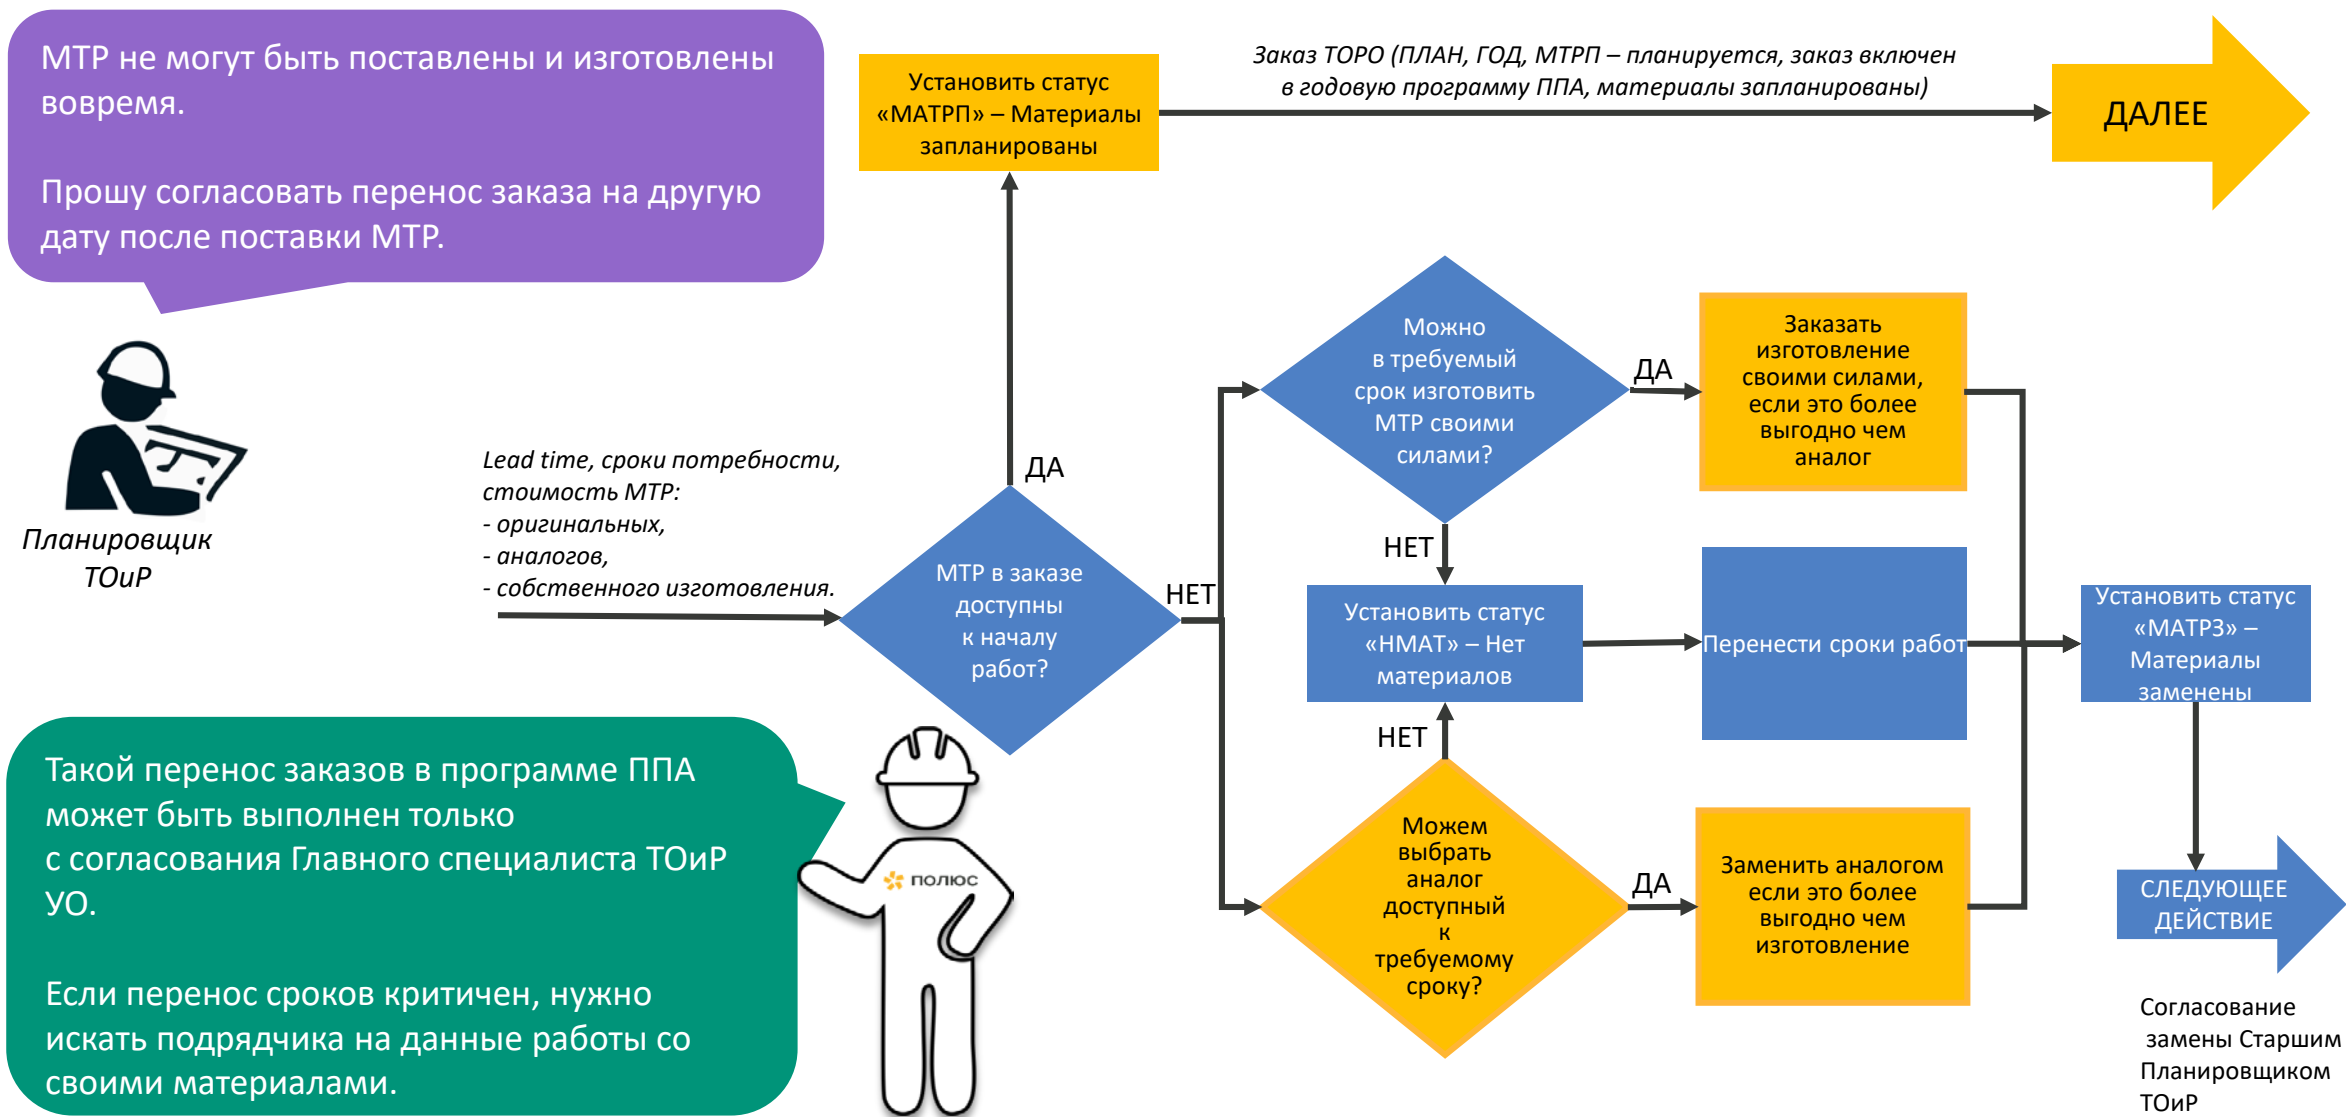

Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

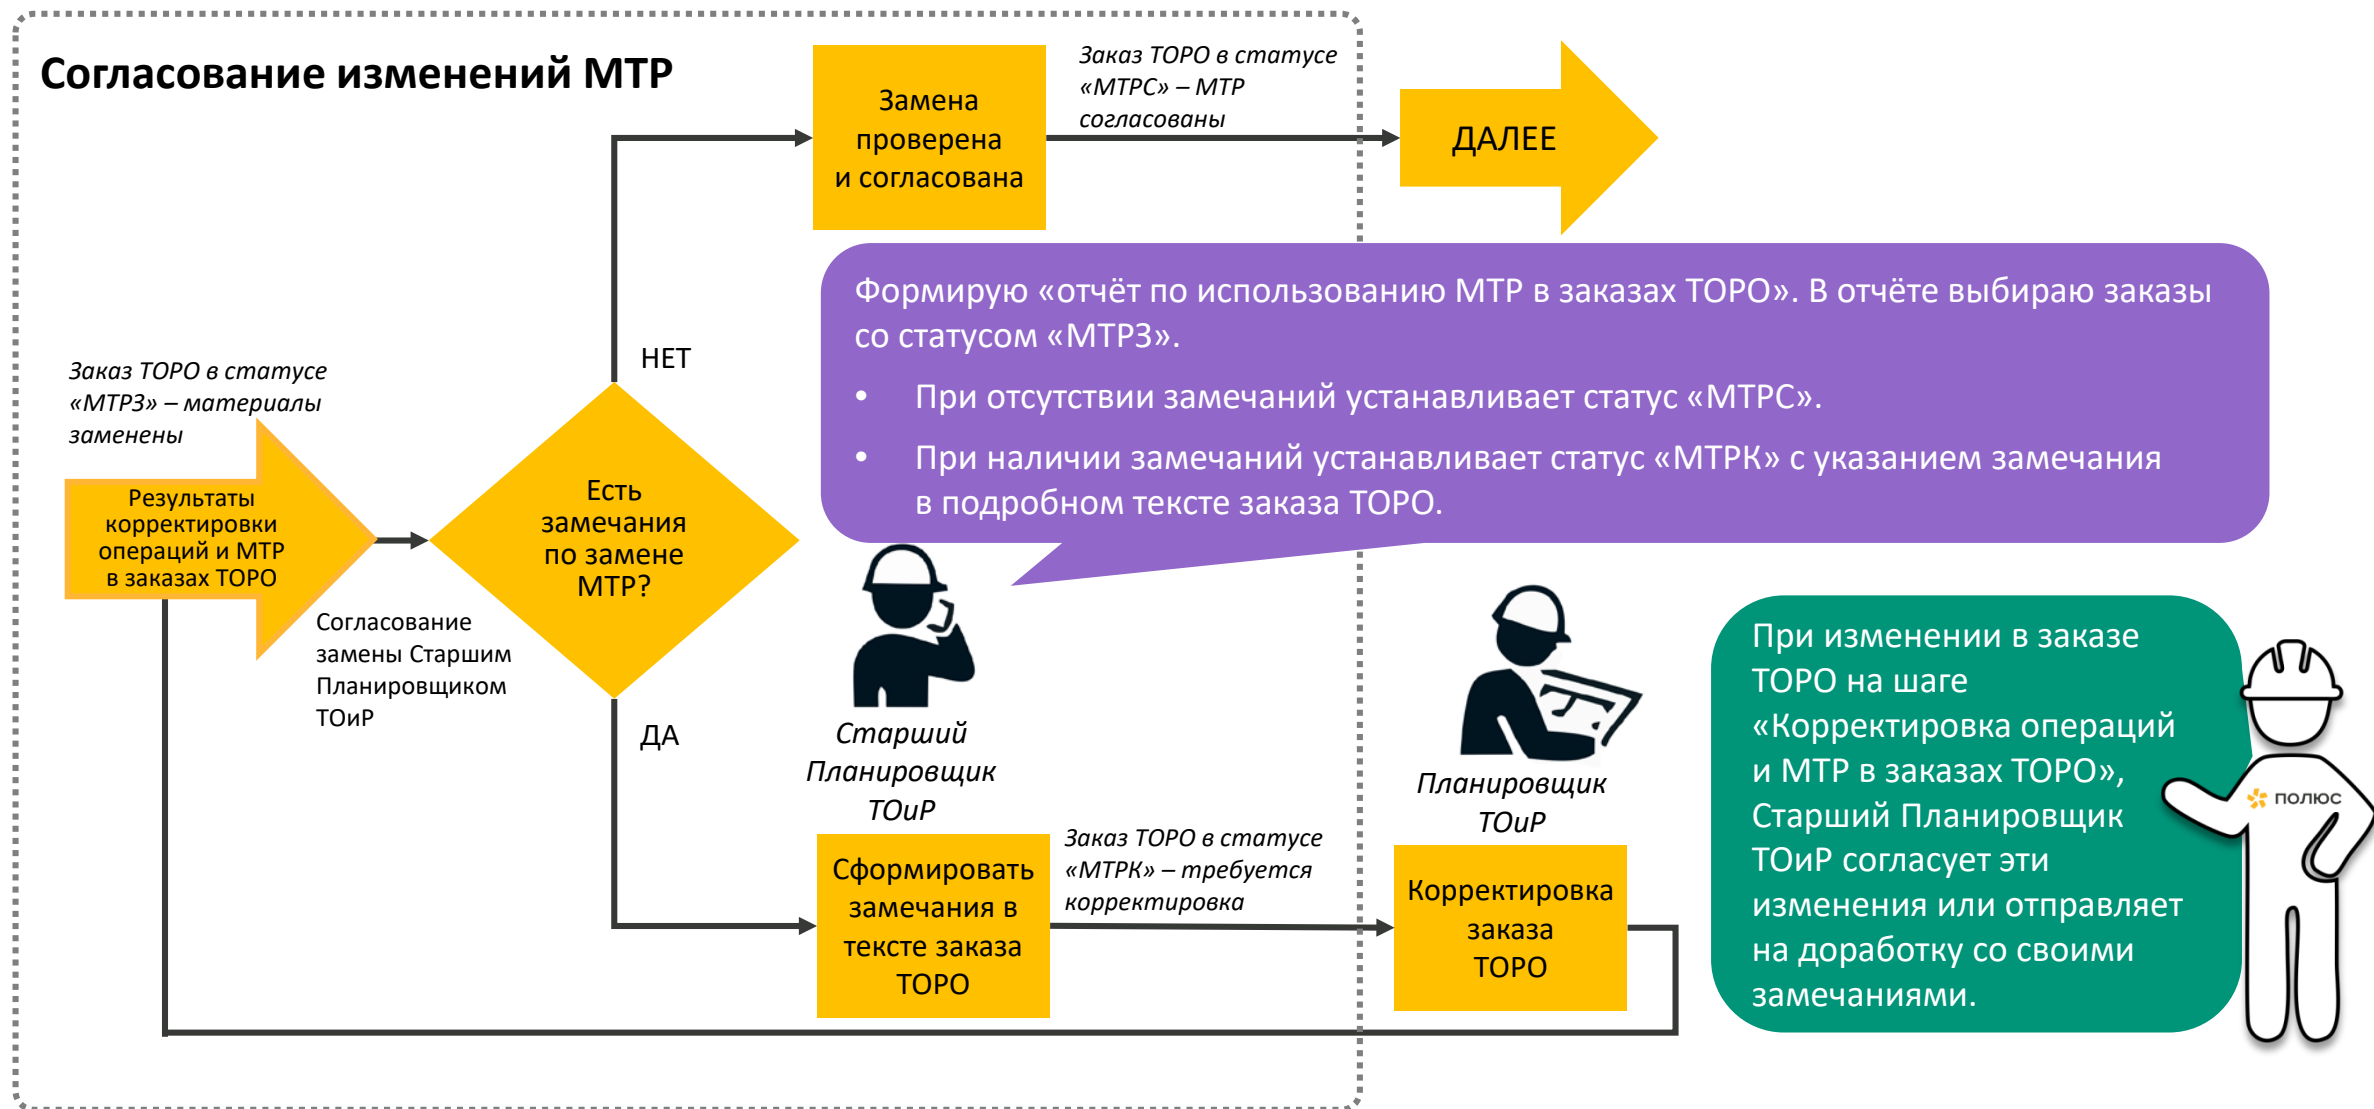

Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 2

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

- В заказах, выпущенных по техкартам, не содержащих операций и компонентов (материалов), добавить недостающие операции, компоненты.
- Проверка наличия плановой цены МТР в системе.
- Изменить МТР и/или сроки работ при необходимости.
- **Актуализировать:**
 - **сами рабочие места;**
 - **в заказах — исполняющие рабочие места.**

Я знаю, что определенные работы выполняются определенными исполнителями.

Исполнители в заказе вносятся в поле «Рабочее место». Мне необходимо указать исполнителя для каждой операции. После назначения исполнителей у меня появиться возможность понять, достаточно ли исполнителей в определенный период для выполнения заказов.



Планировщик
ТОиР


Да. Верно. Но в планируемом году могут быть изменения в численности исполнителей работ на рабочих местах при выполнении работ хозспособом. Нужно через запрос в службу кадров, уточнить количество исполнителей на рабочих местах и график их работы. При необходимости внести изменения в рабочие места по их мощности (возможности выполнения работ в определенном объёме чел/часов).

Кроме того, есть заказы выполняемые подрядчиками по договорам предоставления услуг. Как определять эти работы и разносить затраты по договорам на заказы мы узнаем в следующем шаге.



Формирование годовой программы ППА

Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

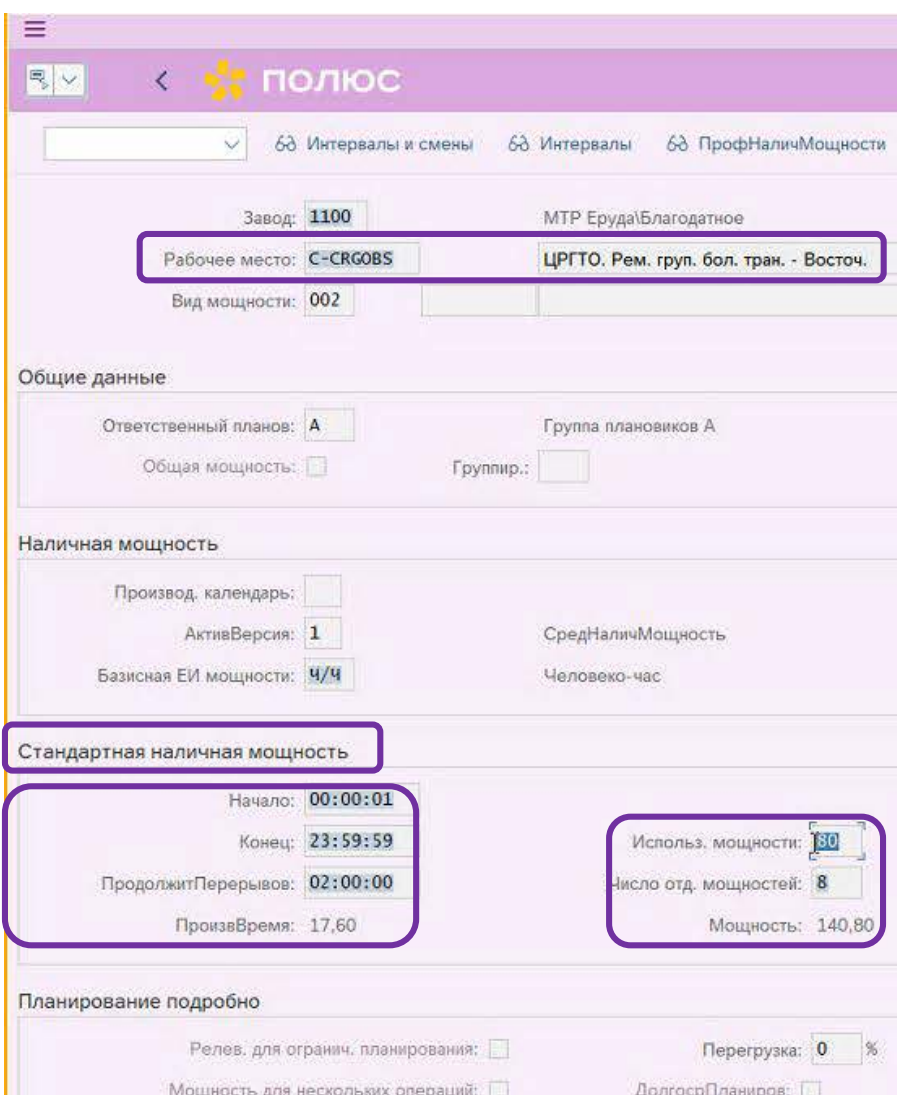

Мощность раб. места: просмотреть: заголовок

Завод: 1100 МТР Еруда\Благодатное

Рабочее место: C-CRGOBS ЦРГТО. Рем. груп. бол. тран. - Восточ.

Вид мощности: 002

Общие данные

Ответственный планов: A Группа плановиков A

Общая мощность: Группир.:

Наличная мощность

Производ. календарь:

АктивВерсия: 1 СредНаличМощность

Базисная ЕИ мощности: 4/4 Человеко-час

Стандартная наличная мощность

Начало: 00:00:01

Конец: 23:59:59

ПродолжитПерерывов: 02:00:00

ПроизвВремя: 17,60

Использ. мощности: 80

Число отд. мощностей: 8

Мощность: 140,80

Планирование подробно

Релев. для огранич. планирования:

Перегрузка: 0 %

Мощность для нескольких операций:

ДолгосрПланиров:

В транзакции CR03 мы можем проверить и изменить стандартную наличную мощность после получения численности специалистов и режима их работы от кадровой службы.

Поле «Использ.мощности» отражает процент времени использования специалистов на планируемых работах. На предприятии принято указывать 80% использования.

В поле «Число отд. мощностей» указывается число специалистов, выходящих в смену.

В примере указано время работы исполняющего рабочего места 24 часа с двумя часовыми перерывами на обед. Для обеспечения такого графика работы необходимы четыре смены. Мы получили от отдела кадров данные о наличии среднесписочного состава на этом рабочем месте в 32 человека. Поделили их на 4 смены и получили 8 специалистов в смене.

Для определения мощности в чел/часах в сутки система умножает Производственное время $(24ч-2ч)*80\%=17,6$ час на число специалистов в смене 8 и получаем 140,8 часа ежесуточную мощность.



Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

Формирование годовой программы ППА



Шаг 2 Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО


<

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка операций и МТР в заказах ТОРО

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 3. Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 3

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг запланированных в плановых заказах (ATU1)

- Проанализировать договора с исполнителями (текущие или планируемые к подписанию) в разрезе групп оборудования (моделей) и вида/объёма работ.

ПРИМЕР:

WK20,35 – капитальный ремонт – исполнитель ООО «Авик».

- Проверить наличие планового тарифа.



Планировщик
ТОиР

Все отозванные заказы ТОРО по оборудованию в своей зоне ответственности

Действующие и готовящиеся к заключению в планируемом году договора на услуги

Корректировка рабочих мест
(внешние исполнители)
(APP1)
/ создание заказов **(ASR1, ATU1)**

Заказы ТОРО с:

- Датой выполнения учитывающей доступность исполнителей
- Указанием исполнителей работ
- Со стоимостью работ

Некоторые работы выполняются внешними подрядчиками по договорам. Оплату их услуг мы должны предусмотреть в бюджете. Для этого мы указываем подрядчиков в заказах в качестве исполнителей работ.



Формирование годовой программы ППА


Шаг 3. Определение исполнителей в заказах ТОРО

Для всех профилактических работ у нас созданы заказы. Но для части работ (например — для ТР, которые могут возникнуть в результате диагностики), мы не знаем, какие операции надо будет выполнить и когда.

Для таких работ, выполняемых подрядчиками, мы должны заложить деньги в бюджет без указания конкретных операций.

Для этого мы по каждому подрядчику создаем заказ, в котором суммируем объем трудозатрат, взятый из заказов на ТР, и, в качестве исполнителя указываем подрядчика.

Для заказов, в которых указаны операции с объемами, мы будем указывать исполнителей операций и их количество. Посмотрим как это делать на следующем слайде.

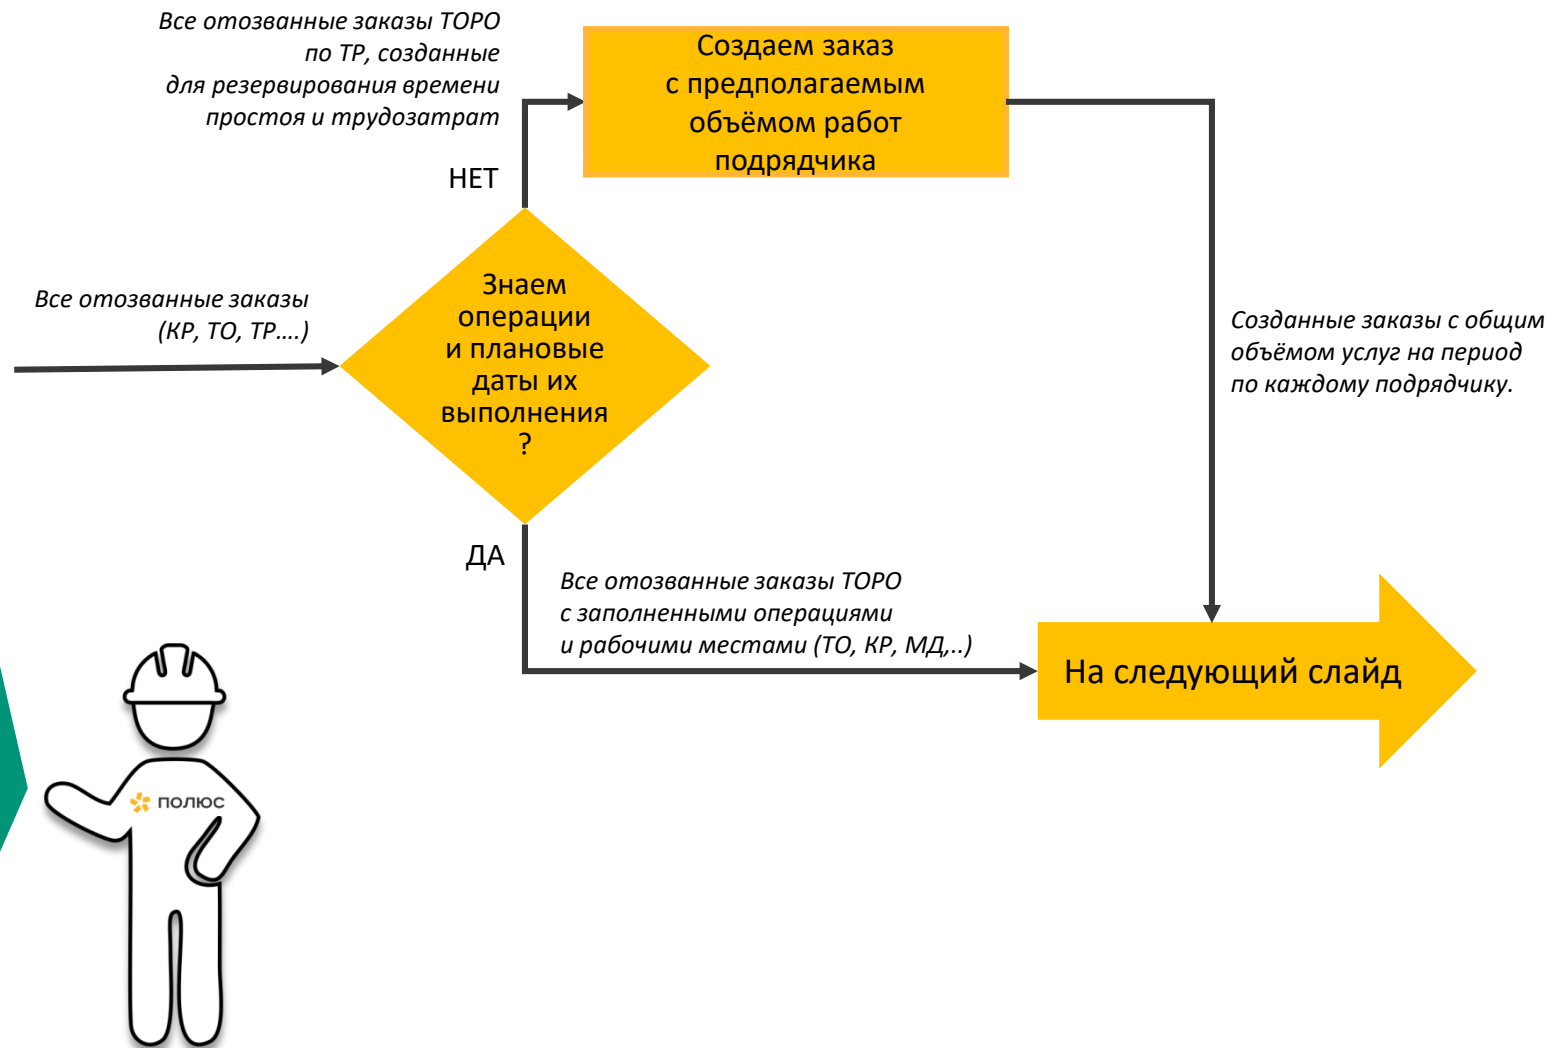

Формирование годовой программы ППА

Шаг 3. Определение исполнителей в заказах ТОРО



Формирование годовой программы ППА

Шаг 3. Определение исполнителей в заказах ТОРО



Практика №3




Наполнение заказа операциями и компонентами

1. В заказе указать исполнителя работы (хозспособ или подрядчика по конкретным операциям)
2. В заказ в ручную добавить операцию, компонент (материал). Для примера используйте любые подходящие к ЕО операции, компоненты материалы.

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Как оптимизировать кол-во заказов по КИП и метрологии?

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА



Шаг 4. Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО


- Сформировать отчёт «Объединение сообщений ТОРО в заказ ТОРО».
- По возможности объединить сообщений ТОРО в заказе ТОРО.



Планировщик
ТОиР

Как уменьшить количество заказов ТОРО по мероприятиям КИП и метрологии?


Существует отчёт «Объединение сообщений ТОРО в заказ ТОРО». С его помощью можно объединять сгенерированные системой сообщения в Заказ. Если объединение не рационально и выполнение операций необходимо, то устанавливается статус сообщения «СОРА - в работе».

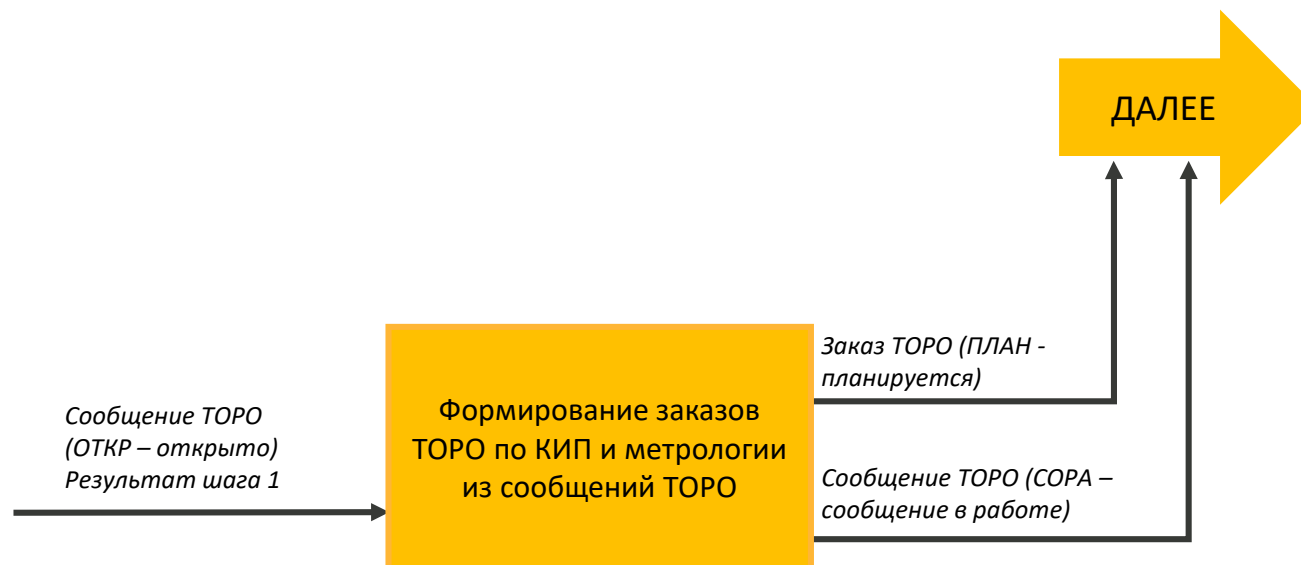

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 5. Синхронизация заказов ТОРО

ШАГ 5

Синхронизация заказов ТОРО:
ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты


Для ГТК:

- В случае совпадения плановых дат выполнения КР на нескольких ЕО — разнести даты для обеспечения равномерного КТГ парка и загрузки ресурсов.


Для ЗИФ:

- Заказы, требующие остановки оборудования, и запланированные на время, не совпадающее со временем останова, необходимо перенести на ближайшее время планового остановочного ремонта.

Для ГТК:

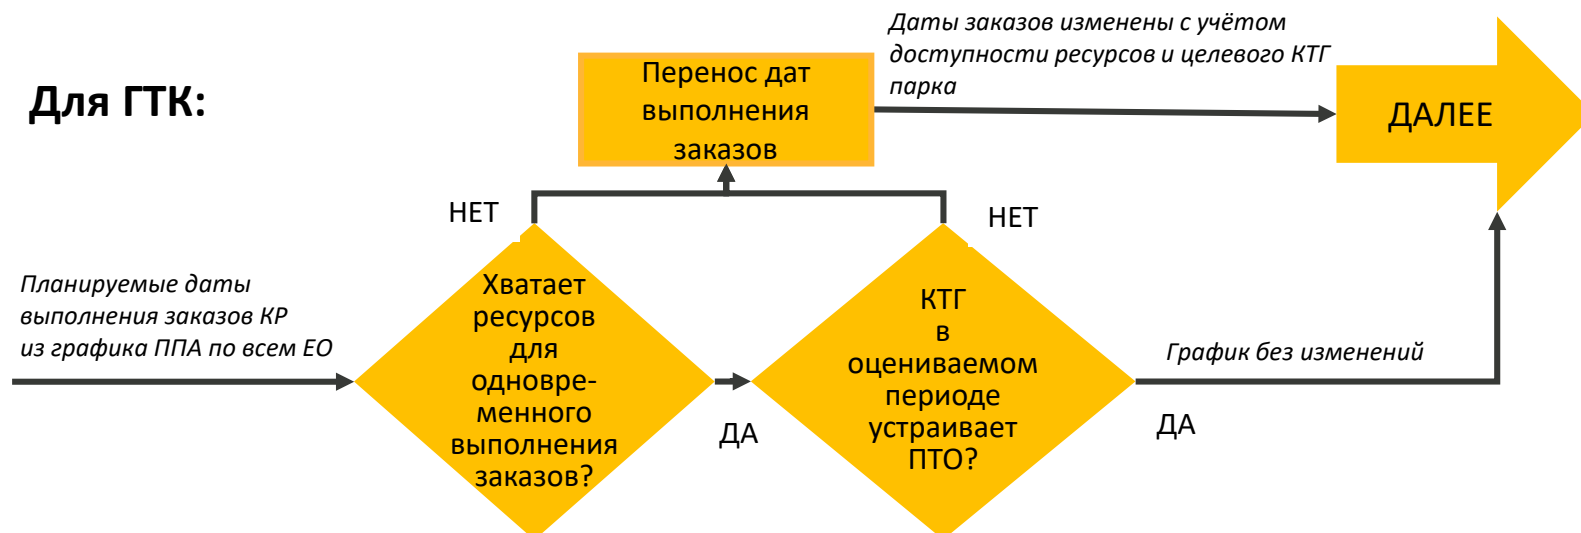

Для ЗИФ:

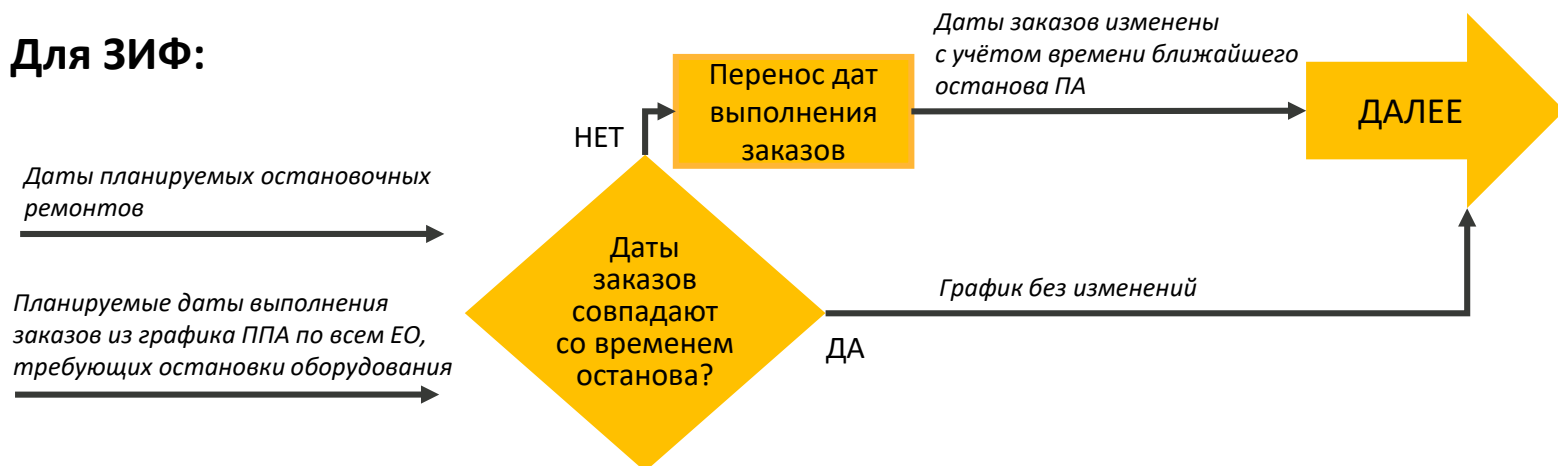

Формирование годовой программы ППА

Шаг 6 Формирование заказов ТОРО вручную

ШАГ 5

Синхронизация заказов с другими службами.

Синхронизация работ между службами необходима для уменьшения числа и времени простоев оборудования, а так же при необходимости участия смежных служб в запланированной работе.




Планировщик
ТОиР

Как синхронизировать по времени выполнение заказа с смежными службами (энергетика, КИП, механика), если это требуется?


Это важный вопрос. Если есть потребность в синхронизации работ, необходимо установить в заказе статус «ТРСХ» и инициировать совещание с планировщиками смежных служб. Если в результате совещания не удастся прийти к согласованному времени, то вопрос о синхронизации передаётся Старшему планировщику ТОиР, а затем, если его не получится решить - Главному специалисту ТОиР УО.

По результатам согласования в заказе указывается согласованное время и статус меняется на статус СИНХ».

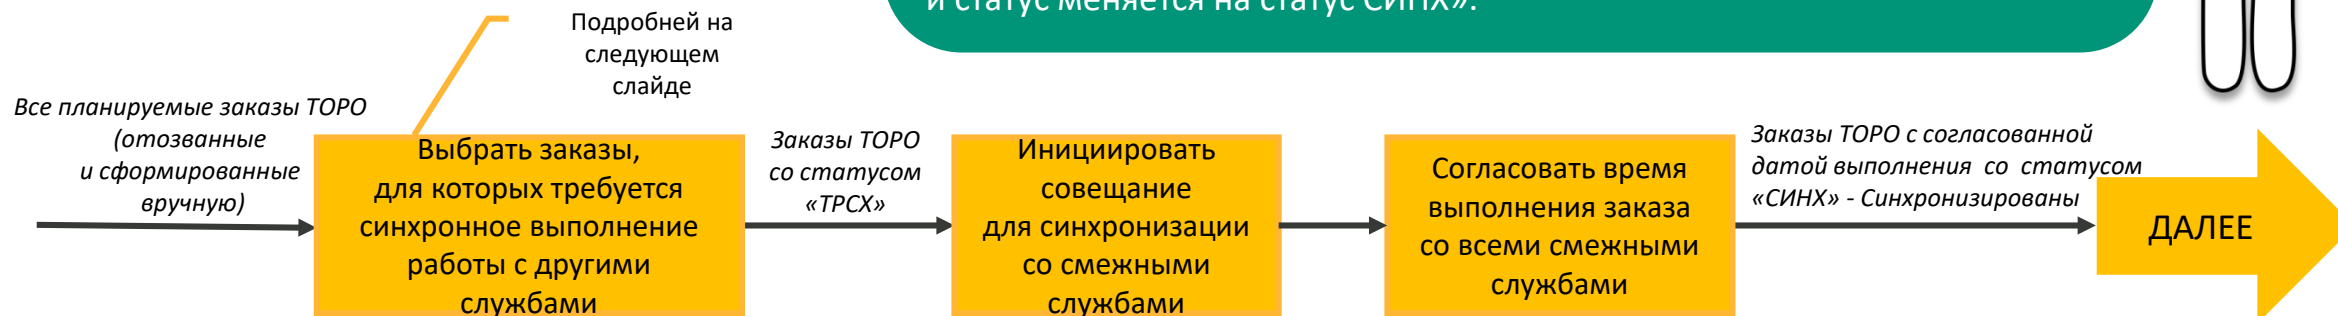

Формирование годовой программы ППА


Шаг 6 Формирование заказов ТОРО вручную

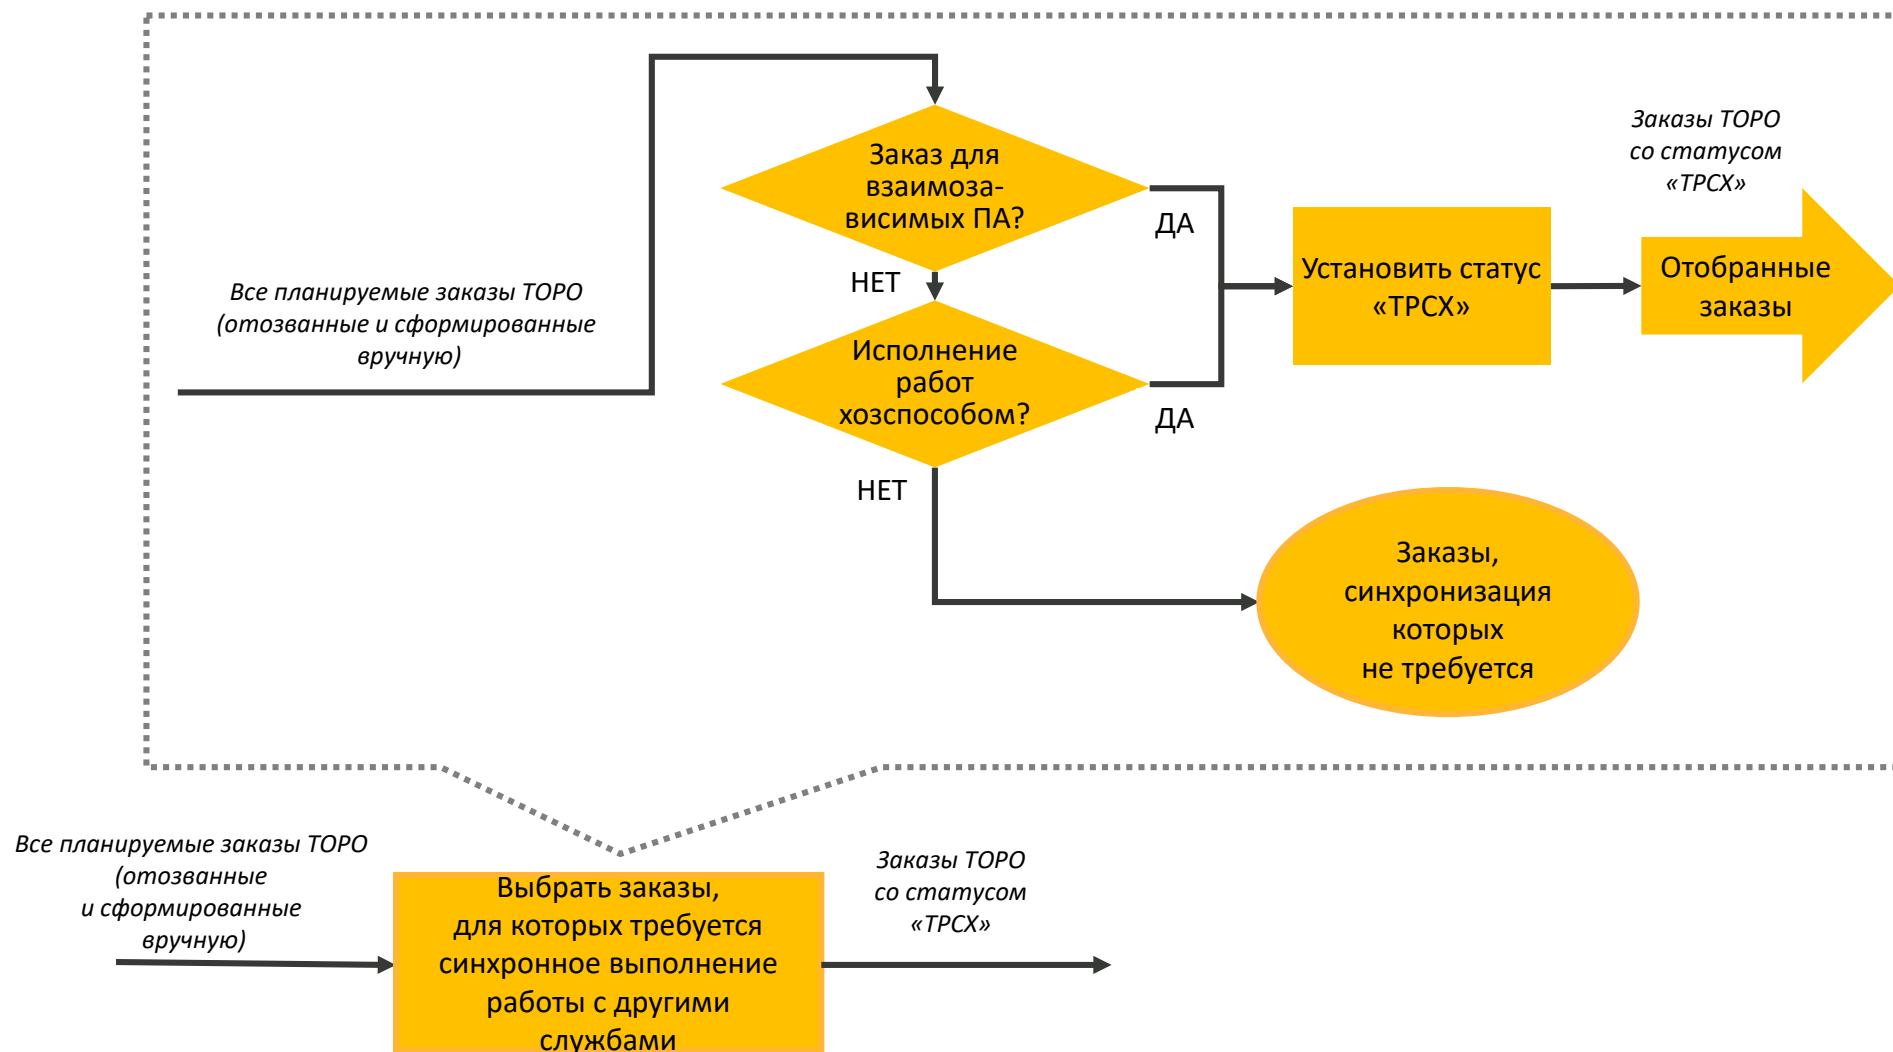

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 6 Формирование заказов ТОРО вручную

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

- Заказ ARP1 «Заказ на РПМ» формируется на техническое место для планирования потребности в РПМ, которые не планируются по отдельным работам и потребляются ежемесячно в определенном объеме (например, электроды, ветошь и т.д.).
- Заказ APRO «Прочие работы» формируется на техническое место и на единицу оборудования, или только на техническое место в случае, когда необходимо отразить заявки на прочие работы, не связанные с ремонтным простоем производственного актива.
- Заказ ARB1 «Заказ на выполнение ЭПБ» формируется вручную для ПА, для которых выполнение ЭПБ планируется впервые. Дополнительно к заказу включаются операции по подготовке оборудования.



Планировщик
ТОuP

Не все необходимые работы вошли уже в сформированные заказы.

- Как запланировать необходимые работы по указаниям надзорных органов (ЭПБ), прочих работ?
- Как спланировать приобретение регулярно потребляемых материалов (РПМ)?

Для исполнения указания надзорных органов, планирования приобретения РПМ и прочих работ заказы нужно создавать вручную. Такие заказы имеют свои обозначения.



Сводный перечень МТР
с категориями запасов
(несистемный документ)

Предписания надзорных
органов (ЭПБ)

Прочие работы (для
собственных нужд сервиса)

Формирование
заказов ТОРО
вручную

Заказы ТОРО
в статусе «ПЛАН»
- Планируется

ДАЛЕЕ

Практика №5



Формирование заказов ТОРО вручную


1. Есть необходимость выполнить предписания надзорных органов. Создайте заказ для их выполнения в системе.
2. У вас есть информация о нехватке РПМ в будущем периоде. Сделайте действия в системе в зоне вашей ответственности, которые обеспечат наличие РПМ.
3. Вы понимаете, что для выполнения работ необходимо обесточить высоковольтное оборудование. Какие будут ваши действия, в том числе и в системе?
4. Самосвал (любой ПА, в том числе и ГТК) находится на обслуживании у других служб/подразделений. Какие должны быть ваши действия для уменьшения времени простоя ПА точки зрения одновременного выполнения работ с другими службами/подразделениями при плановой остановке ПА?

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупки компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА

Шаг 7. Анализ оборотного фонда

ШАГ 7

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен проводимых во время КР

- Сформировать отчёт по ОФ в разрезе наличия на складе и исправности позиций ОФ.
- В случае отсутствия необходимой позиции ОФ на складе, принимается решение о применении нового МТР.
- В случае, если необходимая позиция ОФ неисправна, создать заказ на восстановление и разместить его в графике работ.



Нужно обеспечить наличие исправного ОФ к моменту его установки. Для плановых замен - подготовить ОФ к дате запланированного М/Д, для внеплановых замен - обеспечить доступность ОФ для снижения времени простоя.

Для узлов не являющимися компонентами создаётся заказ на восстановление (вид заказа AV02)

Для компонентов заказ вида AV01 создаётся при выполнении внеплановых работ.

Подробнее о работе с ОФ вы узнаете в отдельном учебном модуле.

Практика №4



Наполнение заказа операциями и компонентами


1. Найдите в системе ЕО с привязанными к ней позициями ОФ.
2. Определите наличие и исправность позиций ОФ на складе по определенной модели головной ЕО.

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупа компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Формирование годовой программы ППА



Шаг 8. Формирование сетевых графиков для планирования потребности в компонентах (узлах)

ШАГ 8

Создание сетевых графиков для закупа компонентов

- Планировщик формирует отчёт по оборотному фонду и создает в системе график «Об. вне смет строек (ОВСС/ОВИЗ) вне КС» в рамках группирующего СПП-элемента «Компонентный учёт», наполняет график новыми компонентами с плановыми ценами и создает при необходимости ТЗ на новые компоненты.
- Технический комитет УО принимает решение об использовании нового компонента.
- Потребность в новом компоненте включается в бюджет планируемого года после согласования цены Техническим Комитетом УО.

Если при анализе ОФ выявилась потребность в приобретении МТР (компонентов), то такая потребность передаётся в технический комитет для принятия решения об использовании нового компонента.



Согласованный график потребности с ценами компонентов и ТЗ

ДАЛЕЕ

Включение согласованных потребностей в годовой бюджет воздействий на ПА

Потребность в компонентах

Создает отчёт по оборотному фонду содержащий:

- Позиции ОФ
- Тех состояние/наработка
- Даты выполненных и плановых КР
- Кол-во к запуску и их стоимость
- Обоснование закупа

В системе сетевой график (СГ) с потребностями в компонентах и их стоимостью



Технический комитет УО




Планировщик проектов ТООР

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА

Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупа компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Согласование и утверждение годовой программы ППА




Шаг 9. Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 9

**Согласование заказов
и сетевых графиков
по статусной схеме**

со Старшим планировщиком
и Главным специалистом ТОиР.

Программа ППА согласовывается в следующей последовательности:

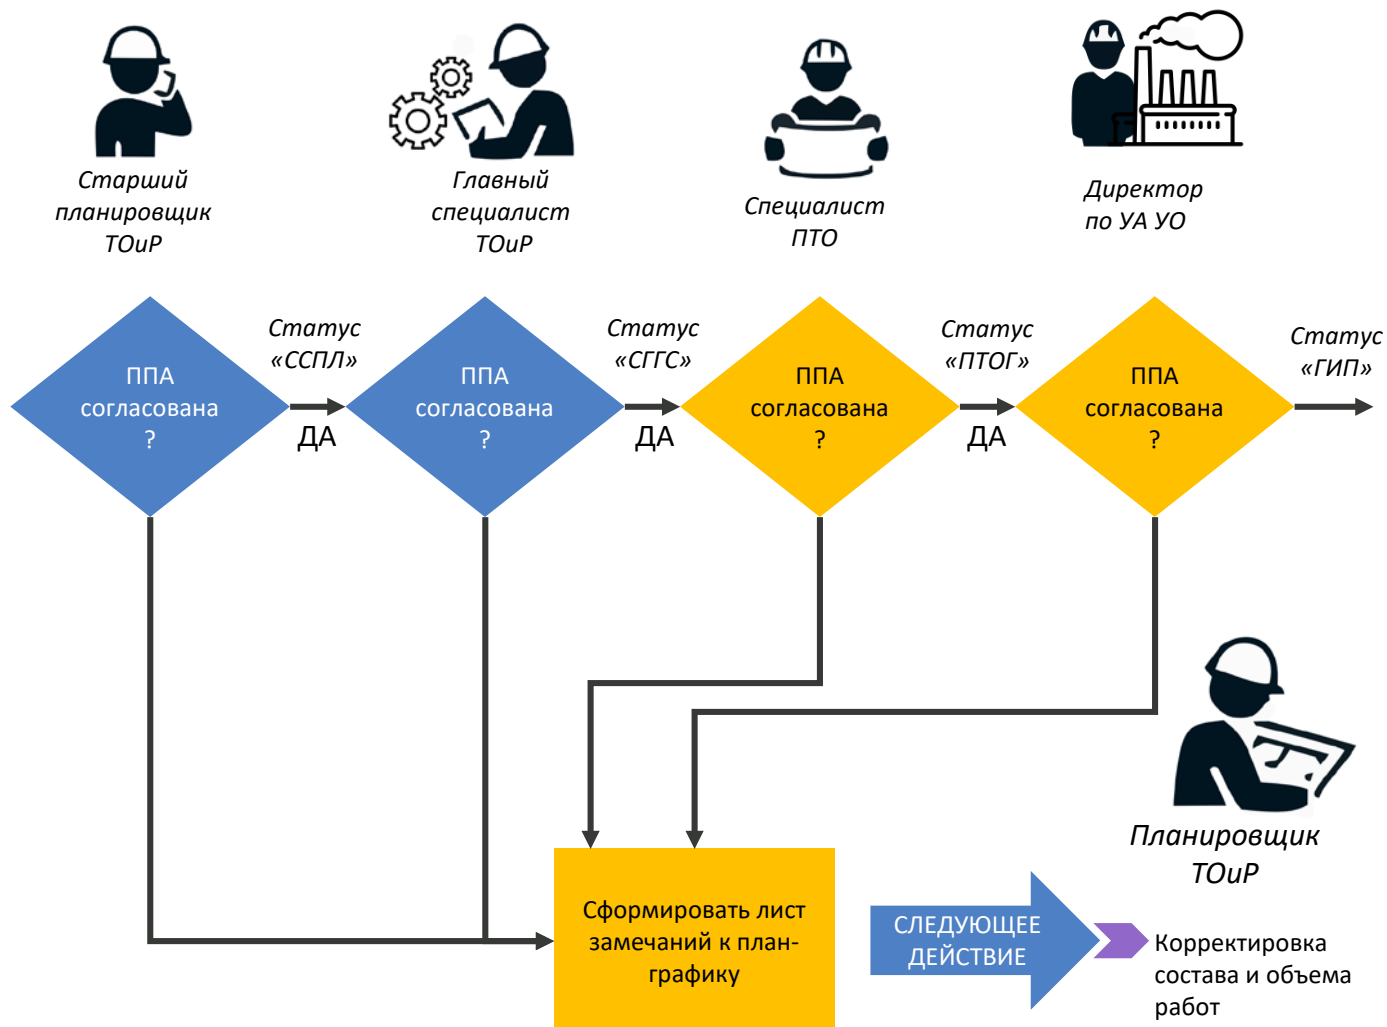

Согласование и утверждение годовой программы ППА



Шаг 9. Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 9

Согласование заказов Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

Планировщик ТОиР уведомляет Старшего планировщика о завершение планирования годовой программы ППА.



Я проверил и сделал балансировку всех ресурсов на заказах ТОРО, установил на заказах или сетевых графиках статус «СГПЛ» .

Теперь я информирую Старшего планировщика о завершении планирования годовой программы.

Перед отправкой программы я делаю массовую перекалькуляцию для обновления затрат с учётом последних изменений цен, которые могли произойти за время составления программы.

ДАЛЕЕ

Возможно, в процессе согласования будут замечания по доработке программы. Тогда в заказах, нуждающихся в доработке, будет стоять статус «КОРР».

Наша задача - внести необходимы коррективы для снятия этого статуса.

Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА)

Годовая программа ППА (системный документ)

Сетевой график (ПЛАН – планируется)

Установить статус «СГПЛ» – Отправлен на согласование планировщиком ТОиР

Отправить план-график Старшему планировщику на согласование

Заказ ТОРО (СГПЛ, ГОД – отправлен на согласование Планировщиком ТОиР, заказ включен в годовую программу ППА)

Годовая программа ППА (согласованная Планировщиком ТОиР)



Формирование годовой программы ППА

Шаг 9. Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 9

Согласование заказов Старшим планировщиком

Старший планировщик ТОиР выполняет проверку корректности, соответствия и обоснованности наполнения заказов ТОРО.

Для проверки удобно использовать системный отчет «Анализ операций заказов ТОРО» с индикацией отклонений операций заказов ТОРО от техкарт и добавленных вручную/удаленных операций.

Старший планировщик ТОиР проверяет:

- полноту сформированной годовой программы ППА (сформированы все заказы ТОРО и сетевые графики к отзывам по планам ТОРО);
- полноту охвата всего оборудования (по всему оборудованию в базе ПА (включая оборудование, планируемое к вводу в планируемом году) созданы заказы ТОРО по МВЗ, за исключением оборудования, не планируемого к эксплуатации в рассматриваемом году);
- полноту планирования требуемых мероприятий (если запланирован демонтаж, то проверяет необходимость и наличие операций по монтажу);
- корректность и обоснованность по составу и объему работ;
- балансировку ресурсов (материальных, трудовых);
- в случае наличия статуса «ОСМЧ – осмечено» – корректность данных осмечивания: наличие скан-копии сметы как приложения к заказу ТОРО и корректность ввода данных сметы в заказе ТОРО, расчет затрат по заказу ТОРО;
- соответствие требованиям Стандарта Компании «Управление деятельностью по ТОиР».



Согласование и утверждение годовой программы ППА



Шаг 9. Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР


ШАГ 9

Согласование заказов Главным специалистом ТОиР

Главный специалист ТОиР УО при получении годовой программы ППА, согласованной Старшим планировщиком ТОиР УО, проверяет на корректность по тем же пунктам, что и Старший планировщик.

При наличии замечаний формирует лист замечаний и передает Планировщику ТОиР УО на корректировку.

В случае отсутствия замечаний согласовывает план-график мероприятий ТОиР путем подписания на бумаге и простановки статуса «СГГС - согласовано главным специалистом» на заказах в системе.

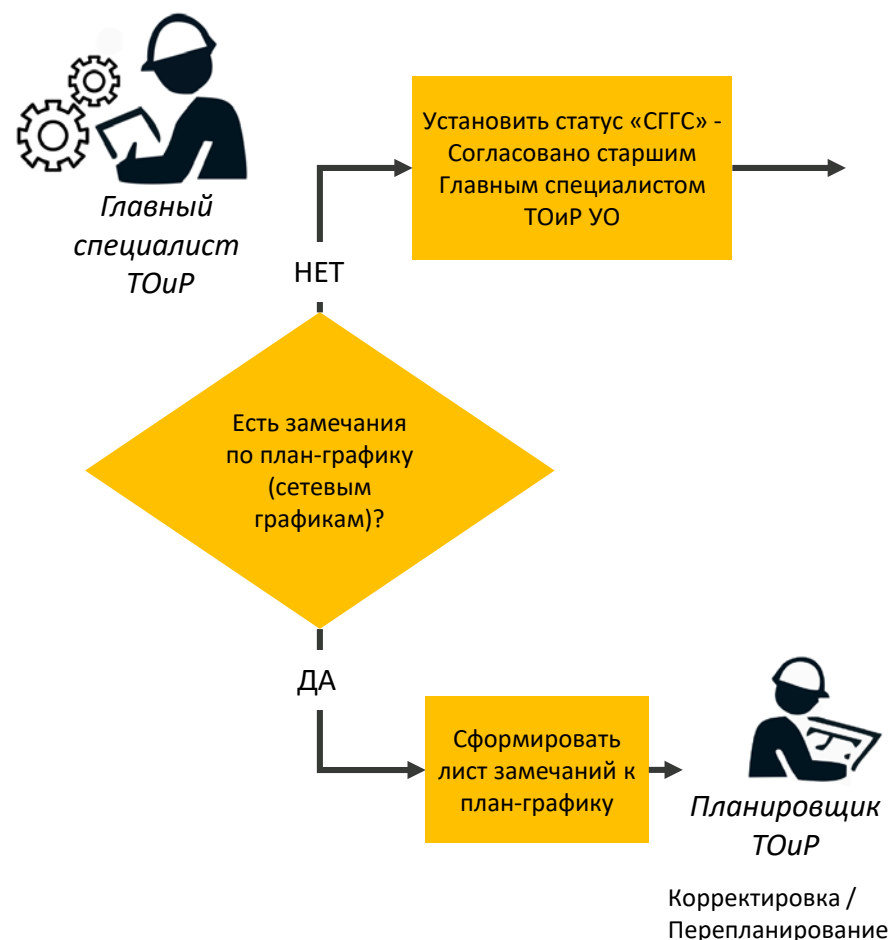


ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА



Выполняемые шаги

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ШАГ 1

Запланированы все необходимые ППР и разнесены по центрам затрат?

Проверка / Создание заказов и сообщений из планов ТОРО

ШАГ 2

Все операции и материалы внесены в заказы? Указана цена на все МТР? МТР могут быть поставлены в срок?

Корректировка/добавление операций и МТР в заказах. Запрос плановой цены. Анализ доступности.

ШАГ 3

Какие подрядные организации будут выполнять работы?

Формирование заказов по абонентской плате (ASR1) и на оплату услуг (ATU1)

ШАГ 4

Формирование заказов ТОРО по КИП и метрологии из сообщений ТОРО

ШАГ 5

Какие работы требуют синхронизации?

Синхронизация заказов ТОРО: ГТК — КР и СР, ЗИФ — остановочные ремонты и синхронизация заказов со сменными службами

ШАГ 6

Формирование заказов ТОРО вручную (ARP1, ATU1, ARB1, ARPO)

ШАГ 7

Капитальные ремонты обеспечены компонентами? Какие компоненты / МТР должны быть восстановлены или закуплены?

Анализ наличия ОФ и вновь закупаемых компонентов для замен, проводимых во время КР

ШАГ 8

Создание заказов (AV01, AV02) на ремонт/восстановление ОФ и формирование сетевых графиков по итогам анализа ОФ для закупа компонентов

ШАГ 9

Заказы и сетевые графики сформированы верно?

Согласование заказов и сетевых графиков по статусной схеме со Старшим планировщиком и Главным специалистом ТОиР

ШАГ 10

Стоимость работ и расчётный КТГ соответствует установленным предварительным ориентирам?

Формирование и защита предварительного бюджета

Согласование и утверждение годовой программы ППА

Шаг 10. Формирование и защита предварительного бюджета

ШАГ 10

Формирование и защита предварительного бюджета

Главный специалист формирует сводные отчёты по КТГ и стоимости заказов для передачи в бюджетный комитет.

В рамках согласования годовой программы ППА с ПТО в систему планирования FS-PER передаются данные по КТГ, в разрезе конкретный ЕО и парков.


В рамках согласования производится расчёт возможности выполнения производственной программы с учётом простоев оборудования. При необходимости вносятся корректировки в ремонтную программу либо происходит пересчёт производственной программы.

Срок передачи данных по КТГ и согласования программы ППА устанавливается в соответствии графиком годового планирования

После согласования КТГ Специалистом ПТО и проставления статус «ПТОГ», Главный специалист ТОиР с помощью АРМ Планировщика ТОиР печатает из Системы отчет «Годовая программа ППА», подписывает его и направляет Директору по УА УО на согласование.

Директор по УА УО проверяет:

- согласованность годовой программы ППА между разными службами/ подразделениями по взаимозависимым ПА;
- соответствие требованиям Стандарт Компании «Управление деятельностью по ТОиР».

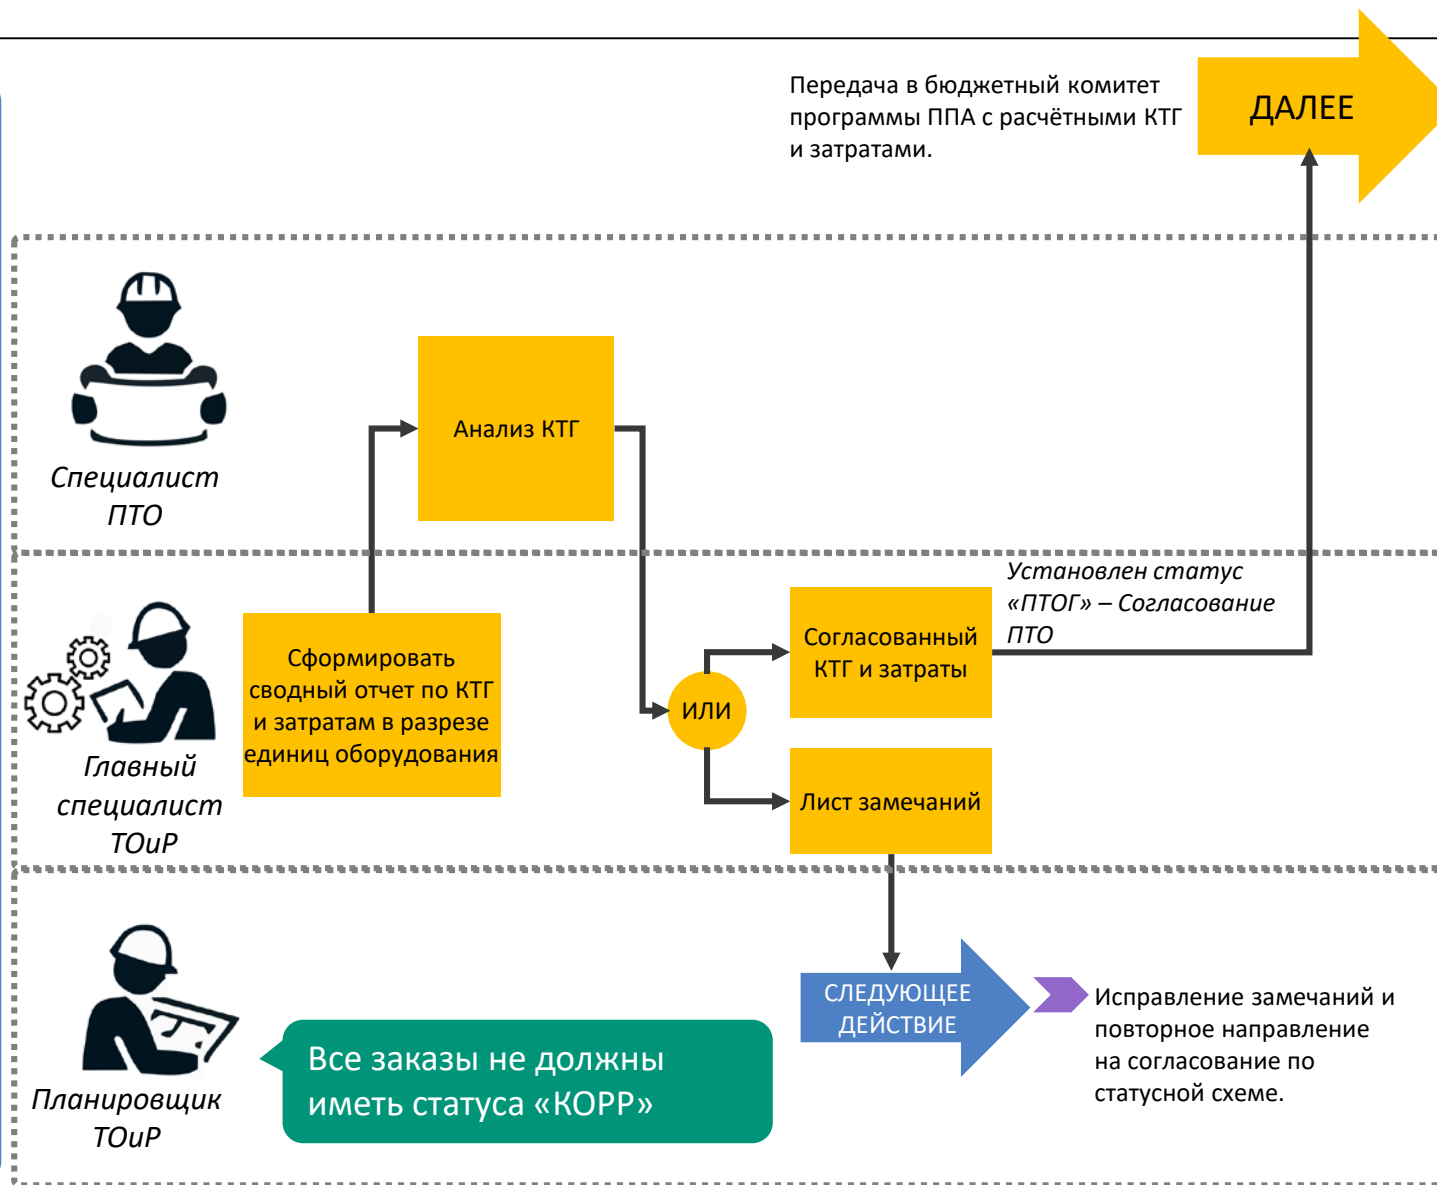

Согласование и утверждение годовой программы ППА




Уточнение годовой программы ППА после Итерации 1

В случае, когда программа уже рассмотрена и выданы ориентиры, Старший планировщик ТОиР анализирует согласованную годовую программу ППА на соответствие выделенному бюджету и определяет необходимость корректировки годовой программы ППА в соответствии с выделенным лимитом бюджета. В рамках анализа Старший планировщик ТОиР использует следующие инструменты системы:

- отчет «Бюджет план/факт»;
- отчет «Бюджет/распред./план/распред.»;
- отчет «Сводный план-факт ППА»;
- отчет «Запросы на корректировку бюджета ТОРО».

При соответствии годовой программы ППА бюджету Старший планировщик ТОиР отражает на заказах ТОРО статус «УТВГ». Далее, годовая программа ППА утверждается Операционным директором УО.

При необходимости корректировки годовой программы ППА Старший планировщик ТОиР формирует лист замечаний и возвращает Планировщику ТОиР на корректировку. Корректировка годовой программы ППА возможна только путем удаления (перенесения на следующий год) заказов ТОРО. Удаление заказов ТОРО осуществляется в соответствии с приоритетом (должны быть отменены заказы с наименьшим рангом), с учетом объема нехватки бюджета. При этом запрещено удаление/корректировка заказов ТОРО, потребность по которым законтрактована (заказы ТОРО на 1 квартал, а также с МТР длительного срока поставки). По результатам корректировки/ перепланирования осуществляется повторное согласование годовой программы ППА.

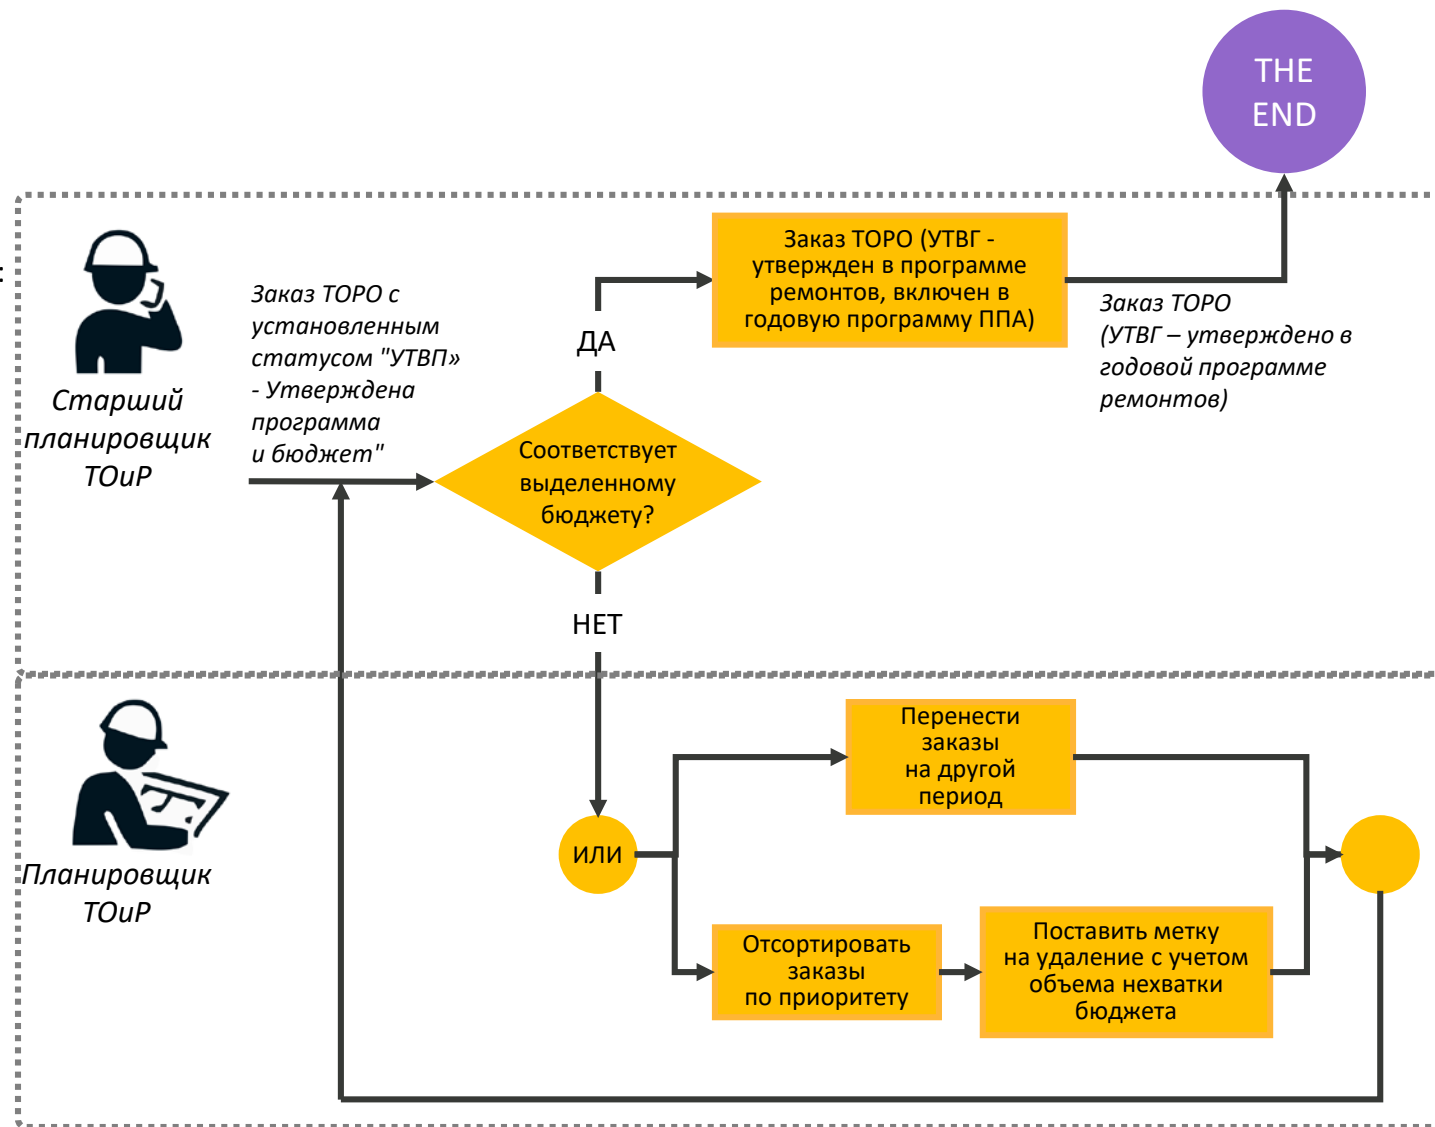

Подведение итогов



Пройдя описанные выше шаги, мы запланировали все необходимые воздействия на ПА. Стала понятна потребность в ресурсах и остановках оборудования для проведения обслуживания. Теперь нужно получившуюся годовую программу ППА показать всем заинтересованным сторонам для получения предварительного одобрения.

Да. Я внимательно проверил все потребности в работах, добавил недостающие и убрал лишние. Туда, где не было указано материалов, исполнителей, цен и т.д. — занес эти данные.



Планировщик
ТОиР



Отлично. Но после предварительного одобрения годовой программы заинтересованными сторонами нужно будет более детально подобрать запасные части, исполнителей и сбалансировать все ресурсы и остановки оборудования.

Об этом мы будем подробно говорить в следующих частях этого учебного модуля.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



...

1. ...



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТООИР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 4. Запуск годовой программы ППА»
