



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.5

Оперативное планирование (месячное, недельно-суточное планирование)

ЧАСТЬ 1

Введение



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 Место процесса годового планирования в процессах управления активами	
4 Цели и границы процесса годового планирования	6
5 Какие воздействия включаются в годовую программу ППА	6
6 Роли и обязанности участников процесса годового планирования	
5 Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА»	6
6 4 этапа годового планирования	
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

После изучения учебного модуля 1.4. «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании (регламентация процесса, роли, полномочия, обязанности). ВВЕДЕНИЕ», обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Место процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» в процессах Управления активами.
2. Цели и границы годового планирования.
3. Роли и обязанности участников бизнес-процесса годового планирования.
4. Этапы и метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА».

ВВЕДЕНИЕ

Из предыдущего учебного модуля вы узнали:

- что такое программа поддержания производственных активов;
- как выполняется компонентный учет активов;
- как назначаются программы обслуживания;
- а также как выполняются и учитываются воздействия, выполняемые для поддержания актива и которые позволяют обеспечивать требуемую работоспособность и функциональность актива при приемлемом уровне затрат.

Теперь наша задача посмотреть, как формируется годовая программа поддержания производственных активов в процессе годового планирования.


Эта часть – вводная, и мы посвятим ее общим вопросам:

- Какое место занимает процесс годового планирования в процессах Управления активами?
- Когда и где начинается и заканчивается процесс годового планирования?
- Как процесс годового планирования связан с другими горизонтами планирования?
- Кто принимает участие в годовом планировании, и что он должен делать в рамках этого процесса?
- Как можно оценить эффективность и результативность процесса планирования и сделать его лучше?
- С чего начинается создание, как формируется и как согласовывается годовая программа ППА?

Кроме введения учебный модуль содержит три части: «Часть 1. Предварительное планирование воздействий на основное оборудование», «Часть 2. Формирование годовой программы и бюджета ППА», «Часть 3. Согласование годовой программы и бюджета ППА».

**МЕСТО ПРОЦЕССА «ПП-07.02.03.01-ERP
ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПА» В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ
АКТИВАМИ**

Место процесса «ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА» в процессах управления активами

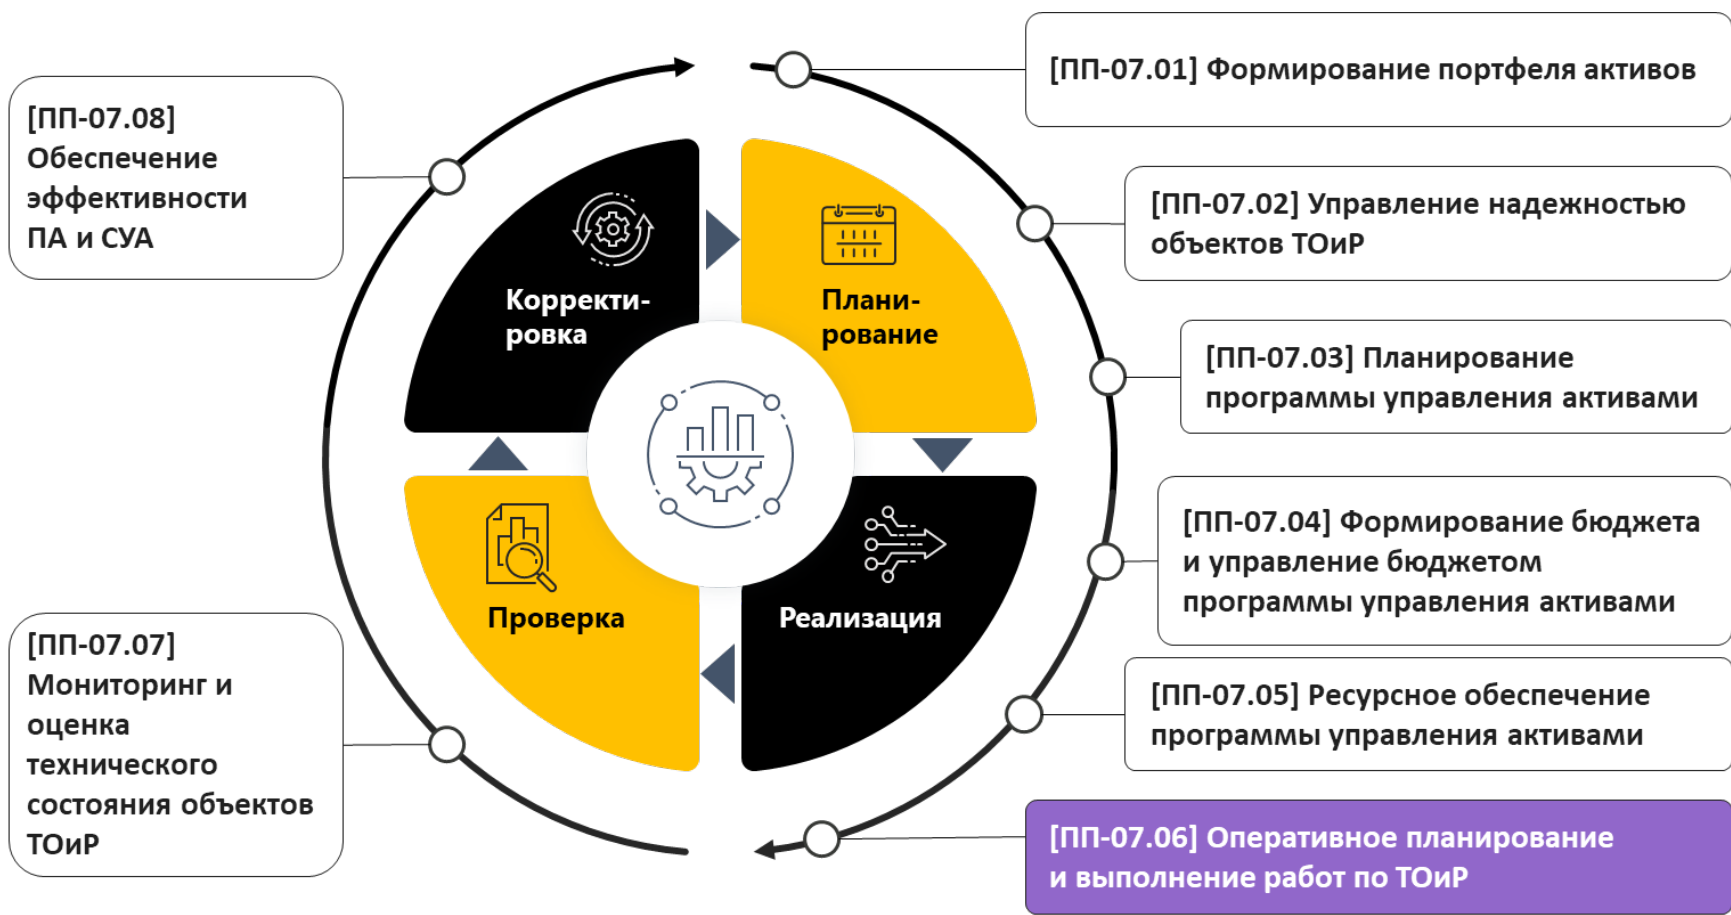

ПП-07.06
Оперативное планирование
и выполнение работ по ТООР

ПП-07.06.01-ERP
Оперативное
(месячное)
планирование
воздействий на ПА

ПП-07.06.02-ERP
Недельно-суточное
планирование
воздействий на ПА

ПП-07.06.03
Выполнение и
фактический учет
воздействий на ПА

ПП-07.06.03.01-ERP
Выполнение и
фактический учет
воздействий

ПП-07.06.03.02-ERP
Управление
внеплановыми
воздействиями ТООР

ПП-07.06.03.03-ERP
Управление авар.
воздействиями ТООР
критического
оборудования

ПП-07.06.03.04-ERP
Регистрация
ежемесячного
обслуживания

ПП-07.06.03.05
Фактическое
списание, монтаж
новых и ротация БУ
автомобилей






ПРОЦЕСС ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Процесс оперативного планирования



Входы и выходы процесса

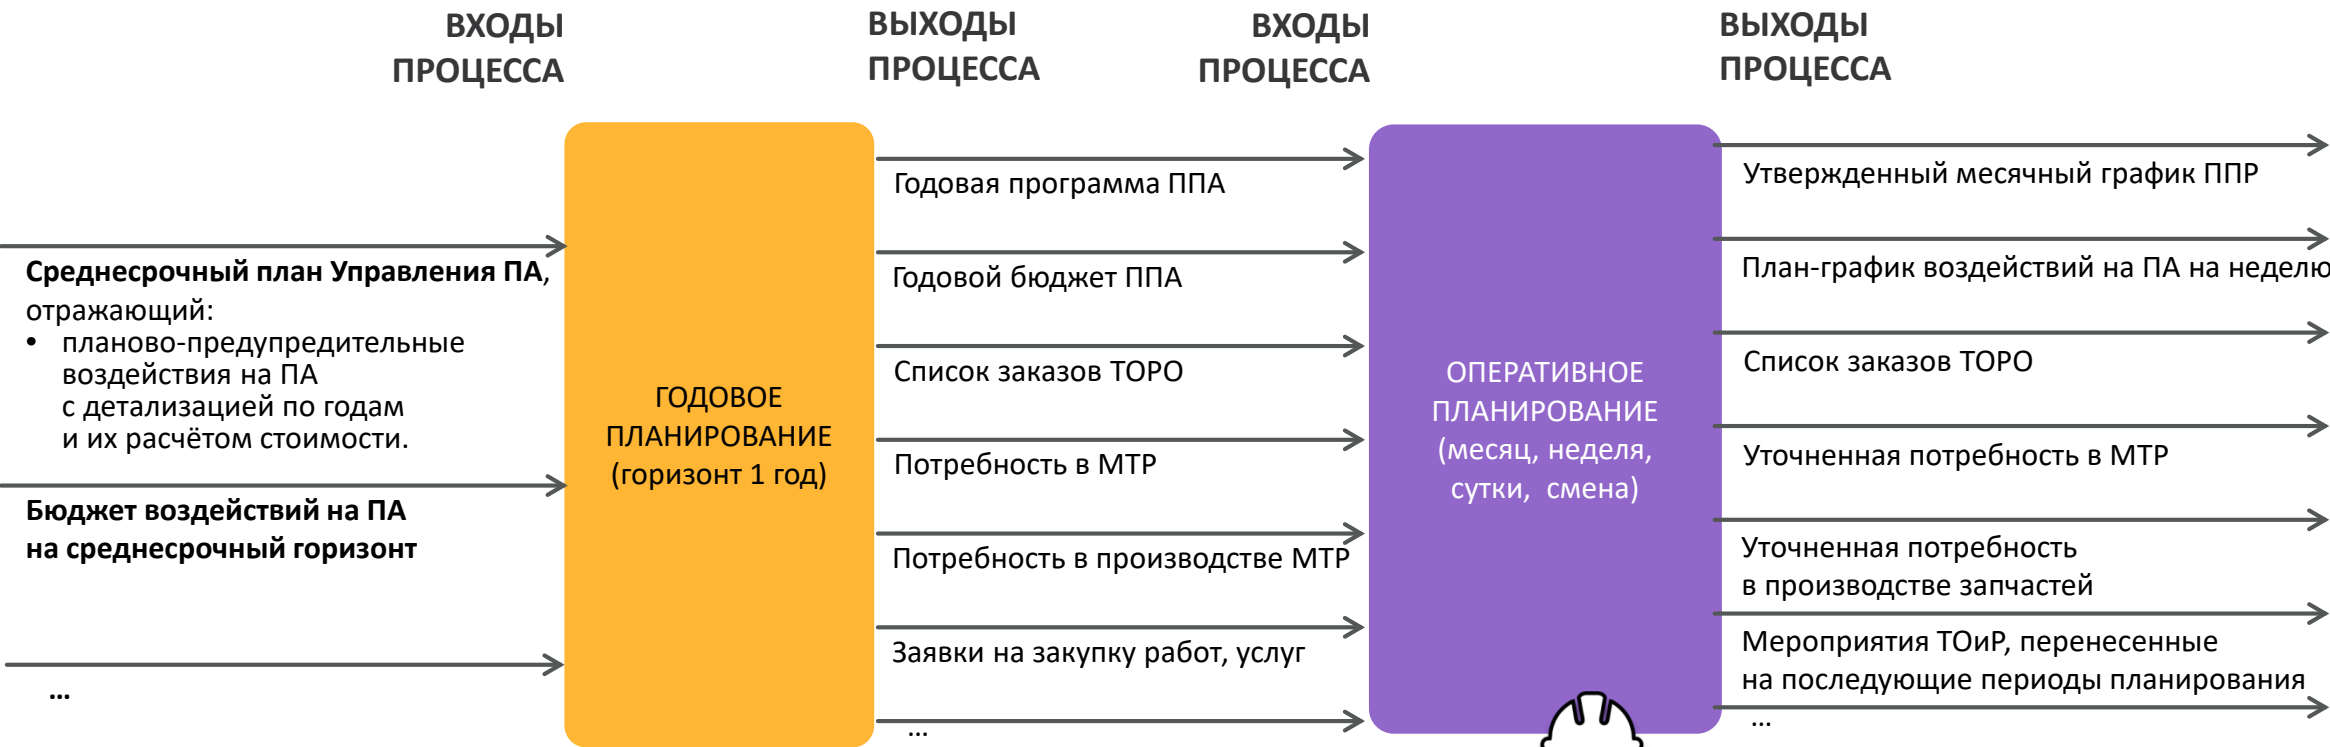


В прошлом учебном модуле мы изучили процесс годового планирования.

В результате выполнения этого процесса были получены определенные результаты (выходы процесса), которые теперь мы будем использовать в качестве входных данных (входов) для процесса оперативного планирования.



Процесс оперативного планирования

Какие воздействия подлежат планированию

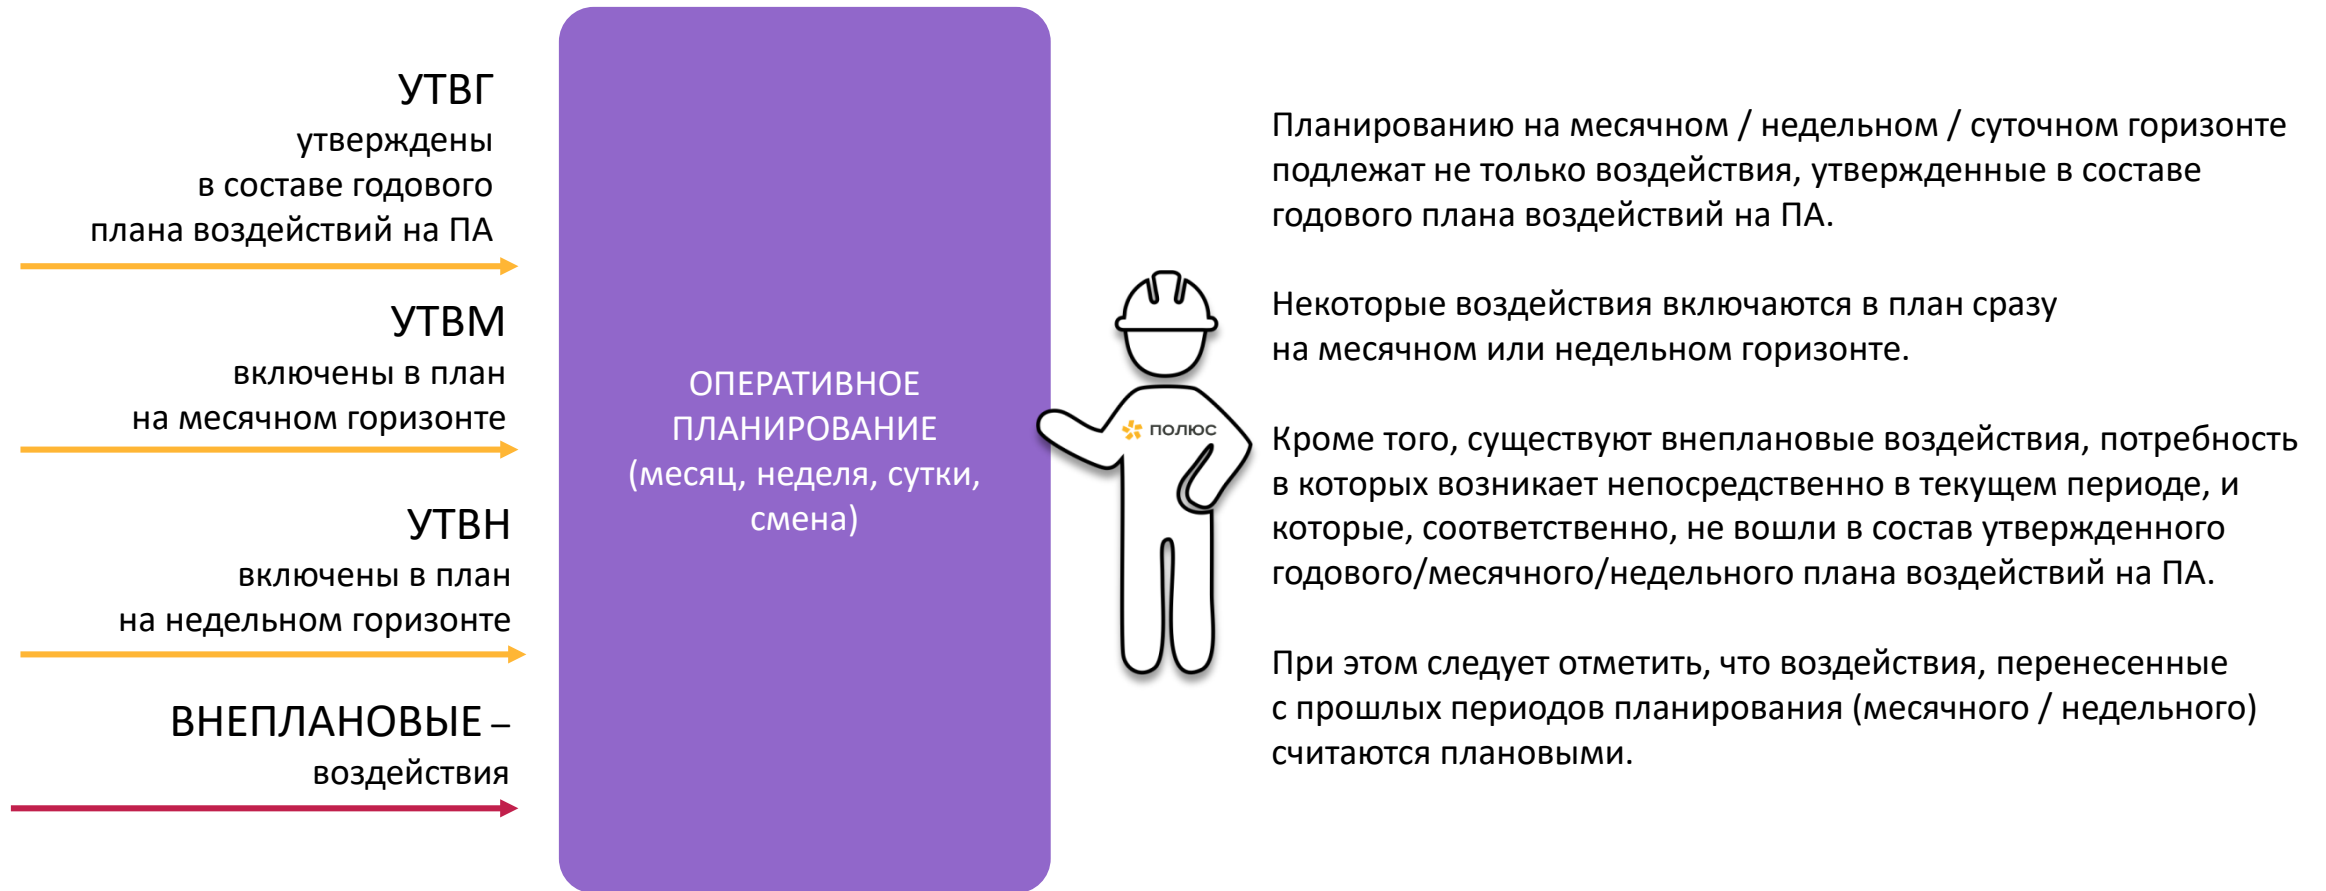



РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ГОДОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



Специалист ПТО



Планировщик ТОиР



Старший планировщик ТОиР



Главный специалист ТОиР



Директор по УА УО



Планировщик проектов ТОиР

Планировщик цен

Планировщик бюджета



В этом разделе мы рассмотрим функциональные роли и обязанности участников **Годового планирование программы поддержания ПА»**

Роли и обязанности участников процесса

Специалист по оперативному планированию ТОиР



Специалист
по оперативному
планированию ТОиР

- Актуализирует сроки плановых заказов по наработке
- Ранжирует заказы ТОРО
- Формирует план-график воздействий на ПА на неделю
- Проверяет доступность МТР по запланированным воздействиям на ПА
- Осуществляет замену МТР в заказах ТОРО
- Формирует заявки на изготовление ЗЧ собственного производства
- Осуществляет балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков
- Осуществляет корректировку сроков (в рамках недельного горизонта) и замену исполнителей
- Проверяет заказы ТОРО по лимитам затрат
- Синхронизирует план-график воздействий на ПА со смежными службами
- Осуществляет балансировку мощностей ВПС
- Анализирует документы от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг
- Проверяет корректность и актуализирует планы на ЕТО
- Осуществляет календарное планирование планов на ЕТО
- Анализирует предварительный график на ЕТО
- Создает заказы на ЕТО из планов ТОРО
- Организует согласование оперативного плана на неделю и ставит статус УВН на заказах ТОРО

Планировщик ТОиР



Планировщик ТОиР

- Актуализирует сроки плановых заказов по наработке
- Ранжирует заказы ТОРО
- Формирует план-график воздействий на ПА на месяц
- Проверяет доступность МТР по запланированным воздействиям на ПА
- Осуществляет замену МТР в заказах ТОРО
- Формирует заявки на изготовление ЗЧ собственного производства
- Осуществляет балансировку ресурсов собственного персонала и подрядчиков
- Осуществляет корректировку сроков (в рамках планируемого горизонта) и замену исполнителей
- Проверяет заказы ТОРО по лимитам затрат
- Синхронизирует план-график воздействий на ПА со смежными службами
- Осуществляет балансировку мощностей ВПС
- Анализирует документы от Сток-контролера / Менеджера по планированию закупок работ и услуг
- Организует согласование оперативного плана на неделю и ставит статус УВМ на заказах ТОРО

Роли и обязанности участников процесса

Старший планировщик ТОиР



Старший планировщик
ТОиР

- Согласовывает план-график воздействий на ПА после завершения подготовки план-графика Планировщиком ТОиР
- Выполняет согласование сетевых графиков для воздействий на ЗиС
- Печатает месячный план-график воздействий на ПА
- Осуществляет деблокирование заказов ТОРО
- Осуществляет отражение статуса утверждения недельного плана-графика воздействий на ПА

Роли и обязанности участников процесса

Плановик ЦРММ



Плановик ЦРММ

- Рассматривает возможность производства деталей и изделий собственными силами
- Создает заказы на восстановление вида AV01 и AV02

Роли и обязанности участников процесса

Согласующие роли



Главный специалист ТОиР

- Согласовывает план-график воздействий на ПА после согласования Старшим планировщиком ТОиР



Специалист ПТО

- Согласовывает план-график воздействий на ПА после согласования Главным специалистом ТОиР




Директор по УА УО

- Утверждает план-график воздействий на ПА Предприятия после согласования Специалистом ПТО

МЕТРИКИ ПРОЦЕССА «ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА»

Метрики процесса «Оперативное планирование»

Что показывают и для чего нужны

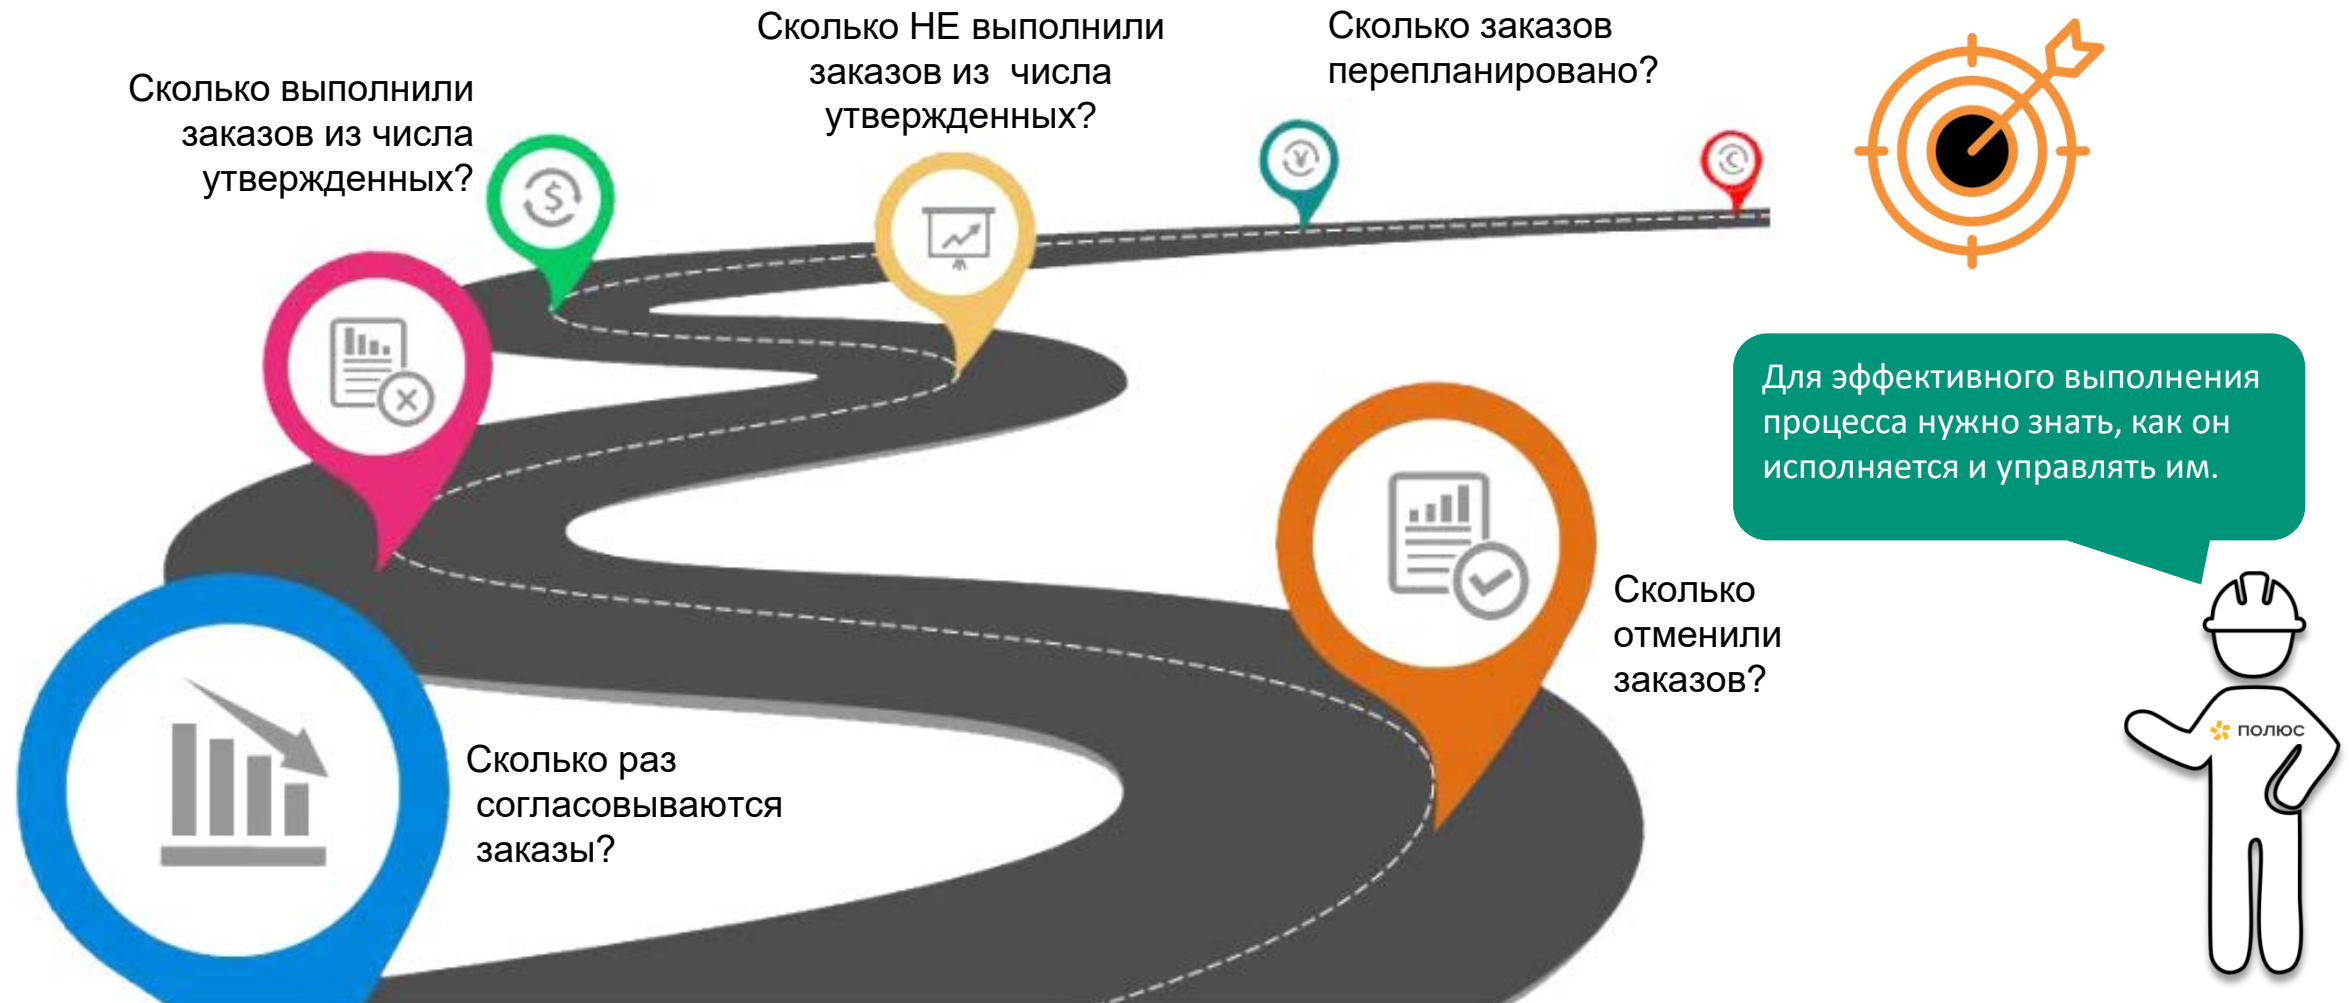

Метрики эффективности бизнес-процесса оперативного планирования

Название, определение, единицы измерения, источники данных

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Доля отмененных заказов ТОРО	Отношение количества удаленных заказов к общему количеству планируемых заказов	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW). Заказы ТОРО со статусом «МТКУ – метка на удаление»
2	Доля выполненных заказов ТОРО	Отношение количества выполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW)э Заказы ТОРО со статусом «ТЗКР – технически закрыт»
3	Доля невыполненных заказов ТОРО	Отношение количества невыполненных заказов к общему количеству согласованных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW). Заказы ТОРО без статуса «ТЗКР – технически закрыт»
4	Доля перепланированных заказов ТОРО	Отношение количества заказов, перенесенных на следующий период планирования, к общему количеству утвержденных заказов на недельном горизонте	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на производственные активы (зеркальный отчет BW
5	Эффективность планирования мероприятий на недельно- суточном горизонте	Отношение фактического количества мероприятий, реализованных в рамках недельно-суточного планирования, к плановому количеству мероприятий в утвержденном недельно-суточном плане	%	Недельно-суточный план ТОиР Компании. Отчет о фактическом исполнении недельно-суточного плана ТОиР
6	Эффективность согласования заказов ТОРО	Отношение количества итераций согласования заказа с ответственными лицами до его утверждения к регламентированному количеству согласований	%	Гибкий отчет «Планирование и исполнение воздействий на ПА (зеркальный отчет BW)»

Метрики эффективности бизнес-процесса оперативного планирования

Причины не достижения целевых показателей

Что может пойти не так?

По каким причинам возможно ухудшение процесса годового планирования?



Метрики эффективности бизнес-процесса оперативного планирования

Причины не достижения целевых показателей



- Актуализация сроков работ в заказах ТОРО не проведена/проведена ошибочно
- Не присвоено значение критичности Заказам ТОРО
- Проверка доступности запланированных МТР проводится несвоевременно или не проводится
- Анализ целесообразности выполнения работ хоз. способом или подрядными организациями не проведен
- Запланированные затраты не соответствуют бюджетным лимитам
- План-график воздействий на ПА не выровнен со смежными службами на уровне подразделения
- Некорректно определены сроки и перечень работ по ремонту оборудования, МПЗ/услуги для ремонта
- Заказы ТОРО учтены в плане-графике воздействий на ПА не в полном объеме
- Заказы ТОРО созданы не по всему оборудованию, для которого есть планы ремонтов
- План-график воздействий на ПА не соответствует целевым КТГ
- Исполнение заказа ТОРО без утвержденного плана-графика остановочных ремонтов
- Потребность скорректирована некорректно/несогласованно
- Планируемое проведение работ по ТОиР экономически неэффективно

Метрики процесса «Годовое планирование воздействий на ПА» полюс

Как не допустить ошибок



Для того, чтобы процесс выполнялся качественно и эффективно, необходимо строго следовать Регламенту процесса и соблюдать все инструкции.

Учебный модуль содержит материалы, разработанные на основе Регламента Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов».


Мы выделили основные этапа процесса планирования.

Познакомимся с ними.



ЭТАПЫ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


ЭТАП 1. Формирование плана-графика воздействий



РЕЗУЛЬТАТ:

Сформирован месячный / недельный план-график выполнения актуальных заказов ТОРО с учетом их ранжирования.


ЭТАП 2. Проверка доступности МТР и оптимизация запланированных мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Все заказы в план-графике обеспечены МТР и исполнителями работ. Все ресурсы сбалансированы. Работы синхронизированы со смежными службами.

ЭТАП 3. Согласование плана-графика воздействий на ПА



РЕЗУЛЬТАТ:

Утверждены: план-график воздействий на ПА на месяц / неделю и график остановок основного оборудования. КТГ соответствует целевому значению. МТР переданы в закупку.

Оперативное планирование выполняется на месячном и на недельном горизонте, и на каждом горизонте должны быть выполнены четыре этапа.

Они во многом схожи, но есть и некоторые различия. Так, например, на недельном планировании выполняется, в том числе, и планирование ЕТО.

Кроме этого, этими видами планирования занимаются разные специалисты — месячным занимается Планировщик ТОиР, а недельным — Специалист по планированию ТОиР.

Далее мы пройдем по всем трем этапам и обсудим нюансы процессов на месячном и на недельном горизонтах.





ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ





Во вводной части учебного модуля **1.4** «Организация процесса годового планирования» мы обсудили общие вопросы, связанные с планированием программы поддержания производственных активов.

Мы выяснили, что бизнес-процесс «ПП-07.03.03. Годовое планирование воздействий на ПА» является процессом второго уровня процесса «ПП-07.03. Планирование программы управления активами».

Вспомнили, как связаны между собой горизонты планирования: долгосрочное, среднесрочное, годовое и оперативное планирование.

Обозначили цель и рамки процесса годового планирования.

Выяснили, что в годовую программу включаются только воздействия по ПА, планируемым к эксплуатации в плановом году.

Перечислили роли и обязанности участников бизнес-процесса и обсудили, как оценить эффективность и результативность самого процесса, а также что может повлиять на ненадлежащее выполнение этого процесса.

Потом мы описали основные этапы процесса годового планирования.

Теперь наша задача заключается в том, чтобы пройти по всем шагам описываемого процесса и понять их логику. Следующую часть этого учебного модуля мы посвятим подробному рассмотрению первых двух этапов годового планирования.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала

№1

...?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 1. Предварительное планирование воздействий на основное оборудование»
