

Приложение №15**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Управление проектами по замене оборудования (ОВП)»

№ ПП-07 Р-038 О УК версия 1

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Термины и сокращения	4
3.	Основные положения	7
4.	Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса.....	10
5.	Метрики эффективности бизнес-процесса	50
6.	Риски и контрольные процедуры	50
7.	Модель бизнес-процесса.....	54
8.	Нормативные ссылки	57
9.	Порядок внесения изменений	58
10.	Контроль и ответственность за исполнение Регламента	58
11.	Список приложений	59

1. Назначение и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)» (далее – Регламент) является установление единого порядка планирования, согласования, утверждения и реализации проектов по замене оборудования или по приобретению оборудования на увеличение мощностей без замены текущего оборудования (далее – проект ОВП).

Задачами Регламента являются формализация процедур и описание используемых инструментов бизнес-процессов, описываемых в рамках границ данного Регламента.

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно – Компания), при планировании, согласовании, утверждении и реализации проектов по закупке оборудования вне проекта капитального строительства (далее – проект ОВП).

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Регламент применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Регламент распространяется на следующие процессы:

- «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на производственный актив (ПА) и инвестиционной программы» от момента формирования инициативы проекта ОВП до момента утверждения проекта ОВП в состав программы воздействий на ПА и инвестиционной программы;
- «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)» от момента деблокирования проекта ОВП до закрытия проекта ОВП.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Сокращение	Определение
Архив идей	Централизованное на уровне УО хранилище инициатив по проектам ОВП, которое ведется как вне системы (если заявка на ОВП не была еще заведена в системе), так и в системе (посредством установки отклоненной заявке в системе SAP S/4HANA статус «В архиве»).
Инвестиционная программа	Совокупность Инвестиционных заявок, текущих проектов, принятых к реализации, направленная на достижение стратегических и оперативных целей Компании, соответствующая требованиям по срокам окупаемости и рентабельности инвестиций.
Инвестиционный проект	Экономически обоснованный комплекс взаимосвязанных и неделимых мероприятий, направленный на реализацию замысла или идеи, с заданными сроком осуществления и суммой инвестиционных затрат. Инвестиционные проекты могут быть комплексными – затраты проекта осуществляются в рамках нескольких функциональных направлений и включаются в несколько функциональных инвестиционных программ.
Компания	ООО «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Компонент материала	Отдельный элемент сетевого графика, с помощью которого заявляется потребность в оборудовании, материалах или услугах для выполнения проекта ОВП.
Назначенный срок службы	Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя (ГОСТ 27.002-2015).
Невостребованное имущество	МТР, находящиеся на балансе УО, не востребованные в текущей деятельности.
Непроизводственное оборудование (Непроизводственное ОВП)	В целях настоящего Регламента, оборудование классифицируется как непроизводственное, если оно не участвует непосредственно ни в основном технологическом процессе, ни в обеспечении основного технологического процесса.

Сокращение	Определение
	К непроизводственному оборудованию относятся (включая, но не ограничиваясь): • оборудование АХО; • оборудование для обеспечения ОТиПБ.
Оборудование вне проектов (ОВП)	Оборудование, не включенное в состав бюджетов инвестиционных проектов капитального строительства.
Оборудование, относящееся к 1 группе проекта производственного ОВП	Оборудование, приобретаемое взамен изношенного, которое имеет аналогичные характеристики с выбываемым оборудованием. Аналогичными считаются характеристики, отличающиеся не более чем на 10% от основополагающей характеристики производительности заменяемого оборудования (например, основополагающими характеристиками являются: для самосвала – грузоподъемность; для экскаватора – объем ковша).
Оборудование, относящееся ко 2 группе проекта производственного ОВП	Оборудование, которое приобретается вне проектов капитального строительства: • дополнительно для расширения и/или повышения эффективности производства; • взамен изношенного и не попадает под критерии 1 группы производственного ОВП.
Операция сетевого графика (ОСГ)	Отдельный элемент сетевого графика, имеющий свою продолжительность, начало и окончание. Операции могут быть связаны друг с другом в определенной последовательности.
Опережающая закупка	1) Вхождение в обязательство по закупке МТР/ услуг с поставкой/оказанием услуг в будущих календарных периодах, следующих за текущим бюджетным годом. 2) Закупка МТР/услуг по потребности следующих календарных периодов с поставкой/оказанием услуг в текущем бюджетном году.
Основополагающая характеристика оборудования	Основная характеристика оборудования, которая описывает выполнение основных функций оборудования (например, для самосвала – грузоподъемность и объем кузова; для экскаватора – объем ковша; для насоса – объем перекачиваемой жидкости, давление). Основополагающая характеристика оборудования определяется на основании паспорта оборудования или иной технической документации от завода-изготовителя.
Программа ОВП	Совокупность проектов ОВП, принятых к реализации в рамках направления инвестиционной деятельности по ОВП.
Проект ОВП	Мероприятие по приобретению нового оборудования вне проектов или замене изношенного оборудования без проектов капитального строительства, включая мероприятия по монтажу и демонтажу.
Проект целевой программы	Конкретное мероприятие, соответствующее критериям включения в состав целевой программы, реализуемое в рамках одного УО.
Производственное оборудование (Производственное ОВП)	В целях настоящего Регламента, оборудование классифицируется как производственное, если оно удовлетворяет одному из следующих критериев:

Сокращение	Определение
	• участие закупаемого оборудования в основном технологическом процессе Компании либо в обеспечении их функционирования; • наличие карточки ОС выбывающего оборудования в SAP S/4HANA (при замене оборудования взамен изношенного).
Производственный актив	Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для Компании. К производственным активам относятся активы, находящиеся на балансе предприятий Компании, необходимые для обеспечения основной и вспомогательной производственной деятельности.
Сетевой график	Объект, отражающий перечень и последовательность проводимых работ. Сетевой график состоит из заголовка и операций.
Сток-контролер	Сотрудник Компании, определяющий объемы закупки на основании Плана потребности и уровней АТЗ и запаса ГОиЧС, а также с учетом требуемого уровня страхового запаса, имеющихся на складах запасов и ожидаемых поступлений.
Управляемое общество (УО)	Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа.
Управляющая компания (УК)	ООО «УК Полюс», осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ.
Целевая программа	Соответствующие единым целям и критериям объединённые в одну программу проекты. Целевые программы инициируются УК и реализуются на нескольких УО. Направлениями целевых программ являются (включая, но не ограничиваясь): • стандартизация и унификация; • снижение техногенных рисков; • повышение энергоэффективности; • приведение в соответствие экологическим стандартам и требованиям ОТиПБ.
Lead Time	Время (в календарных днях), необходимое для обеспечения потребности в МТР от размещенного Планировщиком потребности Заказа на списание (регистрации потребности) до поставки на склад Бизнес-заказчика.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA.
SAP S/4HANA (Система)	Часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия.

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
АСДМ	Автоматизированная система диагностики и мониторинга
АСКИ	Автоматизированная система контроля инвестиций

Сокращение	Расшифровка
АХО	Административно-хозяйственное обеспечение
БПиТП	Блок по производству и технической политике
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГТК	Горнотранспортный комплекс
ЕКП	Единый календарный план производства
ЕО	Единица оборудования
ЕК МТР	Единый классификатор материально-технических ресурсов
ИЦ	Исследовательский центр
КД	Концептуальный дизайн
КП	Контрольные процедуры
КСУ НСИ	Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией
ЛНА	Локальный нормативный акт
МТР	Материально-технические расходы
МТО	Материально-техническое обеспечение
НВИ	Невостребованное имущество
неПА	Непроизводственный актив
НМД	Нормативно-методическая документация
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОВП	Оборудование вне проектов
ОЗМ	Основная запись материала
ОЛ	Опросный лист
ОПиКИ	Отдел планирования и контроля инвестиций
ОС	Основное средство
ОСГ	Операция сетевого графика
ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ПА	Производственный актив
ППА	Программа поддержания производственных активов
ППЗ	Подгруппа плана закупа
ПТО	Производственно-технический отдел
СПП-элемент	Элемент структурного плана проекта
Система	Информационная система SAP S/4HANA
СЭД	Система электронного документооборота
ТЗ	Техническое задание
ТК	Технический комитет
ТКП	Технико-коммерческое предложение
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонт
ТОТС	Технический объект титульного списка
УА	Управление активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
ЦП	Целевая программа
CIM	Common Information Model
LT	Lead time
МСВ	Maintenance Cost Budgeting

3. Основные положения

3.1. Общие характеристики проектов ОВП

3.1.1. Под проектами ОВП понимаются мероприятия по приобретению нового оборудования вне проектов или замене изношенного оборудования без проектов капитального строительства, включая мероприятия по монтажу и демонтажу, вне

зависимости от привлекаемого ресурса, хозяйственного способа или внешнего подряда.

3.1.2. Для целей разделения ответственности, маршрутов согласования заявок на ОВП и отдельного лимитирования бюджета проекты ОВП подразделяются на следующие типы:

Таблица №1 «Классификация проектов ОВП»

Тип проекта ОВП	Критерии отнесения	Примеры
Производственное ОВП 1 группы	- Участие оборудования в основном технологическом процессе Компании, либо в обеспечении их функционирования (например, линии электропередачи), при выполнении следующих условий: - приобретение оборудования взамен изношенного, которое имеет аналогичные характеристики с выбываемым оборудованием. Аналогичными считаются характеристики, отличающиеся не более чем на 10% от основополагающей характеристики производительности заменяемого оборудования (например, основополагающими характеристиками являются: для самосвала – грузоподъемность; для экскаватора – объем ковша); - наличие карточки ОС по выбываемому оборудованию. - Приобретение средств воспроизводства для осуществления ремонтных работ оборудования (инструмент, спец. оснастка) стоимостью более 100 тыс.руб. включительно, не относящихся к группе ППЗ 2.2.7 «Инструмент электрический и пневматический».	- Приобретение насоса millMAX 10x8-30 взамен насоса millMAX 10x8-30 - Приобретение насоса ц/б 10/8 Е-М взамен насоса ц/б 10/8 Е-М - Приобретение сварочного оборудования.
Производственное ОВП 2 группы	- Участие оборудования в основном технологическом процессе Компании либо в обеспечении их функционирования (например, линии электропередачи), при выполнении следующих условий: - приобретение дополнительного оборудования для расширения и/или повышения эффективности производства, а также приобретение оборудования взамен изношенного, не попадающего под критерии ОВП 1 группы. - необходимость создания карточки ЕО в соответствии с Методическими указаниями «Методика ведения НСИ ТООР».	- Приобретение дополнительного самосвала CAT 777. - Приобретение самосвала CAT 785 взамен выбываемого самосвала CAT 777.
Непроизводственное ОВП	- Приобретение оборудования, не участвующего в основном технологическом процессе, в обеспечении основного технологического процесса, не относящегося к следующим группам ППА: 2.2.7 «Инструмент электрический и пневматический». 2.13.06 «Бытовые приборы». 2.13.12 «Мебель».	- Приобретение вахтового автобуса. - Приобретение стабилизатора напряжения.

Тип проекта ОВП	Критерии отнесения	Примеры
Оборудование ИЦ	Приобретение оборудования для нужд ИЦ	Приобретение шкафа сушильного с противнями для проб Азимут ЭШС-10.8.12П.

3.1.3. Проекты ОВП включаются в инвестиционную программу с разделением по статьям СИМ в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью. На каждый тип проекта ОВП выделяется отдельный лимит на объекте ТОТС в разрезе месторождений. Перераспределение лимитов между объектами ТОТС осуществляется в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью.

3.1.4. Проект производственного ОВП 1 группы также включается в 1 раздел бюджета поддержания производственных активов (далее – бюджет ППА).

3.2. Укрупненный порядок выполнения процедур управления программой ОВП

3.2.1. При возникновении потребности в закупке производственного ОВП вне системы формируется инициатива, которая рассматривается Техническим комитетом УО. По результатам рассмотрения инициатив Техническим комитетом УО принимается решение о формировании заявки на ОВП в системе SAP.

3.2.2. При возникновении потребности в замене изношенного, приобретении нового непромышленного ОВП или приобретении для нужд ИЦ в системе SAP формируется заявка на ОВП, которая согласовывается Руководителем функционального подразделения УО/УК.

3.2.3. Расценка сформированной заявки на ОВП осуществляется Планировщиком цен в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». При наличии требования по формированию ТЗ/ОЛ в соответствии с Инструкцией Компании «Составление технического задания на приобретение оборудования (МТР)», заявка на ОВП передается на расценку Планировщику цен только при наличии утвержденного ТЗ/ОЛ. Формирование и утверждение ТЗ/ОЛ осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Формирование, согласование, утверждение технических заданий на приобретение МТР».

3.2.4. Расцененная заявка на производственное ОВП рассматривается Техническим комитетом УО, где принимается решение о вынесении заявок на ОВП на Инвестиционную комиссию УО, а также по ОВП 1 группы принимается решение о включении в бюджет ППА. В зависимости от принятого решения проект ОВП:

- включается и согласовывается в составе долгосрочного (10 лет) или среднесрочного (3 года) бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов»;

- включается и согласовывается в составе годового бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА»;

- включается в текущий бюджет ППА и инициируется корректировка бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

3.2.5.Согласованные Техническим комитетом УО (для производственного ОВП) или Руководителем функционального подразделения УО/УК (для непроизводственного ОВП) заявки на ОВП рассматриваются Инвестиционной комиссией УО, где принимается решение о включении проектов ОВП в инвестиционную программу УО. Согласованные Инвестиционной комиссией заявки на ОВП передаются в АСКИ и включаются в состав инвестиционной программы УО (при этом заявки на производственное ОВП 1 группы до передачи в АСКИ должны быть согласованы Техническим комитетом УК). Утверждение проектов ОВП в составе инвестиционной программы УО осуществляется в АСКИ в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью.

3.2.6.Подробное описание процедур планирования и согласования проектов ОВП представлено:

- для производственного ОВП 1 группы – раздел 4.7 Регламента;
- для производственного ОВП 2 группы – раздел 4.8 Регламента;
- для непроизводственного ОВП – раздел 4.9 Регламента;
- для непроизводственного ОВП ИЦ – раздел 4.10 Регламента.

3.2.7.По итогам утверждения проекта ОВП Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП осуществляет деблокирование проекта, после которого потребность в оборудовании обрабатывается Сток-контролером в соответствии с Регламентом Компании «Оперативное планирование обеспечения МТР». После обработки потребность передается в закупку в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение закупки». По итогам ввода оборудования в эксплуатацию осуществляется закрытие проекта ОВП. Подробное описание процедуры реализации проекта ОВП представлено в разделе 4.10 Регламента.

3.2.8.Контроль исполнения проектов ОВП осуществляется:

- в составе бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» в части производственного ОВП 1 группы;
- в составе инвестиционной программы в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью.

-

4.Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса

4.1.Цели бизнес-процесса

Целью процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы» является обеспечение единого процесса инициирования и согласования закупки ОВП (производственного и непроизводственного).

Целью процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)» является реализация утвержденного проекта ОВП в заданные сроки и заданном бюджете.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы» являются:

- инициирование замены изношенного или приобретения нового ОВП путем формирования заявки на ОВП в SAP;
- подготовка обосновывающих документов и ТЗ/ОЛ к проекту ОВП;
- передача потребности в ОВП на расценку (при наличии утвержденного ТЗ/ОЛ);
- согласование заявки на ОВП и принятие решения о включении в бюджет ППА и инвестиционную программу;
- утверждение мероприятий проекта ОВП и передача в реализацию.

Задачами процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)» являются:

- деблокирование мероприятий проекта ОВП и передача потребности Сток-контролеру;
- мониторинг статуса закупочных процедур по мероприятию проекта ОВП;
- инициирование корректировки лимитов проекта ОВП (при необходимости);
- приемка оборудования и закрытие сетевых графиков проекта ОВП;
- закрытие проекта ОВП.

4.3. Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса (Раздел 7 Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процессов и их задачи представлены в Таблице №2:



Таблица №2 «Функциональные роли»

№ п/п	Функциональная роль	Задача		Непроизводственное ОВП
		Производственное ОВП	2 группа	
1	Планировщик ОВП УО	• Формирование предложения по проекту ОВП; • Сбор и подготовка обосновывающих документов для инициирования проекта ОВП; • Консолидация и отражение результатов рассмотрения заявок на ОВП Техническим комитетом УО в SAP.	• Консолидация и отражение результатов рассмотрения заявок на ОВП Техническим комитетом УО в SAP.	
2	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО	• Анализ заявки на ОВП на предмет дублирования созданным/ реализуемым заявкам на ОВП; • Формирование заявки на ОВП в SAP; • Проверка наличия записи оборудования в справочнике ЕК МТР; • Формирование заявки на создание записи ОЗМ (при отсутствии записи ОЗМ); • Вложение утвержденного ТЗ к заявке на ОВП и уточнение номенклатуры оборудования (ОЗМ) в заявке на ОВП; • Занесение инициативы по проекту ОВП в архив идей (при отклонении инициативы); • Подготовка материалов для рассмотрения инициатив по проекту ОВП на Техническом комитете УО (формирование сводного плана заявок на ОВП, подготовка к нему материалов для проведения оценки доступности бюджета на УО).		
3	Заказчик ОВП ПА 2 группы УО		• Анализ заявки на ОВП на предмет дублирования созданным/ реализуемым заявкам на ОВП; • Формирование заявки на ОВП в SAP; • Проверка наличия записи оборудования в справочнике ЕК МТР; • Формирование заявки на создание записи ОЗМ (при отсутствии записи ОЗМ);	

№ п/п	Функциональная роль	Задача		Непроизводственное ОВП
		1 группа	2 группа	
			- Вложение утвержденного ТЗ к заявке на ОВП уточнение номенклатуры оборудования (ОЗМ) в заявке на ОВП; - Занесение инициативы по проекту ОВП в архив идей (при отклонении инициативы); - Подготовка материалов для рассмотрения инициатив по проекту ОВП на Техническом комитете УО (формирование сводного плана заявок на ОВП, подготовка к нему обосновывающих материалов).	
4	Заказчик ОВП неПА УО			- Анализ заявки на ОВП на предмет дублирования созданным/реализуемым заявкам на ОВП; - Формирование заявки на ОВП в SAP; - Проверка наличия записи оборудования в справочнике ЕК МТР; - Формирование заявки на создание записи ОЗМ (при отсутствии записи ОЗМ); - Вложение утвержденного ТЗ к заявке на ОВП, уточнение номенклатуры оборудования (ОЗМ) в заявке на ОВП; - Занесение инициативы по проекту ОВП в архив идей (при отклонении инициативы).
5	Заказчик ОВП ИЦ УО			- Анализ заявки на ОВП ИЦ на предмет дублирования созданным/реализуемым заявкам на ОВП ИЦ; - Формирование заявки на ОВП ИЦ в SAP; - Проверка наличия записи оборудования в справочнике ЕК МТР;

№ п/п	Функциональная роль	Задача		Непроизводственное ОВП
		1 группа	2 группа	
				• Формирование заявки на создание записи ОЗМ (при отсутствии записи ОЗМ); • Вложение утвержденного ТЗ к заявке на ОВП ИЦ уточнение номенклатуры оборудования (ОЗМ) в заявке на ОВП ИЦ; • Занесение инициативы по проекту ОВП ИЦ в архив идей (при отклонении инициативы);
6	Специалист ПТО подразделения УО		• Согласование заявки на ОВП.	
7	Ответственный за сопровождение ТЗ	• Разработка ТЗ на приобретаемое оборудование; • Инициирование согласования ТЗ в СЭД.		
8	Главный специалист ТОиР УО	• Согласование инициативы проекта по ОВП; • Вынесение инициативы проекта по ОВП на согласование Техническим комитетом УО.		
9	Ответственный за эксплуатацию оборудования УО	• Согласование инициативы проекта по ОВП.		
10	Руководитель функционального направления УО			• Согласование заявки на ОВП.
11	Директор ИЦ			• Согласование заявки на ОВП ИЦ
12	Сток-контролер	• Согласование заявок на ОВП, планируемых к реализации в текущем году		
13	Согласующий Инвестиционного комитета УК			• Согласование заявки на ОВП ИЦ
14	Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО	• Анализ заявок на ОВП перед рассмотрением Инвестиционной комиссией УО; • Отражение результатов рассмотрения заявок на ОВП Инвестиционной комиссией УО в системе SAP S/4HANA (установка статусов);	• Анализ заявок на ОВП перед рассмотрением Инвестиционной комиссией УО; • Отражение результатов рассмотрения заявок на ОВП Инвестиционной комиссией УО в системе SAP S/4HANA (установка статусов); • Установка статуса утверждения мероприятий проекта ОВП по результатам утверждения инвестиционной программы УО.	



№ п/п	Функциональная роль	Задача		Непроизводственное ОВП
		1 группа	2 группа	
15	Ответственный за реализацию мероприятий ОВП УО	- Анализ мероприятий проекта ОВП на предмет необходимости выполнения сборочных и монтажных работ собственными силами, не требующих составления проектной документации, и уведомление Планировщика ОВП о необходимости создания заказа ТОРО (при необходимости); - Деблокирование мероприятий проекта ОВП и передача потребности Сток-контролеру; - Мониторинг статуса закупочных процедур по проекту ОВП; - Обработка запроса на корректировку потребности от сток-контролера; - Приемка оборудования, согласование актов приема-передачи оборудования; - Закрытие сетевого графика проекта ОВП.	- Деблокирование мероприятий проекта ОВП и передача потребности в МТО; - Мониторинг статуса закупочных процедур по проекту ОВП; - Обработка запроса на корректировку потребности от сток-контролера; - Приемка оборудования, согласование актов приема-передачи оборудования; - Закрытие сетевого графика проекта ОВП.	
16	Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП	- Формирование плана/прогноза бюджета проекта ОВП в SAP и передача данных в АСКИ; - Инициирование корректировки лимитов проекта ОВП (при необходимости).		
17	Сток-контролер	Комплексное согласование заявок на ОВП, планируемых к реализации в рамках текущего года.		
18	Руководитель проекта ОВП	- Контроль выполнения задач/работ по проекту ОВП; - Закрытие проекта ОВП.		
19	Технический комитет УО	- Согласование инициатив по проектам ОВП и принятие решений по способу реализации; - Рассмотрение и согласование заявок на ОВП; - Принятие решения о способе реализации проекта ОВП и включении в бюджет ППА.		
20	Инвестиционная комиссия УО	Рассмотрение и согласование заявок на ОВП, принятие решения о включении в инвестиционную программу УО.		
21	Инвестиционный комитет УК	- Рассмотрение и согласование программы ОВП; - Контроль фактического исполнения программы ОВП; - Рассмотрение и согласование корректировок лимитов в АСКИ; - Утверждение прогноза завершения текущего года программы ОВП.		

4.5.Результаты бизнес-процесса

Таблица №3 «Результаты бизнес-процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Утвержденное техническое задание	ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых/прогнозных цен ПП-10.04 Закупка МТР, работ, услуг
2	Проект ОВП (СПП-элемент) со статусом «ДГПЛ – Включение в долгосрочное планирование»	ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на ПА
3	Проект ОВП (СПП-элемент) со статусом «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование»	ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА
4	Проект ОВП (СПП-элемент) со статусом «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП»	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА
5	Проект ОВП (СПП-элемент) со статусом «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки»	ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА
6	Заявка на ОВП со статусом «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ»	УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства УП 03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы
7	Заявка на ОВП со статусом «ОТКЛ – Отклонено»	УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства УП 03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы
8	Проект ОВП (СПП-элемент) со статусом «СДПА – Согласовано для передачи в АСКИ»	УП-02.03 Управление инвестиционной программой
9	Сетевой график проекта ОВП со статусом «УТВР – Утверждено»	ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP) ПП-07.01.02 Управление реестром активов (НСИ ТОиР)
10	Документ-основание для создания/изменения объекта НСИ	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
11	Заявка на изменение ЕО	ПП-07.01.02.05 Ведение НСИ ТОиР

Таблица №4 «Результаты бизнес-процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Потребность в оборудовании/ МТР	ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения
2	Первичные документы	ПП-15.01.01.01 Получение и обработка в МФЦ входящих первичных документов
3	Фактическая стоимость МТР/ оборудования	ОП-03.02.20.01-ERP Консолидация и контроль бюджета проекта
4	Уведомление о нехватке лимита проекта ОВП	ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА
5	ЕО введена в эксплуатацию	ПП-07.02 Планирование программы управления производственными активами ПП-07.04 Мониторинг и оценка технического состояния ПА

4.6. Входы бизнес-процесса и поставщики входов бизнес-процесса

Таблица №5 «Входы бизнес-процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Технический объект с присвоенным техническим состоянием	ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов
2	Справка о балансовой стоимости оборудования	
3	Акт списания	
4	Дефектная ведомость	
5	Оценка срока эксплуатации	
6	Акт осмотра технического состояния	
7	Стандарт управления ПА	ПП-07.01.01 Управление стратегическим планом УПА
8	Функциональная стратегия управления ПА	
9	Потребность в закупке оборудования	УП-06.03 Технологический анализ производства ПП-07.07 Обеспечение эффективности системы управления активами ПП-11.03 Обеспечение промышленной безопасности ПП-13.02 Административно-хозяйственное обеспечение
10	Новые технологии/ лучшие практики	УП-06.03 Технологический анализ производства ПП-07.07 Обеспечение эффективности системы управления активами
11	Балансировочный расчёт парка техники	УП-06.03 Технологический анализ производства
12	Стратегия Компании	УП-01.04 Долгосрочное бизнес-планирование (до 20 лет)
13	Единый календарный план	УП-03.02 Долгосрочное динамическое проектирование
14	Производственная программа года	УП-03.03 Среднесрочное и годовое производственное планирование
15	Матрица оценки	ПП-10.04 Закупка МТР, работ, услуг
16	График поставок	
17	Плановые цены	ПП-10.03.01-ERP Ведение плановых цен
18	Запись объекта НСИ	ПП-12.07.01 Управление данными НСИ

Таблица №6 «Входы бизнес-процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Сетевой график проекта ОВП со статусом «УТВЕРЖДЕНО»	ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы
2	Лимит затрат	УП-02.04.06-ERP Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами CAPEX (целевая схема)
3	Статус закупочной процедуры	ПП-10.04.03.01-ERP Выполнение закупки
4	Запрос на корректировку от сток-контролера	ПП-10.03.04-ERP Оперативное планирование обеспечения

4.7. Описание процедуры «Планирование и согласование мероприятий проекта производственного ОВП 1 группы»

4.7.1. Инициирование мероприятий проекта ОВП:

4.7.1.1. Основанием инициирования мероприятий проекта ОВП 1 группы на производственное оборудование могут служить следующие условия:

- окончание назначенного срока службы оборудования;
- оборудование не выполняет свою функцию в рамках производственного процесса, технические характеристики не соответствуют паспортным характеристикам, техническое состояние оборудования не удовлетворительное (имеется Акт технического состояния оборудования);
- неремонтопригодность (например, вследствие серьезного повреждения оборудования или отсутствия запасных частей на рынке);
- неэффективность восстановления оборудования по сравнению с заменой на новое в соответствии с Методическими указаниями Компании «Методика определения плановой и фактической стоимости жизненного цикла производственных активов»;
- изменение внешних факторов (стандарты и нормативы по безопасности труда, охране окружающей среды, требования государственных органов и внутренних стандартов и политик).

4.7.1.2. При инициировании проекта ОВП на оборудование ГТК, потребность в которых определяется расчетными методами (отражено в календарных планах разработки месторождения в соответствии с Регламентом Компании «Разработка долгосрочных календарных планов горных работ»), необходимо учитывать данные балансировочного расчета парка техники на предмет необходимости ввода нового оборудования взамен изношенного.

4.7.1.3. При наличии условий, представленных в п. 4.7.1.1-4.7.1.2, Планировщик ОВП УО собирает и анализирует на полноту и корректность пакет обосновывающих документов. Обосновывающими документами являются:

- акт технического состояния оборудования (включая дефектную ведомость и/или заключение о техническом состоянии оборудования (в том числе, сформированного с помощью АСДМ));
- справка о балансовой стоимости, нормативном и фактическом сроке службы оборудования (формируется вне системы);
- расчет-обоснование неэффективности восстановления оборудования;
- балансировочный расчет парка техники.

4.7.1.4. По результатам анализа документов Планировщик ОВП УО формирует предложение по проекту ОВП (далее – Инициатива ОВП). Форма предложения по проекту ОВП представлена в Приложении №1. Инициатива ОВП должна содержать наименование выбывающего оборудования, причину инициирования замены и ориентировочный срок замены (ввода нового оборудования и описание рисков с оценкой вероятности наступления). Сформированная Инициатива ОВП направляется Заказчику ОВП ПА 1 группы УО совместно с пакетом обосновывающих документов.

4.7.1.5. Заказчик ОВП ПА 1 группы УО в срок не более 2 рабочих дней формирует в системе SAP сводный отчет со списком заявок на ОВП и анализирует на предмет наличия уже заявленных и реализуемых аналогичных мероприятий ОВП.

4.7.1.6. В случае наличия аналогичных проектов Заказчик ОВП ПА 1 группы УО отклоняет Инициативу ОВП как дублирующую и информирует об этом инициатора

потребности.

4.7.1.7. После проверки на наличие дублирующих проектов Заказчик ОВП ПА 1 группы УО направляет Инициативу ОВП (с обосновывающими документами) Главному специалисту ТОиР УО и Ответственному за эксплуатацию оборудования на согласование.

4.7.1.8. В случае если Инициатива ОВП предполагает под собой изменения проектной документации, инициатор потребности готовит и формирует Инвестиционную заявку в соответствии с порядком, описанным в Регламенте управления инвестиционной деятельностью и Стандартом «Управление инвестиционными проектами капитального строительства». Дальнейшая проработка инициативы в рамках инвестиционного проекта капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)».

Таблица №7 «Инициирование мероприятий проекта ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.010.1 Шаг ПП-07.02.03.04.020.1 Шаг ПП-07.02.03.04.030.1 Шаг ПП-07.02.03.04.040.1	Анализ пакета документов Анализ существующих проектов замены, реконструкции Подготовка инициативы для Технического комитета Занесение инициативы в Архив идей
Входная информация (входящие документы, регистры)	Отчет/заключение о техническом состоянии оборудования; Справка о балансовой стоимости, нормативном и фактическом сроке службы оборудования; Акт о списании (формы ОС-4, ОС-4а, ОС-4б); Акт технического состояния оборудования; Дефектная ведомость; Стандарт управления ПА; Функциональная стратегия управления ПА; Балансировочный расчет парка техники.
Исполнитель	Планировщик ОВП УО; Заказчик ОВП ПА 1 группы УО.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При возникновении потребности в замене оборудования Планировщик ОВП УО собирает и анализирует на полноту и корректность пакет обосновывающих документов и формирует Инициативу ОВП. Заказчик ОВП ПА 1 группы УО проверяет наличие уже заявленных и реализуемых проектов в Системе для ПА. При отсутствии дублирующих проектов направляет инициативу на согласование Главному специалисту ТОиР УО и Ответственному за эксплуатацию оборудования.
Результаты выполнения работ	Сопроводительное письмо с Инициативой ОВП и пакетом обосновывающих документов.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней с момента формирования инициативы проекта ОВП. Инициатива ОВП формируется по мере возникновения потребности и в период проведения годовой бюджетной кампании.
Используемые ИТ-системы	Внесистемно SAP S/4HANA (в части проверки на аналогичные проекты)

4.7.2. Согласование инициативы по проекту ОВП

4.7.2.1. Главный специалист ТОиР УО и Ответственный за эксплуатацию оборудования в срок не более 5 рабочих дней рассматривают Инициативу ОВП на предмет целесообразности реализации и ее технической реализуемости. По результатам рассмотрения принимается решение о согласовании, отклонении или направлении на доработку. При согласовании Инициативы ОВП Ответственный за эксплуатацию оборудования дополняет инициативу рекомендациями по замене оборудования

(например, замена на идентичное оборудование или замена с измененными характеристиками).

4.7.2.2.Согласованную Инициативу ОВП Главный специалист ТОиР УО выносит на рассмотрение Техническим комитетом УО с обязательным участием служб Главного инженера (в том числе ПТО) и финансовой службы УО.

4.7.2.3.Технический комитет УО в срок не более 10 рабочих дней (в рамках периода бюджетной кампании) или по мере накопления не менее 3 Инициатив (вне периода бюджетной кампании, за исключением срочной необходимости) рассматривает Инициативы ОВП на предмет:

- необходимости замены изношенного оборудования с учетом реализуемых инвестиционных проектов капитального строительства, стратегии Компании, ЕКП и балансировочного расчета парка техники;
- возможности технической реализации и альтернатив;
- отсутствия дублирования заявки на ОВП реализуемым мероприятиями проекта ОВП или инвестиционных проектов капитального строительства

4.7.2.4.По результатам рассмотрения Техническим комитетом УО принимается одно из следующих решений:

- Инициатива ОВП согласована как ОВП 1 группы;
- Инициатива ОВП будет реализована в рамках проекта ОВП 2 группы, если принято решение о приобретении оборудования с техническими характеристиками, отличными более чем на 10% от основополагающих характеристик производительности заменяемого оборудования (например, основополагающими характеристиками являются: для самосвала – грузоподъемность; для экскаватора – объем ковша). Инициирование проекта ОВП 2 группы осуществляется в соответствии с разделом 4.8 Регламента;
- Инициатива ОВП отклонена, если отсутствует необходимость в новом оборудовании (например, в виду сокращения производства или скорого закрытия месторождения).

4.7.2.5.Решение Технического комитета УО оформляется протоколом.

4.7.2.6.Отклоненные Инициативы ОВП на любом этапе согласования направляются в Архив идей.

Таблица №8 «Согласование инициативы по проекту ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.050.1 Шаг ПП-07.02.03.04.060 Шаг ПП-07.02.03.04.070.1		Согласование инициативы Анализ инициатив и принятие решений Техническим комитетом УО Рассмотрение и согласование инициативы Техническим комитетом УО	
Входная информация (входящие регистры)	информация документы,	Сопроводительное письмо с Инициативой ОВП и пакетом обосновывающих документов; Стратегия Компании; ЕКП; Балансировочный расчет парка техники.	
Исполнитель		Главный специалист ТОиР УО; Ответственный за эксплуатацию оборудования; Технический комитет УО.	

Шаг ПП-07.02.03.04.050.1 Шаг ПП-07.02.03.04.060 Шаг ПП-07.02.03.04.070.1	Согласование инициативы Анализ инициатив и принятие решений Техническим комитетом УО Рассмотрение и согласование инициативы Техническим комитетом УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Рассмотрение и согласование Инициативы ОВП Главным специалистом ТОиР УО и Ответственным за эксплуатацию оборудования. Согласованная Инициатива ОВП рассматривается Техническим комитетом УО и принимается решение о согласовании и способе реализации проекта ОВП.
Результаты выполнения работ	Протокол решения Технического комитета УО (по рассмотрению инициативы проекта ОВП).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 15 рабочих дней с момента получения электронного письма с инициативой по проекту ОВП (в рамках бюджетной кампании).
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.3. Формирование заявки на ОВП и разработка ТЗ/ОЛ:

4.7.3.1. После согласования Инициативы ОВП на Техническом комитете УО:

- Заказчик ОВП ПА 1 группы УО формирует в системе SAP S/4HANA заявку на ОВП в виде сетевого графика (вида «Р310 – Производственные активы ОВП (1 группа)») и прикрепляет к ней все обосновывающие документы. В заявке на ОВП указывает краткое описание заявки, ОС и единицу оборудования, подлежащей замене, сроки заявки с учетом LT, причину замены и ОЗМ приобретаемого оборудования (на этапе планирования допускается указывать ЕК МТР для целей планирования¹). При отсутствии записи оборудования в справочнике ЕК МТР формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ». При необходимости в заявке на ОВП устанавливаются индикаторы:

- «Закупка инвентаря». При установлении данного индикатора карточка ЕО и производственный ресурс не создаются;
- «Вовлечение НВИ». Индикатор устанавливается только при наличии данной потребности в запасе (проверка наличия потребности в запасе осуществляется путем формирования отчета «Обзор запасов»). При установке данного индикатора процедура согласования потребности меняется следующим образом: вместо ТЗ формируется и согласовывается служебная записка.

- Ответственный за сопровождение ТЗ, назначенный в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР, готовит ТЗ/ОЛ в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Компании «Составление технического задания на приобретение оборудования (МТР)». При необходимости получения наиболее полного перечня требований к оборудованию от смежных функциональных подразделений УО Ответственный за сопровождение ТЗ направляет соответствующий запрос в адрес руководителя соответствующего функционального

¹ При указании ЕК МТР для целей планирования, после проведения закупочных процедур и определения конкретного оборудования, код ЕК МТР должен быть заменен на соответствующую закупаемому оборудованию позицию

подразделения УО.

4.7.3.2. После разработки ТЗ/ОЛ Ответственный за сопровождение ТЗ инициирует согласование и утверждение ТЗ/ОЛ в СЭД в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.

Таблица №9 «Формирование заявки на ОВП и разработка ТЗ/ОЛ»

Шаг ПП-07.02.03.04.080.1 Шаг ПП-07.02.03.04.090.1 Шаг ПП-07.02.03.04.100.1 Шаг ПП-07.02.03.04.101-104 Шаг ПП-07.02.03.04.105	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Формирование заявки на ОВП Разработка ТЗ/ОЛ Согласование ТЗ/ОЛ Утверждение ТЗ/ОЛ
Входная информация (входящие документы, регистры)	Протокол решения Технического комитета УО (по рассмотрению инициативы проекта ОВП); Пакет обосновывающих документов.
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО; Ответственный за сопровождение ТЗ.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО формирует заявку на ОВП, где указывает ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ. Ответственный за сопровождение ТЗ разрабатывает ТЗ/ОЛ и инициирует согласование и утверждение ТЗ в СЭД.
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «ИНИЦ – Инициатива»); Утвержденное ТЗ/ОЛ; Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 1 рабочего дня на создание заявки на ОВП с момента согласования Инициативы ОВП Техническим комитетом УО. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по формированию, согласованию и утверждению ТЗ/ОЛ устанавливаются Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA (в части создания заявки на ОВП) АСУ СЭД (в части согласования и утверждения ТЗ/ОЛ)

4.7.4. Уточнение заявки на ОВП:

4.7.4.1. После получения, утвержденного ТЗ/ОЛ или служебной записки (при установлении индикатора «Вовлечении НВИ») Заказчик ОВП ПА 1 группы УО прикрепляет к заявке на ОВП полученные документы, а также уточняет номенклатуру оборудования (ОЗМ) на основании утвержденного ТЗ/ОЛ или служебной записки. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ПА 1 группы УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

4.7.4.2. После выполнения вышеописанных процедур Заказчик ОВП ПА 1 группы УО устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП Планировщиком цен в соответствии с Регламентом Компании Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». По результатам установки плановой цены заявке на ОВП автоматически устанавливается статус «РСЦН – Расценено».

4.7.4.3. В целях повышения качества планирования производственной программы для

заявок на ОВП на основное оборудование, требующего создания производственного ресурса, Заказчик ОВП ПА 1 группы УО создает заявку на создание карточки ЕО в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТООИР» и информирует Специалиста ПТО о необходимости создания производственного ресурса в системе SAP S/4HANA в соответствии с требованиями процесса «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства». После создания карточки ЕО и производственного ресурса необходимо внести их номера в заявку на ОВП для исключения последующего автоматического создания карточки ЕО и производственного ресурса.

Таблица №10 «Уточнение заявки на ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.80.1 Шаг ПП-07.02.03.04.110.1	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Корректировка заявки на ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «ИНИЦ – Инициатива»); Утвержденное ТЗ/ОЛ.
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО прикрепляет утвержденное ТЗ/ОЛ к заявке на ОВП, а также уточняет ОЗМ в заявке на ОВП (ОСГ) на основании утвержденного ТЗ/ОЛ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ПА 1 группы УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). После уточнения ОЗМ и прикрепления полученных документов Заказчик ОВП ПА 1 группы УО устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, заявка направляется на расценку, после которого заявка на ОВП автоматически устанавливается статус «РСЦН – Расценено».
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено»); Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней на уточнение заявки на ОВП с момента получения утвержденного ТЗ/ОЛ. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по расценке заявки на ОВП устанавливаются Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.5. Подготовка и рассмотрение заявок на ОВП коллегиальными органами

4.7.5.1.3а 3 рабочих дня до проведения заседания Технического комитета УО по рассмотрению заявок на ОВП Заказчик ОВП ПА 1 группы УО по заявкам на ОВП со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено» формирует сводный план заявок на ОВП, подготавливает к нему материалы для проведения оценки доступности бюджета на УО и направляет на Технический комитет УО. Заявкам на ОВП, переданным на рассмотрение Техническим комитетом УО, Заказчик ОВП ПА 1 группы УО устанавливает статус «ПМДБ – Подготовка документов для оценки бюджета».

4.7.5.2. Технический комитет УО рассматривает заявки на ОВП на предмет:

- целесообразности реализации проекта;
- наличия рисков;
- доступности бюджета УО (для инициирования корректировки инвестиционной

программы по заявкам на ОВП, необходимых к реализации в рамках текущего года).

4.7.5.3. По каждой заявке на ОВП Технический комитет УО принимает решение по:

- согласованию или отклонению (в том числе согласование передачи потребности на опережающую закупку);
- продлению срока эксплуатации оборудования, в случае отклонения заявки на ОВП, инициированного в результате истечения срока службы. При необходимости, инициируются мероприятия для принятия решений по продлению срока эксплуатации оборудования (проведение экспертизы промышленной безопасности и выполнение ее рекомендаций/предписаний). По результатам проведения экспертизы промышленной безопасности Техническим комитетом УО принимается решение о продлении срока службы или списании оборудования;
- реализации, как проект целевой программы УО (если заявка соответствует действующей целевой программе УО). Далее, заявка обрабатывается в соответствии с Регламентом Компании «Управление целевыми программами»;
- реализации, как инвестиционный проект (если заявка соответствует критериям технического перевооружения в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью). Далее, формируется инвестиционная заявка в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью;
- назначению ответственного за реализацию мероприятий проекта ОВП по согласованным заявкам на ОВП;
- году реализации мероприятий проекта ОВП:
 - в рамках текущего года – инициирование корректировки текущего годового бюджета ППА;
 - в рамках следующего года – включение в годовой бюджет ППА;
 - в рамках среднесрочного горизонта планирования (2-3 год) – включение в среднесрочный план и бюджет ППА.
 - в рамках долгосрочного горизонта планирования (4-10 год) – включение в долгосрочный план и бюджет ППА.

4.7.5.4. Решение Технического комитета оформляется протоколом.

4.7.5.5. В случае принятия решения (инициирования мероприятий для принятия решений) по продлению срока эксплуатации оборудования исполнитель решения Технического комитета УО в срок не более 2 рабочих дней устанавливает заявке на ОВП статус «ТКБЕ – Согласовано ТКБЕ» и «ТОРО – Реализация как мероприятие ТОиР». После принятия решения по продлению срока эксплуатации оборудования Технический специалист НСИ ТОиР формирует заявку на изменение реестра оборудования (в части изменения окончания срока эксплуатации) в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР».

4.7.5.6. В случае согласования заявки на ОВП исполнитель решения Технического комитета УО в срок не более 2 рабочих дней устанавливает в системе SAP S/4HANA статус

«ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена». Далее, инициируется автоматическое создание карточки ЕО и производственного ресурса в системе SAP S/4HANA, которые обогащаются в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР» требованиями процесса «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства».

4.7.5.7. После установки заявке на ОВП статус «ЗМНИ – Замена», автоматически создается СПП-элемент вида «Мероприятие» со статусом «СОЗД – Создано», который присваивается к заявке на ОВП и включается в проект ОВП УО, созданного в КСУ НСИ. На созданном СПП-элементе Заказчиком ОВП ПА 1 группы УО указывается плановая дата ввода в эксплуатацию заявляемого оборудования. Далее, Заказчиком ОВП ПА 1 группы УО, в зависимости от принятого решения, устанавливает СПП-элементу проекта ОВП один из следующих статусов:

- «ДГПЛ – Включение в долгосрочное планирование» – если принято решение о включении в долгосрочный бюджет ППА. Далее формируется долгосрочный бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы ППА»;
- «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование» – если принято решение о включении в среднесрочный бюджет ППА. Далее формируется среднесрочный бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы ППА»;
- «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП» – если принято решение о включении в годовой бюджет ППА;
- «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки» – если принято решение о включении в текущий бюджет ППА.

4.7.5.8. Проекты, включенные в долгосрочный или среднесрочный бюджет ППА, должны пересматриваться ежегодно Техническим комитетом УО до включения в годовой бюджет ППА или до передачи потребности в закупку. Такие мероприятия не включаются в инвестиционную программу УО (за исключением потребностей по опережающей закупке) и не должны включаться в проект ОВП планового года.

4.7.5.9. Заявки на ОВП со статусом СПП-элемента «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП», «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки», а также «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование» (при наличии статуса «ОПРЖ – опережающая закупка», которая устанавливается автоматически на основании Lead Time и даты потребности) рассматриваются Специалистом отдела планирования и контроля инвестиций УО и Инвестиционной комиссией УО в соответствии с п. 4.8.4. При этом заявки на ОВП, по которым принято решение о реализации в рамках текущего года, после согласования Инвестиционной комиссией УО и до передачи бюджета в АСКИ, должны быть согласованы Сток-контролером на предмет корректности заявленных позиций и дат потребности с учетом LT (на заявке на ОВП должен быть установлен статус «СГКБ –

Согласовано коммерческим блоком»).

4.7.5.10. В случае отклонения заявки на ОВП все материалы по проекту направляются в Архив идей и заявке на ОВП устанавливается статус «В архиве».

4.7.5.11. После согласования заявок на ОВП Инвестиционной комиссией УО, заявки на ОВП планового года (СПП-элементы со статусом «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП») включаются в годовой бюджет ППА и проходят согласование с Техническим комитетом УК в составе годового бюджета ППА в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА». По результатам согласования годового бюджета ППА Планировщик бюджета УА УК устанавливает на согласованных заявках на ОВП статус «УБТК – Годовой бюджет согласовано ТК БЕ» (если статус не был установлен автоматически по результатам согласования бюджета ППА в МСВ), на СПП-элементах согласованных заявок на ОВП статус «СДПА – согласовано для передачи в АСКИ» и осуществляет передачу данных плана/прогноза по проекту производственного ОВП 1 группы в АСКИ в разрезе объекта лимитирования ТОТС.

4.7.5.12. В системе АСКИ проект ОВП рассматривается Инвестиционным комитетом УК в совокупности с остальными инвестиционными заявками, принимается решение об утверждении или отклонении проекта ОВП в составе инвестиционной программы УО в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью.

Таблица №11 «Рассмотрение заявки на ОВП на Техническом комитете УО и принятие решения о включении мероприятий проекта ОВП в бюджет ППА»

Шаг ПП-07.02.03.04.120.1 Шаг ПП-07.02.03.04.130.1 Шаг ПП-07.02.03.04.140.1 Шаг ПП-07.02.03.04.150.1	Подготовка материалов для Тех. комитета УО Рассмотрение и принятие решения Тех. комитетом УО, назначение ответственных Продление срока эксплуатации Создание СПП-мероприятия по замене оборудования
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ»)
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО; Технический комитет УО; Технический специалист НСИ ТОиР.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО формирует сводный план заявок на ОВП, подготавливает к нему материалы для проведения оценки доступности бюджета на УО и направляет на Технический комитет УО. Технический комитет УО рассматривает заявки на ОВП и принимает решение по согласованию заявки на ОВП, по выбору способа реализации проекта и определению года реализации проекта. Решение Технического комитета УО оформляется протоколом. В соответствии с протокольным решением Заказчик ОВП ПА 1 группы УО устанавливает заявкам на ОВП следующие статусы: • если согласовано, как проект ОВП – статус «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена», в результате автоматически формируется СПП-элемент со статусом «СОЗД – Создано»; • если принято решение по продлению срока службы – статус «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ТОРО – Реализация как мероприятие ТОиР»; • если отклонено – статус «АРХВ – В архив». По заявкам на ОВП со статусом «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ТОРО – Реализация как мероприятие ТОиР» Технический

Шаг ПП-07.02.03.04.120.1 Шаг ПП-07.02.03.04.130.1 Шаг ПП-07.02.03.04.140.1 Шаг ПП-07.02.03.04.150.1	Подготовка материалов для Тех. комитета УО Рассмотрение и принятие решения Тех. комитетом УО, назначение ответственных Продление срока эксплуатации Создание СПП-мероприятия по замене оборудования
	специалист НСИ ТООР формирует заявку на изменение реестра оборудования.
Результаты выполнения работ	Протокол рассмотрения заявок ОВП Техническим комитетом УО; Заявка на ОВП (со статусами «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена»); Заявка на ОВП (со статусами «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ТОРО – Реализация как мероприятие ТООР»); Заявка на ОВП (со статусом «АРХВ – В архив»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СОЗД – Создано»); Заявка на изменение реестра оборудования.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Рассмотрение заявок на ОВП Техническим комитетом УО осуществляется в соответствии с графиком заседания Технического комитета УО. Планировщик ОВП УО отражает результаты рассмотрения на Техническом комитете УО в системе (в том числе формирование заявки на изменение реестра оборудования). Отражение результатов осуществляется не более 2 рабочих дней с момента формирования протокола.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Таблица №12 «Включение мероприятий проекта ОВП в бюджет ППА»

Шаг ПП-07.02.03.04.160.1	Включение мероприятия в программу воздействий ПА
Входная информация (входящие документы, регистры)	СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СОЗД – Создано»); Протокол рассмотрения заявок ОВП Техническим комитетом УО
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 1 группы УО в зависимости от принятого Техническим комитетом УО решения устанавливает СПП-элементу проектам ОВП статус: • «ДГПЛ – Включение в долгосрочное планирование» – если принято решение о включении в долгосрочный бюджет ППА; • «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование» – если принято решение о включении в среднесрочный бюджет ППА; • «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП» – если принято решение о включении в годовой бюджет ППА; • «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки» - если принято решение о включении в текущий бюджет ППА.
Результаты выполнения работ	СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «ДГПЛ – Включение в долгосрочное планирование»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СРПЛ – Включение в среднесрочное планирование»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «ГДПЛ – Включение в годовую программу ОВП»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 1 рабочего дня с момента создания СПП-элемента проекта ОВП.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

Таблица №13 «Комплексное согласование заявок на ОВП Коммерческим блоком»

Шаг ПП-07.02.03.04.190.1	Комплексное согласование заявок на ОВП Коммерческим блоком
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусами сетевого графика «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена», и со статусом СПП-

Шаг ПП-07.02.03.04.190.1	Комплексное согласование заявок на ОВП Коммерческим блоком
	элемента «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки»)
Исполнитель	Сток-контролер
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Сток-контролер осуществляет проверку заявок на ОВП, инициируемых к закупке в рамках текущего года, на предмет корректности заявляемой позиции (ЕК МТР), стоимости и выполнимости ЛТ. При отсутствии замечаний Сток-контролер устанавливает на заявке на ОВП статус «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком». При наличии замечаний информирует инициатора потребности о необходимости корректировки заявки на ОВП в SAP либо по электронной почте.
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком»)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней с момента установки статуса СПП-элементам «КРПЛ – Включение в текущую программу ОВП в рамках корректировки».
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.6. Отражение результатов рассмотрения Инвестиционного комитета УК и передача проекта ОВП в реализацию:

4.7.6.1. При утверждении бюджета проекта ОВП в АСКИ в системе SAP автоматически устанавливаются следующие статусы: на СПП-элементах – статус «УТВА – Бюджет утвержден в АСКИ»; на заявках на ОВП – статус «АСКИ – согласовано в АСКИ».

4.7.6.2. Далее, Планировщик бюджета УА УК устанавливает на сетевом графике проекта ОВП статус «УТВР – Утверждено». Реализация мероприятий проекта ОВП осуществляется в соответствии с разделом 4.11 Регламента.

4.7.6.3. При необходимости корректировки бюджета проекта ОВП в АСКИ в системе SAP на СПП-элементах и заявках на ОВП автоматически устанавливается статус «ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ)». Инвестиционным комитетом УК задается ограничение по суммарному бюджету программы ОВП, на основании которого осуществляется корректировка на уровне УО. Решение по исключению мероприятий проекта ОВП принимается Техническим комитетом УО, включая представителей функциональных подразделений-заявителей по непроизводственному ОВП (АХО, ОТиПБ) и представителей функциональных блоков УК (при необходимости).

4.7.6.4. При установлении индикатора «Вовлечение НВИ» передача мероприятий ОВП в АСКИ не осуществляется, осуществляется корректировка лимитов в соответствии с Регламентом оперативного контроля и управления бюджетными лимитами (CAPEX).

Таблица №14 «Утверждение заявок на ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.220.1	Утверждение заявок на ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «УТВА – Бюджет утвержден в АСКИ») и заявка на ОВП (со статусом «АСКИ – Согласовано в АСКИ»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ)») и заявка на ОВП (со статусом «ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ)»).
Исполнитель	Планировщик бюджета УА УК

Шаг ПП-07.02.03.04.220.1	Утверждение заявок на ОВП
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При наличии статуса на СПП-элементах «УТВА – Бюджет утвержден в АСКИ» Планировщик бюджета УА УК устанавливает на сетевой графике соответствующего СПП-элемента статус «УТВР – Утверждено». При наличии статуса на СПП-элементах «ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ)» Планировщик бюджета УА УК информирует лиц, участвующих в принятии решения по исключению мероприятий проекта ОВП.
Результаты выполнения работ	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «УТВР – Утверждено»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Для мероприятий, утверждаемых в рамках бюджетной кампании – не позднее 1 января планового года. Для мероприятий, утверждаемых за рамками бюджетной кампании – не более 2 рабочего дня с момента утверждения скорректированных лимитов в АСКИ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.Описание процедуры «Планирование и согласование мероприятий проекта производственного ОВП 2 группы»

4.8.1.Инициирование мероприятий проекта ОВП (создание заявки на ОВП и разработка ТЗ/ОЛ):

4.8.1.1.Долгосрочная предварительная потребность в проекте ОВП на оборудование ГТК, определяемые расчетными методами, планируется на основании ЕКП, разработанных и утвержденных в соответствии с Регламентом Компании «Разработка долгосрочных календарных планов горных работ», и балансировочных расчетов парка техники. Сформированная долгосрочная потребность отражается в долгосрочном плане воздействий на ПА (горизонт планирования от 3 до 10 лет) и ежегодно актуализируется в соответствии с Регламентом Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов».

4.8.1.2.При попадании потребности в двухлетний горизонт планирования (необходимость обеспечения потребности в ближайшие два года, не включая текущий год) иницируется мероприятие проекта ОВП.

4.8.1.3.Основанием инициирования проекта ОВП 2 группы на производственное оборудование могут служить следующие условия:

- изменение внешних факторов (стандарты и нормативы по безопасности труда, охране окружающей среды, требования государственных органов и внутренних стандартов и политик);
- выявленные в ходе процессов анализа эффективности новые технологии и/или лучшие практики реализации технологических процессов;
- выявленная в ходе процессов технологического анализа производства потребность в оборудовании для выполнения запланированных объемов производства;
- увеличение объемов производства, не входящего в инвестиционные проекты капитального строительства;
- принятое Техническим комитетом УО решение о реализации инициативы по закупке ОВП в рамках проекта ОВП 2 группы в соответствии с п. 4.7.2.3.

4.8.1.4.Обосновывающими документами наличия условий, представленных в п. 4.8.1.3, являются:

- ЕКП;
- балансировочный расчет мощности парка техники;
- обоснование ожидаемого эффекта от внедрения оборудования, выполненное в соответствии с требованиями, предъявляемыми к инвестиционной заявке.

4.8.1.5.По приобретаемому оборудованию Ответственный за сопровождение ТЗ, назначенный в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР, подготавливает ТЗ/ОЛ на изготовление и поставку оборудования в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией Компании «Составление технического задания на приобретение оборудования (МТР)». При необходимости получения наиболее полного перечня требований к оборудованию от смежных функциональных подразделений УО Заказчик ОВП ПА 2 группы УО направляет соответствующий запрос в адрес руководителя соответствующего функционального подразделения УО.

4.8.1.6.После формирования ТЗ/ОЛ Заказчик ОВП ПА 2 группы УО в системе SAP S/4HANA создает заявку на ОВП в виде сетевого графика (вида «Р320 – Производственные активы ОВП (2 группа)»). В заявке на ОВП указывает краткое описание заявки, сроки заявки с учетом ЛТ и ОЗМ приобретаемого оборудования (на этапе планирования допускается указывать ЕК МТР для целей планирования). При отсутствии записи оборудования Заказчик ОВП ПА 2 группы УО формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ». При необходимости в заявке на ОВП устанавливаются индикаторы:

- «Закупка инвентаря». При установлении данного индикатора карточка ЕО и производственный ресурс не создаются;
- «Вовлечение НВИ». Индикатор устанавливается только при наличии данной потребности в запасе (проверка наличия потребности в запасе осуществляется путем формирования отчета «Обзор запасов»). При установке данного индикатора процедура согласования потребности меняется следующим образом: вместо ТЗ формируется и согласовывается служебная записка.

4.8.1.7.При этом создаваемая заявка на ОВП не должна дублировать существующие заявки. Проверка на предмет отсутствия дублирования существующих заявок на ОВП осуществляется Заказчиком ОВП ПА 2 группы УО путем формирования отчета со списком заявок на ОВП перед созданием заявки на ОВП.

4.8.1.8.К созданной заявке на ОВП (сетевому графику) прикрепляется ТЗ/ОЛ и обосновывающие документы, представленные в п. 4.8.1.4.

4.8.1.9.Сформированная заявка на ОВП совместно с приложенным ТЗ/ОЛ проверяется Специалистом службы ПТО на предмет наличия обосновывающих документов и соответствия ЕКП и балансировочному расчету мощности парка техники:

- При отсутствии замечаний или иницировании заявки службой ПТО Специалист ПТО подразделения УО устанавливает заявке статус «СПТО – Согласовано ПТО».
- При отсутствии обосновывающих документов Специалист ПТО подразделения УО возвращает заявку инициатору на доработку.
- При несоответствии заявки ЕКП и балансировочному расчету Специалист ПТО подразделения УО отклоняет заявку и направляет в Архив идей, устанавливая заявке статус «В архиве».

4.8.1.10. После установки заявке на ОВП статуса «СПТО – Согласовано ПТО» Заказчик ОВП ПА 2 группы УО иницирует согласование и утверждение ТЗ/ОЛ в СЭД в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.

4.8.1.11. На основании заявок на ОВП со статусом «СПТО – Согласовано ПТО» создаются производственные в системе SAP S/4HANA в соответствии с требованиями процесса «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства», которые учитываются при планировании производственной программы в соответствии с требованиями процесса «УП 03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы».

Таблица №15 «Формирование заявки на ОВП и разработка ТЗ/ОЛ»

Шаг ПП-07.02.03.04.070.2 Шаг ПП-07.02.03.04.080.2 Шаг ПП-07.02.03.04.090.2 Шаг ПП-07.02.03.04.100.2 Шаг ПП-07.02.03.04.101-104 Шаг ПП-07.02.03.04.105	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Формирование заявки на ОВП Согласование заявки на ОВП ПТО подразделения Формирование ТЗ/ОЛ Согласование ТЗ/ОЛ Утверждение ТЗ/ОЛ
Входная информация (входящие документы, регистры)	Стратегия Компании; ЕКП; Балансировочный расчет парка техники; Потребность в приобретении оборудования; Новые технологии/лучшие практики.
Исполнитель	Ответственный за сопровождение ТЗ; Заказчик ОВП ПА 2 группы УО; Специалист ПТО подразделения УО.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 2 группы УО разрабатывает ТЗ/ОЛ и формирует заявку на ОВП, где указывает ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ. Заявка на ОВП совместно с ТЗ/ОЛ рассматривается Специалистом службы ПТО. В результате согласования заявке на ОВП устанавливается статус «СПТО – Согласовано ПТО». После установки статуса «СПТО – Согласовано ПТО» Заказчик ОВП ПА 2 группы УО иницирует согласование и утверждение ТЗ/ОЛ в СЭД.
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «СПТО – Согласовано ПТО»); Утвержденное ТЗ/ОЛ; Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней на рассмотрение заявки на ОВП Специалистом службы ПТО. Заявка на ОВП формируется по мере возникновения потребности и в период проведения годовой бюджетной кампании.

Шаг ПП-07.02.03.04.070.2 Шаг ПП-07.02.03.04.080.2 Шаг ПП-07.02.03.04.090.2 Шаг ПП-07.02.03.04.100.2 Шаг ПП-07.02.03.04.101-104 Шаг ПП-07.02.03.04.105	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Формирование заявки на ОВП Согласование заявки на ОВП ПТО подразделения Формирование ТЗ/ОЛ Согласование ТЗ/ОЛ Утверждение ТЗ/ОЛ
	Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по формированию и согласованию ТЗ/ОЛ устанавливаются Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA (в части создания заявки на ОВП) АСУ СЭД (в части согласования и утверждения ТЗ)

4.8.2. Уточнение заявки на ОВП:

4.8.2.1. После получения, утвержденного ТЗ/ОЛ или служебной записки (при установлении индикатора «Вовлечении НВИ») Заказчик ОВП ПА 2 группы УО прикрепляет к заявке на ОВП полученные документы, а также уточняет номенклатуру оборудования (ОЗМ) на основании утвержденного ТЗ/ОЛ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ПА 2 группы УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

4.8.2.2. После выполнения вышеописанных процедур Заказчик ОВП ПА 2 группы УО устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее осуществляется расценка заявки на ОВП Планировщиком цен в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». По результатам установки плановой цены заявке на ОВП автоматически устанавливается статус «РСЦН – Расценено».

4.8.2.3. В целях повышения качества планирования производственной программы для заявок на ОВП на основное оборудование, требующего создания производственного ресурса, Заказчик ОВП ПА 2 группы УО создает заявку на создание карточки ЕО в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТООР». После создания карточки ЕО необходимо внести их номера в заявку на ОВП для исключения последующего автоматического создания карточки ЕО и производственного ресурса.

Таблица №16 «Уточнение заявки на ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.070.2 Шаг ПП-07.02.03.04.130.2	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Корректировка заявки на ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «СПТО – Согласовано ПТО»); Утвержденное ТЗ/ОЛ.
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 2 группы УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Заказчик ОВП ПА 2 группы УО прикрепляет утвержденное ТЗ/ОЛ к заявке на ОВП, а также уточняет ОЗМ на основании утвержденного ТЗ/ОЛ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ПА 2 группы УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). После уточнения ОЗМ и стоимости, а также прикрепления полученных документов Заказчик ОВП ПА 2 группы УО

Шаг ПП-07.02.03.04.070.2 Шаг ПП-07.02.03.04.130.2	Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Корректировка заявки на ОВП
	устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП, по результатам которого устанавливается статус «РСЦН – Расценено».
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено»); Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней на уточнение заявки на ОВП с момента получения утвержденного ТЗ/ОЛ. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по расценке заявки на ОВП устанавливаются Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3. Подготовка и рассмотрение заявок на ОВП Техническим комитетом УО:

4.8.3.1. За 3 рабочих дня до проведения заседания Технического комитета УО по рассмотрению заявок на ОВП Заказчик ОВП ПА 2 группы УО по заявкам на ОВП со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено» формирует сводный план заявок на ОВП, подготавливает к нему материалы для проведения оценки доступности бюджета на УО и направляет на Технический комитет УО. Заявкам на ОВП, переданным на рассмотрение Техническим комитетом УО, Заказчик ОВП ПА 2 группы УО устанавливает статус «ПМДБ – Подготовка документов для оценки бюджета».

4.8.3.2. Технический комитет УО рассматривает заявки на ОВП на предмет:

- целесообразности реализации проекта;
- возможности технической реализации, рисков и альтернатив;
- отсутствия дублирования заявки на ОВП реализуемым мероприятиями проекта ОВП или инвестиционных проектов капитального строительства;
- доступности бюджета УО (для инициирования корректировки инвестиционной программы по заявкам на ОВП, необходимых к реализации в рамках текущего года).

4.8.3.3. По каждой заявке на ОВП Технический комитет УО принимает решение по:

- согласованию или отклонению (в том числе согласование передачи потребности на опережающую закупку);
- реализации, как проект целевой программы УО (если заявка соответствует действующей целевой программе УО). Далее, заявка обрабатывается в соответствии с Регламентом Компании «Управление целевыми программами»;
- реализации, как инвестиционный проект (если заявка соответствует критериям инвестиционных проектов капитального строительства в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью). Далее, формируется инвестиционная заявка в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью;
- назначению ответственного за реализацию мероприятий проекта ОВП по согласованным заявкам на ОВП;

- согласованию года реализации мероприятий проекта ОВП:
 - в рамках текущего года – инициирование корректировки текущей программы ОВП;
 - в рамках следующего года – включение в план годовой программы ОВП;
 - в рамках среднесрочного горизонта планирования (2-3 год) – включение в план годовой программы ОВП в рамках инициирования опережающей закупки.

4.8.3.4. Решение Технического комитета оформляется протоколом.

4.8.3.5. В случае согласования заявки на ОВП исполнитель решения Технического комитета УО устанавливает статус «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ».

4.8.3.6. После установки заявке на ОВП статус «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ», автоматически создается СПП-элемент вида «Мероприятие» со статусом «СОЗД – Создано», который присваивается к заявке на ОВП и включается в проект ОВП УО, созданного в КСУ НСИ. На созданном СПП-элементе Заказчиком ОВП ПА 2 группы УО указывается плановая дата ввода в эксплуатацию заявляемого оборудования

4.8.3.7. Заявки на ОВП со статусом «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и/или «ОПРЖ – Опережающая закупка» (для потребностей с длительным сроком поставки устанавливается автоматически на основании Lead Time и даты потребности) рассматриваются Специалистом отдела планирования и контроля инвестиций УО и Инвестиционной комиссией УО в соответствии с п. 4.8.4.

4.8.3.8. В случае отклонения заявки на ОВП все материалы по проекту направляются в Архив идей и заявке на ОВП устанавливается статус «В архиве».

Таблица №17 «Подготовка и рассмотрение заявок на ОВП Техническим комитетом УО»

Шаг ПП-07.02.03.04.140.2 Шаг ПП-07.02.03.04.150.2 Шаг ПП-07.02.03.04.160.2	Подготовка материалов для Тех. комитета УО Рассмотрение и принятие решения Тех. комитетом УО, назначение ответственных Создание СПП-мероприятия проекта ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ»)
Исполнитель	Заказчик ОВП ПА 2 группы УО; Технический комитет УО.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	ОВП, подготавливает к нему обосновывающие материалы и направляет на Технический комитет УО. Технический комитет УО рассматривает заявки на ОВП и принимает решение по согласованию заявки на ОВП, по выбору способа реализации проекта и определению года реализации проекта. Решение Технического комитета УО оформляется протоколом. В соответствии с протокольным решением исполнитель решения Технического комитета УО устанавливает заявкам на ОВП следующие статусы: • если согласовано, как проект ОВП – статус «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ», в результате автоматически формируется СПП-элемент со статусом «СОЗД – Создано»; • если отклонено – статус «АРХВ – В архив».
Результаты выполнения работ	Протокол рассмотрения заявок ОВП Техническим комитетом УО; Заявка на ОВП (со статусом «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ»); Заявка на ОВП (со статусом «АРХВ – В архив»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СОЗД – Создано»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Рассмотрение заявок на ОВП Техническим комитетом УО осуществляется в соответствии с графиком заседания Технического комитета УО.

Шаг ПП-07.02.03.04.140.2 Шаг ПП-07.02.03.04.150.2 Шаг ПП-07.02.03.04.160.2	Подготовка материалов для Тех. комитета УО Рассмотрение и принятие решения Тех. комитетом УО, назначение ответственных Создание СПП-мероприятия проекта ОВП
	Планировщик ОВП УО отражает результаты рассмотрения на Техническом комитете УО в системе (в том числе формирование заявки на изменение реестра оборудования). Отражение результатов осуществляется не более 2 рабочих дней с момента формирования протокола.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4. Рассмотрение заявки на ОВП Инвестиционной комиссией УО:

4.8.4.1. За 3 рабочих дня до проведения заседания Инвестиционной комиссией УО Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО проводит экспертизу заявок на ОВП на плановый период в соответствии с требованиями Регламента по управлению инвестиционной деятельностью со следующими статусами:

- «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена» – для производственного ОВП 1 группы;
- «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» – для производственного ОВП 2 группы;
- «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено» – для непроизводственного ОВП;
- «КНТР – Контроль АХО» – для непроизводственного ОВП, требующего дополнительного согласования в соответствии с п. 4.9.3;
- «ОПРЖ – Опережающая закупка» – для ОВП, инициируемого по опережающей закупке (при наличии вышеперечисленных статусов для соответствующего типа заявки на ОВП).

4.8.4.2. По согласованным к представлению на Инвестиционную комиссию УО заявкам на ОВП Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО устанавливает статус «СПКИ – Согласовано ОПКИ». При наличии замечаний, Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО направляет заявку на ОВП на корректировку, устанавливая статус «ТКОР – Требуется корректировка». Корректировка заявки на ОВП осуществляется инициатором заявки в течение 2 рабочих дней.

4.8.4.3. Инвестиционной комиссией УО рассматриваются заявки на ОВП со статусом «СПКИ – Согласовано ОПКИ» и принимается коллегиальное решение о необходимости предварительного включения заявки в инвестиционную программу УО и о назначении ответственных за реализацию мероприятий проекта непроизводственного ОВП.

4.8.4.4. В случае отправки заявки на ОВП на доработку, заявка возвращается инициатору с установкой статуса «ТКОР – Требуется корректировка».

4.8.4.5. В случае отклонения заявки на ОВП, заявка направляется в Архив идей (устанавливается статус «ОТКЛ – Отклонено»).

4.8.4.6. Согласованным заявкам на ОВП устанавливается статус «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ».

4.8.4.7. После установки заявке на ОВП статуса «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ», по

непроизводственному ОВП автоматически создается СПП-элемент вида «Мероприятие» со статусом «СОЗД – Создано», который присваивается к заявке на ОВП и включается в проект ОВП УО, созданных в КСУ НСИ. На созданном СПП-элементе Заказчиком ОВП неПА УО указывается плановая дата ввода в эксплуатацию заявляемого оборудования.

Таблица №18 «Рассмотрение заявок на ОВП на Инвестиционной комиссии УО»

Шаг ПП-07.02.03.04.170.2 Шаг ПП-07.02.03.04.180.2 Шаг ПП-07.02.03.04.190.2 Шаг ПП-07.02.03.04.90.3	
Анализ заявок по ОВП Занесение заявки в архив Рассмотрение заявок на ОВП и принятие решения о включении в инвестиционную программу Создание СПП-мероприятия по закупке нового оборудования	
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусами «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ» и «ЗМНИ – Замена»); Заявка на ОВП (со статусом «ТКБЕ – Согласовано ТК БЕ»); Заявка на ОВП (со статусами «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено»); Заявка на ОВП (со статусом «КНТР – Контроль АХО»); Заявка на ОВП (со статусом «ОПРЖ – Опережающая закупка»).
Исполнитель	Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО; Инвестиционная комиссия УО.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО проводит экспертизу заявок на ОВП на плановый период в соответствии с требованиями Регламента по управлению инвестиционной деятельностью. По согласованным к рассмотрению Инвестиционной комиссией УО заявкам на ОВП устанавливается статус «СПКИ – Согласовано ОПКИ». Инвестиционная комиссия УО рассматривает заявки на ОВП и принимает решение по согласованию заявки на ОВП. Решение Инвестиционной комиссии УО оформляется протоколом. В соответствии с протокольным решением Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО устанавливает заявкам на ОВП следующие статусы: • если согласовано – статус «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ», в результате автоматически формируется СПП-элемент со статусом «СОЗД – Создано»; • если требуется корректировка – статус «ТКОР – Требуется корректировка»; • если отклонено – статус «В архиве».
Результаты выполнения работ	Протокол рассмотрения заявок ОВП Инвестиционной комиссией УО; Заявка на ОВП (со статусом «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ»); Заявка на ОВП (со статусом «ТКОР – Требуется корректировка»); Заявка на ОВП (со статусом «В архиве»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СОЗД – Создано»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Рассмотрение заявок на ОВП Инвестиционной комиссией УО осуществляется в соответствии с графиком заседания Инвестиционной комиссии УО. Отражение результатов рассмотрения на Инвестиционной комиссии УО в системе осуществляется не более 2 рабочих дней с момента формирования протокола.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.5. Комплексное согласование заявки на ОВП Коммерческим блоком:

4.8.5.1. Заявки на ОВП, планируемые к реализации в рамках текущего года (с датой потребности текущего года), после согласования Инвестиционной комиссией УО согласовываются Сток-контролером на предмет корректности заявленных позиций и дат

потребности с учетом LT.

4.8.5.2. В случае согласования Сток-контролер устанавливает заявке на ОВП статус «СГКБ – Согласовано коммерческим блоком».

4.8.5.3. В случае необходимости корректировки потребности, Сток-контролер отклоняет потребность и информирует заявителя потребности о необходимости корректировки (при наличии возможности информирования в ИС или с помощью письма по электронной почте).

Таблица №19 «Комплексное согласование заявок на ОВП Коммерческим блоком»

Шаг ПП-07.02.03.04.200.2	Комплексное согласование заявок на ОВП Коммерческим блоком
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом сетевого графика «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ» и с датой потребности текущего года)
Исполнитель	Сток-контролер
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Сток-контролер осуществляет проверку заявок на ОВП, инициируемых к закупке в рамках текущего года, на предмет корректности заявляемой позиции (ЕК МТР), стоимости и выполнимости LT. При отсутствии замечаний Сток-контролер устанавливает на заявке на ОВП статус «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком». При наличии замечаний информирует инициатора потребности о необходимости корректировки заявки на ОВП в SAP либо по электронной почте.
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком»)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней с момента согласования заявки на ОВП Инвестиционной комиссией УО (установки статуса «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ»).
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.6. Утверждение мероприятий проекта ОВП и передача в реализацию:

4.8.6.1. При наступлении даты формирования инвестиционной программы в АСКИ в соответствии с графиком бюджетной кампании или при необходимости передачи плана/прогноза бюджета проекта ОВП в АСКИ в рамках корректировки бюджета проекта ОВП, Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП осуществляет передачу данных плана/прогноза по проекту ОВП в АСКИ в разрезе объекта лимитирования ТОТС.

4.8.6.2. В системе АСКИ проект ОВП рассматривается Инвестиционным комитетом УК в совокупности с остальными инвестиционными заявками, принимается решение об утверждении или отклонении проекта ОВП в составе инвестиционной программы УО в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью.

4.8.6.3. После рассмотрения и утверждения инвестиционной программы в АСКИ сетевым графиком проекта ОВП устанавливается статус «АСКИ – Заявка согласована в АСКИ»

4.8.6.4. Далее, Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО присваивает сетевому графику проекта ОВП статус «УТВР – Утверждено». Далее, инициируется автоматическое создание карточки ЕО в системе SAP S/4HANA, которые обогащаются в соответствии с Регламентом Компании «Ведение НСИ ТОиР».

4.8.6.5. При необходимости корректировки бюджета проекта ОВП в АСКИ в системе

SAP на СПП-элементах и заявках на ОВП автоматически устанавливается статус «ТРКА – Требуется корректировка (из АСКИ)». Инвестиционным комитетом УК задается ограничение по суммарному бюджету программы ОВП, на основании которого осуществляется корректировка на уровне УО. Решение по исключению мероприятий проекта ОВП принимается Техническим комитетом УО, включая представителей функциональных подразделений-заявителей по непроизводственному ОВП (АХО, ОТиПБ) и представителей функциональных блоков УК (при необходимости). При отказе от ранее согласованной заявки на ОВП (установки статуса «ОТКЛ – Отклонено») необходимо скорректировать производственную программу в соответствии с требованиями процесса «УП 03.03.01.02 Годовое планирование производственной программы» и удалить ранее созданный ресурс в соответствии с требованиями процесса «УП-03.03.05.01-ERP Ведение производственных мощностей основного и вспомогательного производства».

4.8.6.6. При установлении индикатора «Вовлечение НВИ» передача мероприятий ОВП в АСКИ не осуществляется, осуществляется корректировка лимитов в соответствии с Регламентом оперативного контроля и управления бюджетными лимитами (САРЕХ).

Таблица №20 «Утверждение мероприятий проекта ОВП и передача в реализацию»

Шаг ПП-07.02.03.04.210.2 Шаг ПП-07.02.03.04.220.2	Согласование передачи бюджета проекта ОВП в АСКИ Передача бюджета проекта ОВП в АСКИ Утверждение сводного плана мероприятий ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП со статусом «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ»; Заявка на ОВП (со статусом «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком») Заявка на ОВП (со статусом «ОПРЖ – опережающая закупка»); СПП-элемент проекта ОВП (со статусом «СОЗД – Создано»).
Исполнитель	Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО; Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП осуществляет передачу плана/прогноза бюджета проекта ОВП в АСКИ. После рассмотрения и утверждения инвестиционной программы в АСКИ сетевым графикам проекта ОВП устанавливается статус «АСКИ – Заявка согласована в АСКИ». Далее, Специалист отдела планирования и контроля инвестиций УО присваивает сетевому графику проекта ОВП статус «УТВР – Утверждено».
Результаты выполнения работ	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «УТВР – Утверждено»); Заявка на ОВП (со статусом «ОТКЛ – Отклонено»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Рассмотрение и утверждение проектов ОВП в АСКИ осуществляется в соответствии с графиком бюджетной кампании или по мере возникновения потребности в корректировке лимитов в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью. Установка статуса «УТВР – Утверждено» осуществляется: • для мероприятий, утверждаемых в рамках бюджетной кампании – не позднее 1 января планового года; • для мероприятий, утверждаемых за рамками бюджетной кампании – не более 1 рабочего дня с момента утверждения скорректированных лимитов в АСКИ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9. Описание процедуры «Планирование и согласование мероприятий проекта непроизводственного ОВП»

4.9.1. Инициирование мероприятий проекта ОВП:

4.9.1.1. При возникновении потребности в непроизводственном оборудовании Заказчик ОВП неПА УО формирует в системе SAP отчет со списком заявок на ОВП и проверяет на предмет отсутствия уже заявленной потребности среди существующих заявок на ОВП.

4.9.1.2. При отсутствии уже заявленной потребности Заказчик ОВП неПА УО формирует в SAP заявку на ОВП в виде сетевого графика (вида «Р410 – Непроизводственные активы ОВП») и прикладывает к ней документы, обосновывающие данную потребность. В качестве Заказчика ОВП неПА УО может выступать любой сотрудник функционального подразделения, ответственного за планирование данного типа непроизводственного ОВП. В заявке на ОВП указывается краткий текст заявки, сроки заявки с учетом ЛТ и ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования Заказчик ОВП неПА УО формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

- При необходимости в заявке на ОВП устанавливается индикатор «Вовлечение НВИ». Индикатор устанавливается только при наличии данной потребности в запасе (проверка наличия потребности в запасе осуществляется путем формирования отчета «Обзор запасов»). При установке данного индикатора процедура согласования потребности меняется следующим образом: вместо ТЗ формируется и согласовывается служебная записка.

4.9.1.3. По приобретаемому оборудованию Ответственный за сопровождение ТЗ, назначенный в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР, готовит ТЗ/ОЛ (при наличии соответствующего требования, установленного Инструкцией Компании «Составление технического задания на приобретение оборудования (МТР)»). При необходимости получения наиболее полного перечня требований к оборудованию от смежных функциональных подразделений УО Ответственный за сопровождение ТЗ направляет соответствующий запрос в адрес руководителя соответствующего функционального подразделения УО. По результатам формирования ТЗ/ОЛ Ответственный за сопровождение ТЗ инициирует согласование и утверждение ТЗ/ОЛ в СЭД в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.

4.9.1.4. Сформированная заявка на ОВП согласовывается Руководителем функционального подразделения УО/УК (по своему функциональному направлению) в соответствии с регламентирующими документами функциональных подразделений (например, по части АХО потребность согласовывается Управлением развития социальной инфраструктуры):

- при отсутствии замечаний заявке на ОВП устанавливается статус «СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО»;

• при отсутствии обосновывающих документов или наличии замечаний к наполнению заявка на ОВП возвращается инициатору на доработку.

4.9.1.5. Потребностям, заявленным в заявках на ОВП со статусом «СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО».

Таблица №21 «Инициирование мероприятий проекта ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.010.3 Шаг ПП-07.02.03.04.020.3 Шаг ПП-07.02.03.04.030.3		Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Формирование заявки на ОВП Согласование заявки на ОВП Руководителем функционального подразделения Формирование, согласование и утверждение ТЗ/ОЛ
Входная информация (входящие документы, регистры)		Потребность в закупке МТР (оборудования)
Исполнитель		Заказчик ОВП неПА УО; Руководитель функционального направления УО; Ответственный за сопровождение ТЗ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		При возникновении потребности в непроизводственном оборудовании Заказчик ОВП неПА УО формирует в системе SAP заявку на ОВП в виде сетевого графика и прикладывает к ней документы, обосновывающие данную потребность. В заявке на ОВП указывается ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования Заказчик ОВП неПА УО формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). Сформированная заявка на ОВП согласовывается Руководителем функционального подразделения УО/УК. При отсутствии замечаний заявке на ОВП устанавливается статус «СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО», при наличии замечаний заявка на ОВП возвращается инициатору. При наличии требования к формированию ТЗ/ОЛ Ответственный за сопровождение ТЗ формирует ТЗ/ОЛ и инициирует согласование и утверждение ТЗ/ОЛ в СЭД.
Результаты выполнения работ		Заявка на ОВП (со статусом «СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО»); ТЗ/ОЛ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Согласование заявки на ОВП не более 5 рабочих дней с момента формирования заявки на ОВП. Заявка на ОВП формируется по мере возникновения потребности и период бюджетной кампании. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по формированию и согласованию ТЗ/ОЛ устанавливаются Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.
Используемые ИТ-системы		SAP S/4 HANA АСУ ЭДО

4.9.2. Уточнение заявки на ОВП:

4.9.2.1. После получения утвержденного ТЗ/ОЛ Заказчик ОВП неПА УО прикрепляет к заявке на ОВП полученные документы, а также уточняет номенклатуру оборудования (ОЗМ) на основании утвержденного ТЗ/ОЛ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП неПА УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

4.9.2.2. После выполнения вышеописанных процедур Заказчик ОВП неПА УО устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП Планировщиком цен в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». По результатам установки плановой цены заявке на ОВП автоматически устанавливается статус «РСЦН – Расценено».

Таблица №22 «Уточнение заявки на ОВП»

Шаг ПП-07.02.03.04.10.3 Шаг ПП-07.02.03.04.40.3		Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Корректировка заявки на ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Исполнитель	Заявка на ОВП (со статусом «СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО»); Утвержденное ТЗ/ОЛ.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Заказчик ОВП неПА УО прикрепляет утвержденное ТЗ/ОЛ к заявке на ОВП, а также уточняет ОЗМ на основании утвержденного ТЗ/ОЛ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП неПА УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). После уточнения ОЗМ и стоимости, а также прикрепления полученных документов Заказчик ОВП неПА УО устанавливает заявке на ОВП статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП, по результатам которого устанавливается статус «РСЦН – Расценено».
Результаты выполнения работ		Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено»); Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 2 рабочих дней на уточнение заявки на ОВП с момента получения утвержденного ТЗ/ОЛ. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по расценке заявки на ОВП устанавливаются Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг».
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.9.3. Согласование заявок на ОВП по АХО:

4.9.3.1. При наличии в заявке на ОВП потребности в оборудовании, относящегося к группам ППЗ, представленным в п. 4.9.3.2, заявка на ОВП согласовывается Специалистом, ответственным за контроль АХО. По результатам согласования устанавливается статус «КНТР – Контроль АХО», либо возвращается на корректировку Заявителю ОВП не ПА УО.

4.9.3.2. Согласование Специалистом, ответственным за контроль АХО, осуществляется по следующим группам ППЗ:

- пищевое оборудование;
- торговое оборудование;
- кондиционеры;
- оборудование коммунального хозяйства.

Таблица №23 «Контроль АХО»

Шаг ПП-07.02.03.04.50.3	Контроль АХО
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ» и «РСЦН – Расценено»)
Исполнитель	Специалист, ответственный за контроль АХО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Специалист, ответственный за контроль АХО согласовывает заявки на ОВП с потребностью в оборудовании, относящегося к группе ППЗ, представленного в п. 4.9.3.2.
Результаты выполнения работ	Заявка на ОВП (со статусом «КНТР – Контроль АХО»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней после расценки заявки на ОВП (установки статуса «РСЦН – Расценено»).
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9.4.Согласование и утверждение заявки на ОВП:

4.9.4.1.Согласование и утверждение заявки на ОВП осуществляется в соответствии с п.4.8.4-4.8.6 настоящего Регламента.

4.10.Описание процедуры «Планирование и согласование мероприятий проекта непроизводственного ОВП ИЦ»

4.10.1.Инициирование мероприятий проекта ОВП:

4.10.1.1.При возникновении потребности в оборудовании для ИЦ Заказчик ОВП ИЦ УО формирует в системе SAP отчет со списком заявок на ОВП ИЦ и проверяет на предмет отсутствия уже заявленной потребности среди существующих заявок на ОВП ИЦ.

4.10.1.2.При отсутствии уже заявленной потребности Заказчик ОВП ИЦ УО предварительно согласовывает заявку ОВП ИЦ и ТЗ без учета стоимости оборудования в СЭД с Директором ИЦ. Далее, Заказчик ОВП ИЦ формирует в SAP заявку на ОВП ИЦ в виде сетевого графика (вида «Р430 – Оборудование ИЦ (ОВИЗ/ОВСС)») и прикладывает к ней документы, обосновывающие данную потребность. В качестве Заказчика ОВП ИЦ УО может выступать сотрудник ИЦ, ответственный за планирование данного типа непроизводственного ОВП ИЦ. В заявке на ОВП указывается краткий текст заявки, сроки заявки с учетом ЛТ и ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования Заказчик ОВП ИЦ УО формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

4.10.1.3. При необходимости в заявке на ОВП ИЦ устанавливается индикатор «Вовлечение НВИ». Индикатор устанавливается только при наличии данной потребности в запасе (проверка наличия потребности в запасе осуществляется путем формирования отчета «Обзор запасов»). При наличии необходимого оборудования формируется служебная записка вместо ТЗ.

4.10.1.4.По приобретаемому оборудованию Заказчик ОВП ИЦ УО, назначенный в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР, готовит ТЗ (при наличии соответствующего требования, установленного Инструкцией Компании «Составление технического задания на

приобретение оборудования (МТР)»). По результатам формирования ТЗ Заказчик ОВП ИЦ УО инициирует согласование и утверждение ТЗ в СЭД в соответствии с Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.

4.10.1.5. Сформированная заявка на ОВП ИЦ согласовывается Директором ИЦ:

- при отсутствии замечаний заявке на ОВП ИЦ и согласовании ТЗ в СЭД, устанавливается статус «СДИЦ – Согласовано Директором ИЦ»;
- при отсутствии обосновывающих документов или наличии замечаний к наполнению заявка на ОВП ИЦ возвращается инициатору на доработку.

Таблица 14 «Инициирование мероприятий проекта ОВП ИЦ»

Шаг ПП-07.02.03.04.010.4 Шаг ПП-07.02.03.04.020.4 Шаг ПП-07.02.03.04.030.4 Шаг ПП-07.02.03.04.040.4		Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Формирование заявки на ОВП ИЦ Согласование заявки на ОВП ИЦ Директором ИЦ Формирование, согласование и утверждение ТЗ
Входная информация (входящие документы, регистры)		Потребность в приобретении оборудования
Исполнитель		Заказчик ОВП ИЦ УО; Директор ИЦ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		При возникновении потребности в непроизводственном оборудовании Заказчик ОВП ИЦ УО формирует в системе SAP заявку на ОВП ИЦ в виде сетевого графика и прикладывает к ней документы, обосновывающие данную потребность. В заявке на ОВП ИЦ указывается ОЗМ приобретаемого оборудования. При отсутствии записи оборудования Заказчик ОВП ИЦ УО формирует и направляет заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). Сформированная заявка на ОВП ИЦ согласовывается Директором ИЦ. При отсутствии замечаний заявке на ОВП устанавливается статус «СДИЦ – Согласовано Директором ИЦ», при наличии замечаний заявка на ОВП ИЦ возвращается инициатору. При наличии требования к формированию ТЗ Заказчик ОВП ИЦ УО формирует ТЗ и инициирует согласование и утверждение ТЗ в СЭД.
Результаты выполнения работ		Заявка на ОВП ИЦ (со статусом «СДИЦ – Согласовано Директором ИЦ»); ТЗ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Согласование заявки на ОВП ИЦ не более 5 рабочих дней с момента формирования заявки на ОВП ИЦ. Заявка на ОВП ИЦ формируется по мере возникновения потребности. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ». Временные ограничения по формированию и согласованию ТЗ устанавливаются Регламентом формирования, согласования и утверждения ТЗ на приобретение МТР.
Используемые ИТ-системы		SAP S/4 HANA АСУ ЭДО

4.10.2. Уточнение заявки на ОВП:

4.10.2.1. После получения, утвержденного ТЗ Заказчик ОВП ИЦ УО прикрепляет к заявке на ОВП ИЦ полученные документы, а также уточняет номенклатуру оборудования (ОЗМ) на основании утвержденного ТЗ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ИЦ УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования) в соответствии с Регламентом Компании «Управление данными НСИ».

4.10.2.2. После выполнения вышеописанных процедур Заказчик ОВП ИЦ УО

устанавливает заявке на ОВП ИЦ статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ».

4.10.2.3. Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг», по результатам которого устанавливается статус «РСЦН – Расценено».

Таблица 25 «Уточнение заявки на ОВП ИЦ»

Шаг ПП-07.02.03.04.010.4 Шаг ПП-07.02.03.04.040.4		Проверка наличия записи материала/оборудования в SAP Корректировка заявки на ОВП ИЦ
Входная информация (входящие документы, регистры)	Исполнитель	Заявка на ОВП (со статусом «СДИЦ – Согласовано Директором ИЦ»); Утвержденное ТЗ.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Заказчик ОВП ИЦ УО Заказчик ОВП ИЦ УО прикрепляет утвержденное ТЗ к заявке на ОВП ИЦ, а также уточняет ОЗМ на основании утвержденного ТЗ. При отсутствии записи уточненного оборудования Заказчик ОВП ИЦ УО формирует заявку на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ (с указанием характеристик нового оборудования). После уточнения ОЗМ и стоимости, а также прикрепления полученных документов Заказчик ОВП ИЦ УО устанавливает заявке на ОВП ИЦ статус «СГТЗ – Согласованное ТЗ». Далее, осуществляется расценка заявки на ОВП, по результатам которого устанавливается статус «РСЦН – Расценено».
Результаты выполнения работ		Заявка на ОВП ИЦ (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ»); Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ		Не более 2 рабочих дней на уточнение заявки на ОВП ИЦ с момента получения утвержденного ТЗ. Временные ограничения по созданию записи ОЗМ в КСУ НСИ устанавливаются регламентом Компании «Управление данными НСИ».
Используемые ИТ-системы		SAP S/4HANA

4.10.3.Согласование заявок на ОВП ИЦ:

4.10.3.1.Заявки на ОВП ИЦ, планируемые к реализации в рамках текущего года (с датой потребности текущего года), согласовываются Сток-контролером на предмет корректности заявленных позиций и дат потребности с учетом ЛТ.

4.10.3.2.В случае согласования Сток-контролер устанавливает заявке на ОВП статус «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком».

4.10.3.3.В случае необходимости корректировки потребности, информирует заявителя потребности о необходимости корректировки.

Таблица 26 «Согласование заявок на ОВП ИЦ»

Шаг ПП-07.02.03.04.050.4		Комплексное согласование заявок на ОВП ИЦ
Входная информация (входящие документы, регистры)	Исполнитель	Заявка на ОВП ИЦ (со статусом «СГТЗ – Согласованное ТЗ»); Заявка на создание записи ОЗМ в КСУ НСИ.
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса		Сток-контролер осуществляет проверку заявок на ОВП ИЦ, инициируемых к закупке в рамках текущего года, на предмет корректности заявляемой позиции, стоимости и выполнимости ЛТ. При отсутствии замечаний Сток-контролер устанавливает на заявке на ОВП ИЦ статус «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком». При наличии замечаний информирует инициатора потребности о необходимости корректировки заявки на ОВП в SAP либо по электронной почте.
Результаты выполнения работ		Заявка на ОВП (со статусом «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком»)

Шаг ПП-07.02.03.04.050.4	Комплексное согласование заявок на ОВП ИЦ
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более 2 рабочих дней с момента согласования заявки на ОВП Инвестиционной комиссией УО (установки статуса «ИКБЕ – Согласовано ИК БЕ»).
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.10.4. Утверждение мероприятий проекта ОВП ИЦ и передача в реализацию:

4.10.4.1. Согласование и утверждение заявки на ОВП ИЦ осуществляется в соответствии с п.4.8.6 настоящего Регламента.

4.10.4.2. Согласующий Инвестиционного комитета УК присваивает заявке ОВП ИЦ статус «УТВР – Утверждено на ИК УК».

Таблица №27 «Утверждение мероприятий проекта ОВП ИЦ и передача в реализацию»

Шаг ПП-07.02.03.04.080.4 Шаг ПП-07.02.03.04.090.4	Утверждение сводного плана мероприятий ОВП ИЦ Передача мероприятий ОВП в реализацию
Входная информация (входящие документы, регистры)	Заявка на ОВП (со статусом «СГКБ – Согласовано Коммерческим блоком»)
Исполнитель	Согласующий Инвестиционного комитета УК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	После рассмотрения и утверждения инвестиционной программы в АСКИ сетевым графиком проекта ОВП устанавливается статус «АСКИ – Заявка согласована в АСКИ». Согласующий Инвестиционного комитета УК присваивает заявке ОВП ИЦ статус «УТВР – Утверждено на ИК УК».
Результаты выполнения работ	Сетевой график проекта ОВП ИЦ (со статусом «УТВР – Утверждено»); Заявка на ОВП ИЦ (со статусом «УТВР – Утверждено на ИК УК»).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Установка статуса «УТВР – Утверждено на ИК УК» осуществляется: • для мероприятий, утверждаемых в рамках бюджетной кампании – не позднее 1 января планового года; • для мероприятий, утверждаемых за рамками бюджетной кампании – не более 1 рабочего дня с момента утверждения скорректированных лимитов в АСКИ.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.11. Описание процедуры «Реализация проекта ОВП»

4.11.1. Деблокирование мероприятий проекта ОВП и передача потребности Сток-контролеру:

4.11.1.1. Назначенный решением Технического комитета УО (для производственного ОВП) или Инвестиционной комиссией УО (для непроизводственного ОВП) Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО осуществляет деблокирование сетевого графика проекта ОВП. При этом по производственному ОВП перед деблокированием осуществляется:

- проверка проекта ОВП на синхронность графика проекта ОВП с графиком выполнения воздействий на ПА. При необходимости монтажа оборудования в период остановочного ремонта, график проекта ОВП не должен противоречить графику остановочного ремонта, сформированного в соответствии с Регламентом Компании «Планирование остановочных ремонтов». При необходимости осуществляет корректировку проекта ОВП;

- анализ мероприятий проекта ОВП на предмет необходимости выполнения

сборочных и монтажных/демонтажных работ собственными силами путем просмотра ТЗ, вложенного в ОСГ проекта ОВП. При наличии данного требования в ТЗ, Ответственный за реализацию мероприятий ОВП УО уведомляет Планировщика ОВП по электронной почте о необходимости создания заказа ТОРО на выполнение сборочных/монтажных/демонтажных работ с привязкой в данному мероприятию проекта ОВП. Создание заказа ТОРО и его включение в программу ППА осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА».

4.11.1.2. После деблокирования потребность в оборудовании обрабатывается Сток-контролером в соответствии с Регламентом Компании «Оперативное планирование обеспечения». После обработки потребность передается в закупку в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение закупки».

4.11.1.3. Далее, Ответственный за реализацию мероприятий ОВП УО осуществляет мониторинг статуса закупочных процедур с помощью гибкого отчета «Исполнение закупок».

4.11.1.4. В случае получения от Сток-контролера запроса на корректировку потребности с предложением замены номенклатуры либо срока потребности, Ответственный за реализацию мероприятий ОВП УО в срок не более 10 рабочих дней обрабатывает поступивший запрос на корректировку:

- решение об изменении номенклатуры должно быть согласовано:
 - по производственному ОВП – Техническим комитетом УО;
 - по непроизводственному ОВП – руководителем функционального подразделения заявителя УО или профильного функционального блока УК (например, для оборудования АХО обязательное согласование с Управлением развития социальной инфраструктуры УК);
 - если в рамках закупочной процедуры принято решение о закупке аналога с другим кодом ЕК МТР – согласование осуществляется только Ответственным за реализацию мероприятий ОВП УО в течение 1 рабочего дня в соответствии с требованиями Регламента Компании «Ведение аналогов, применяемых для задач ТОиР»;
- решение об изменении сроков поставки должно быть согласовано со сроками связанных работ по проекту (при наличии таковых).

4.11.1.5. После оценки и анализа влияния запроса на корректировку потребности на реализацию проекта ОВП Ответственный за реализацию мероприятий ОВП УО в системе SAP S/4HANA с учетом требований Методических указаний Компании «Порядок определения и корректировки плановых сроков поставки заявляемой потребности в МТР» выполняет одну из следующих операций:

- согласовывает запрос на корректировку потребности. В этом случае номенклатура и/или дата поставки в проекте ОВП меняется на предложенную и Сток-контролеру передается скорректированная потребность. При увеличении даты поставки

оборудования, закупаемого взамен изношенного, необходимо запланировать дополнительные мероприятия ТОиР для поддержания технического состояния выбываемого оборудования до поставки и ввода в эксплуатацию нового оборудования. Дополнительные мероприятия ТОиР планируются в соответствии с Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»;

- отклоняет запрос на корректировку потребности, если изменение номенклатуры и/или сроков потребности в МТР может негативно повлиять на ход реализации и результаты проекта. При отклонении запроса Сток-контролер и Ответственный закупщик должны обеспечить обработку ранее заявленной потребности с учетом требований НМД по закупочной деятельности.

4.11.1.6. При превышении утвержденного лимита бюджета проекта ОВП запрос увеличения лимита осуществляется следующим образом (зависимости от группы проекта ОВП):

- для проекта производственного ОВП 1 группы:
 - без увеличения лимита TOTC в АСКИ: Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО выносит инициативу по корректировке лимита на Технический комитет УО с согласования Финансовым директором УО, где принимается решение об источнике увеличения лимита и инициируется дальнейшая корректировка лимита в системе SAP S/4HANA в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА»;
 - с увеличением лимита TOTC в АСКИ: Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО согласовывает увеличение лимита проекта ОВП в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью. После согласования увеличения лимита Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП инициирует корректировку лимита в системе SAP S/4HANA в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА»;
- для проекта производственного ОВП 2 группы: Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО согласовывает увеличение лимита проекта ОВП в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью. После согласования увеличения лимита Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО формирует прогноз бюджета проекта ОВП в системе SAP S/4HANA и осуществляет передачу данных в АСКИ, где осуществляется утверждение скорректированных лимитов;
- для проекта непроизводственного ОВП: Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО согласовывает увеличение лимита проекта ОВП в соответствии с Регламентом управления инвестиционной деятельностью. После согласования увеличения лимита Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО формирует прогноз бюджета проекта ОВП в системе SAP S/4HANA и осуществляет передачу данных в АСКИ, где осуществляется утверждение скорректированных лимитов.

Таблица 38 «Деблокирование проекта ОВП и передача потребности Сток-контролеру»

	Утверждение потребности в оборудовании (деблокирование) Анализ статуса закупочных процедур Анализ запроса на корректировку потребности Согласование запроса на корректировку потребности
Входная информация (входящие документы, регистры)	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «УТВР – Утверждено»)
Исполнитель	Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО; Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО проверяет сетевой график проекта ОВП на корректность и осуществляет деблокирование, после которого потребность в оборудовании обрабатывается Сток-контролером и передается в закупку. Далее, Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО осуществляет мониторинг статуса закупочных процедур с помощью гибкого отчета «Исполнение закупок». В случае получения от Сток-контролера запроса на корректировку потребности с предложением замены номенклатуры либо срока потребности, Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО обрабатывает поступивший запрос на корректировку. После оценки и анализа влияния запроса на корректировку потребности на реализацию проекта ОВП Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО в системе SAP S/4HANA согласовывает либо отклоняет запрос на корректировку. При превышении лимита бюджета проекта ОВП Специалист по управлению бюджетом проекта ОВП УО инициирует корректировку лимитов.
Результаты выполнения работ	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «ДЕБЛ – Деблокирован»); Потребность в оборудовании/МТР; Запрос на корректировку от Сток-контролера (согласованный или отклоненный).
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Деблокирование осуществляется не более 3 рабочих дней с момента утверждения проекта ОВП. Временные ограничения по обработке потребности в оборудовании/МТР и проведению закупочных процедур устанавливаются Регламентом Компании «Оперативное планирование обеспечения» и Регламентом Компании «Выполнение закупки» соответственно. Срок обработки запроса на корректировку потребности от Сток-контролера – не более 10 рабочих дней.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4 HANA

4.11.2. Приемка оборудования и закрытие проекта ОВП

4.11.2.1. После поступления оборудования к месту первичного поступления Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП совместно с Ответственными за приемку осуществляют входной контроль поступившего оборудования в соответствии с Инструкцией по проведению входного контроля МТР в местах первичного поступления.

4.11.2.2. По результатам входного контроля акты приема-передачи оборудования и/или иные формы первичной учетной документации в соответствии с требованиями «Учетной политики для целей бухгалтерского учета для компаний группы Полюс» (например, акт приема-передачи) на бумажном носителе подписываются уполномоченными представителями заказчика и подрядчика и передается ответственному по договору для последующей обработки и проводки акта в соответствии с Регламентом

Компании «Управление обязательствами поставщиков МТР». После проводки акта выполненных работ в бухгалтерском учете, на соответствующей операции сетевого графика автоматически отражаются фактические затраты.

4.11.2.3. При наличии по производственному ОВП сборочных и монтажных/демонтажных работ, выполняемых собственными силами, выполнение данных работ осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействий на ПА», результатом которого является технически закрытый Заказ ТОРО.

4.11.2.4. После завершения приемочных работ Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО закрывает сетевой график проекта ОВП.

4.11.2.5. В рамках подготовки к завершению текущего года Руководитель проекта ОВП УО проверяет выполнение всех мероприятий по проекту ОВП, в том числе наличие невыполненных обязательств по договорам. При наличии открытых позиций Руководитель проекта ОВП УО вырабатывает решения/ выдает поручения Ответственным за реализацию мероприятий проекта ОВП.

4.11.2.6. После завершения работ и выполнения поручений, Руководитель проекта ОВП УО закрывает проект ОВП в системе SAP. При наличии мероприятий, переходящих на следующий год, срок завершения проекта ОВП продлевается до завершения всех перенесенных мероприятий ОВП.

Таблица 29 «Приемка выполненных работ и закрытие проекта ОВП»

	Анализ поступлений и перемещений оборудования/МТР Списание оборудования/МТР на проект Установка статуса «Завершено» на сетевом графике проекта Закрытие проекта ОВП
Входная информация (входящие документы, регистры)	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «ДЕБЛ – Деблокирован»)
Исполнитель	Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО; Руководитель проекта ОВП УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО совместно с ответственными за приемку осуществляют входной контроль поступившего оборудования. После проверки и согласования первичной учетной документации, пакет документов передается ответственному по договору. После завершения приемочных работ Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО закрывает сетевой график проекта ОВП. После завершения всех работ по проекту ОВП Руководитель проекта ОВП УО закрывает проект ОВП в системе SAP.
Результаты выполнения работ	Сетевой график проекта ОВП (со статусом «ЗАКР – Закрытый»); Акт приема-передачи оборудования и/или иные формы первичной учетной документации; Закрытый проект ОВП.
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Сроки приемочных работ устанавливаются договорами поставки. Закрытие проекта ОВП осуществляется не более 3 рабочих дней после завершения всех работ по проекту.
Используемые ИТ-системы	SAP S/4 HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы» определяются следующими метриками:

- доля утвержденных проектов ОВП, %.

Таблица №30 «Метрики эффективности бизнес-процесса «Планирование проектов ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Методика расчета метрики эффективности	Единицы измерения метрики эффективности	Источники информации	Способ формирования (системное/внесистемное)
1	Доля утвержденных проектов ОВП	Отношение количества утвержденных проектов ОВП, к общему количеству созданных заявок на ОВП	%	Протоколы решения коллегиальных органов, заявки на ОВП в Системе	Внесистемный

Эффективность и результативность процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)» определяются следующими метриками:

- доля проектов ОВП, потребовавших корректировки лимитов, %.

Таблица №31 «Метрики эффективности бизнес-процесса «Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Методика расчета метрики эффективности	Единицы измерения метрики эффективности	Источники информации	Способ формирования (системное/внесистемное)
1	Доля проектов ОВП, потребовавших корректировки лимитов	Отношение количества проектов ОВП, потребовавших корректировки лимитов, к общему количеству утвержденных проектов ОВП	%	Отчет «Запросы на корректировку бюджета ТОРО» (СПП-элементы со статусами УТВП и УТВК)	Системный

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.02.03.04-001 <u>Описание риска</u> Проект ОВП сформирован для ПА, на которое уже запланировано воздействие <u>Причина риска</u> Недостаточная осведомленность о запланированных мероприятиях по воздействию на ПА	С.ПП-07.02.03.04-001-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> С целью проверки того, что однотипные и дублирующие мероприятия ОВП не утверждены и не реализуются, Заказчик ОВП ПА 1 группы УО или Заказчик ОВП ПА 2 группы УО (далее – Исполнитель КП) формирует Сводный отчет по заявкам на ОВП и проводит анализ на предмет наличия дублирующих мероприятий ОВП. Данный отчет позволяет вывести реестр заявок на ОВП с классификацией, плановыми сроками реализации с привязкой к ПА. Исполнитель КП проверяет наличие уже заявленных и реализуемых проектов в системе SAP S/4HANA. В случае наличия аналогичных проектов для данного ПА Исполнитель

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	КП отклоняет инициативу о необходимости замены оборудования как дублирующую, и заносит инициативу в Архив идей. В случае если в плановые сроки для данного ПА запланировано другое воздействие, Исполнитель КП корректирует плановые сроки реализации проекта путем согласования новых сроков с инициатором проекта ОВП. В случае отсутствия аналогичных проектов для данного производственного актива Исполнитель КП продолжает проработку проекта ОВП. <u>Частота выполнения контроля</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Заказчик ОВП ПА 1 группы УО; Заказчик ОВП ПА 2 группы УО.
R.П-07.02.03.04-002 <u>Описание риска</u> Проект производственного ОВП запланирован к реализации некорректно/ нецелесообразно/ с использованием неверного способа реализации <u>Причина риска</u> Низкое качество проработки документации к проекту ОВП, наличие пересечений с прочими мероприятиями по воздействию на ПА	C.П-07.02.03.04-002-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При поступлении подготовленных в рамках технической проработки проекта производственного ОВП документов (ТЗ/ОЛ, предварительное ТКП, СГ проекта в Системе) Технический комитет УО (далее Исполнитель КП) проверяет поступившие документы на полноту и корректность. В рамках рассмотрения документов проекта производственного ОВП, Исполнитель КП проверяет целесообразность реализации идеи, техническую реализуемость, взаимное влияние предложенных к рассмотрению инициатив, а также возможные экономические эффекты. В случае подтверждения целесообразности реализации проекта ОВП Исполнитель КП принимает решение о включении проекта в состав программы воздействий на ПА, решение оформляется Протоколом решения ТК. В случае некорректности поступивших обосновывающих документов по проекту Исполнитель КП инициирует их корректировку и проводит повторный контроль. В случае нецелесообразности реализации мероприятий проекта ОВП Исполнитель КП отклоняет мероприятие проекта ОВП, решение оформляется Протоколом решения ТК. <u>Частота контрольной процедуры</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Технический комитет УО
R.П-07.02.03.04-003 <u>Описание риска</u> Проект непроизводственного ОВП запланирован к реализации некорректно/ нецелесообразно <u>Причина риска</u>	C.П-07.02.03.04-003-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После предоставления Заказчиком ОВП неПА УО обосновывающих документов Руководитель функционального направления УО (далее – Исполнитель КП) проверяет их на предмет полноты и корректности. В случае отсутствия замечаний Исполнитель КП согласует Заявку на ОВП, проставляя в системе SAP S/4 HANA пользовательский статус


Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
Документы заполнены не корректно/ не полностью	«СРФН – Согласовано руководителем функционального направления УО». В случае наличия замечаний Исполнитель КП инициирует внесение корректировок в документы. <u>Частота контрольной процедуры</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Руководитель функционального направления УО
R.ОП-03.02.19-001 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование потребности и стоимости оборудования <u>Причина риска</u> 1. Технические ошибки при ручном вводе потребности в оборудовании (номенклатура/количество), обусловленные большим объемом данных. 2. Несвоевременный ввод/ корректировка потребности в оборудовании, обусловленные большим объемом данных. 3. Плановая стоимость оборудования превышает лимит средств, требуется согласование финансирования для опережающей контрактации.	С.ПП-03.02.19-001-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После формирования потребности в системе SAP S/4HANA и до передачи потребности Сток-контролеру Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО (далее – Исполнитель КП) проверяет: - структуру проекта (СПП-элементы), сопоставляя структуру с составом работ по проекту; - корректность заполнения полей ввода данных; - корректность номенклатуры МТР. В случае если выявлены расхождения, Исполнитель КП вносит необходимые корректировки в систему. В случае, если расхождения не выявлены или выявленные расхождения устранены, Исполнитель КП изменяет статус по СПП-элементам в транзакции «CJ20N Project Builder проекта на «Деблокировано». В системе SAP S/4 HANA настроено автоматическое создание Заявок на закупку / резервирование (модуль SAP MM) при деблокировании ОСГ, содержащих потребности в МТР, с указанием наименования, количества, срока поставки, плановой стоимости (транзакция CJ20N), а также при добавлении дополнительной потребности в деблокированные ОСГ. При этом для не деблокированных ОСГ создать заявки на закупку / резервирование невозможно. При утверждении потребности в системе SAP S/4HANA автоматически выполняется проверка доступности бюджета затрат на сумму потребности и не превышение лимита затрат. В случае если общая сумма исчерпанного бюджета превышает установленный процент загруженного из АСКИ лимита, система выведет предупреждение. <u>Частота контрольной процедуры</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО
R.ОП-03.02.19-001 <u>Описание риска</u> Некорректное формирование потребности и стоимости оборудования	С.ПП-03.02.19-002-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> По мере необходимости после получения запроса на корректировку потребности от сток-контроллера Ответственный за реализацию

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
<u>Причина риска</u> 1. Сроки потребности не соответствуют LT. 2. МТР, заявленное в потребности, снято с производства, требуется согласование аналогов 3. МТР, заявленное в потребности, не может быть поставлено в указанный срок, в заявленный срок возможна поставка аналога.	мероприятий проекта ОВП УО (далее – Исполнитель КП) проверяет обоснованность внесения корректировок в потребность: - изменения сроков. Решение об изменении сроков поставки должно быть согласовано со сроками связанных работ по проекту (при наличии таковых); - необходимость замены номенклатуры. Решение об изменении номенклатуры должно быть согласовано: ○ по производственному ОВП – Техническим комитетом УО; ○ по непроизводственному ОВП – руководителем функционального подразделения-заявителя УО или профильного функционального блока УК (например, для оборудования АХО обязательное согласование с Управлением развития социальной инфраструктуры УК); В случае наличия замечаний отклоняет заявку со статусом «Отклонено». В случае отсутствия замечаний согласует запрос на корректировку со статусом «Согласовано». <u>Частота контрольной процедуры</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Ответственный за реализацию мероприятий проекта ОВП УО
R.ОП-03.02.19-002 <u>Описание риска</u> Несвоевременная поставка МТР и/или оборудования <u>Причина риска</u> 1. Планирование потребности на основании неактуальных LT. 2. Изменение LT МТО после планирования графика реализации и формирования потребности заявителем/ 3. Планирование потребности (срочная потребность) без учета LT.	C.ПП-03.02.19-003-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> По мере необходимости, при уточнении номенклатуры потребности в системе SAP S/4HANA выполняется автоматическая проверка срока на основе LT, введенных для ЕК МТР. В случае если срок LT не может быть соблюден для срока потребности, система выдает уведомление о превышении срока гарантированной поставки и не позволяет деблокировать мероприятие проекта ОВП и передать потребность в закупку. В случае если МТР доступен в указанный срок потребности происходит деблокирование мероприятия проекта ОВП и резервирование МТР/оборудования для проекта (адресная потребность). <u>Частота контрольной процедуры</u> При возникновении необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо


7. Модель бизнес-процесса

Модель бизнес-процесса «ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы»:


ПП-07.02.03.04-ERP Планирование программы ОВП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы

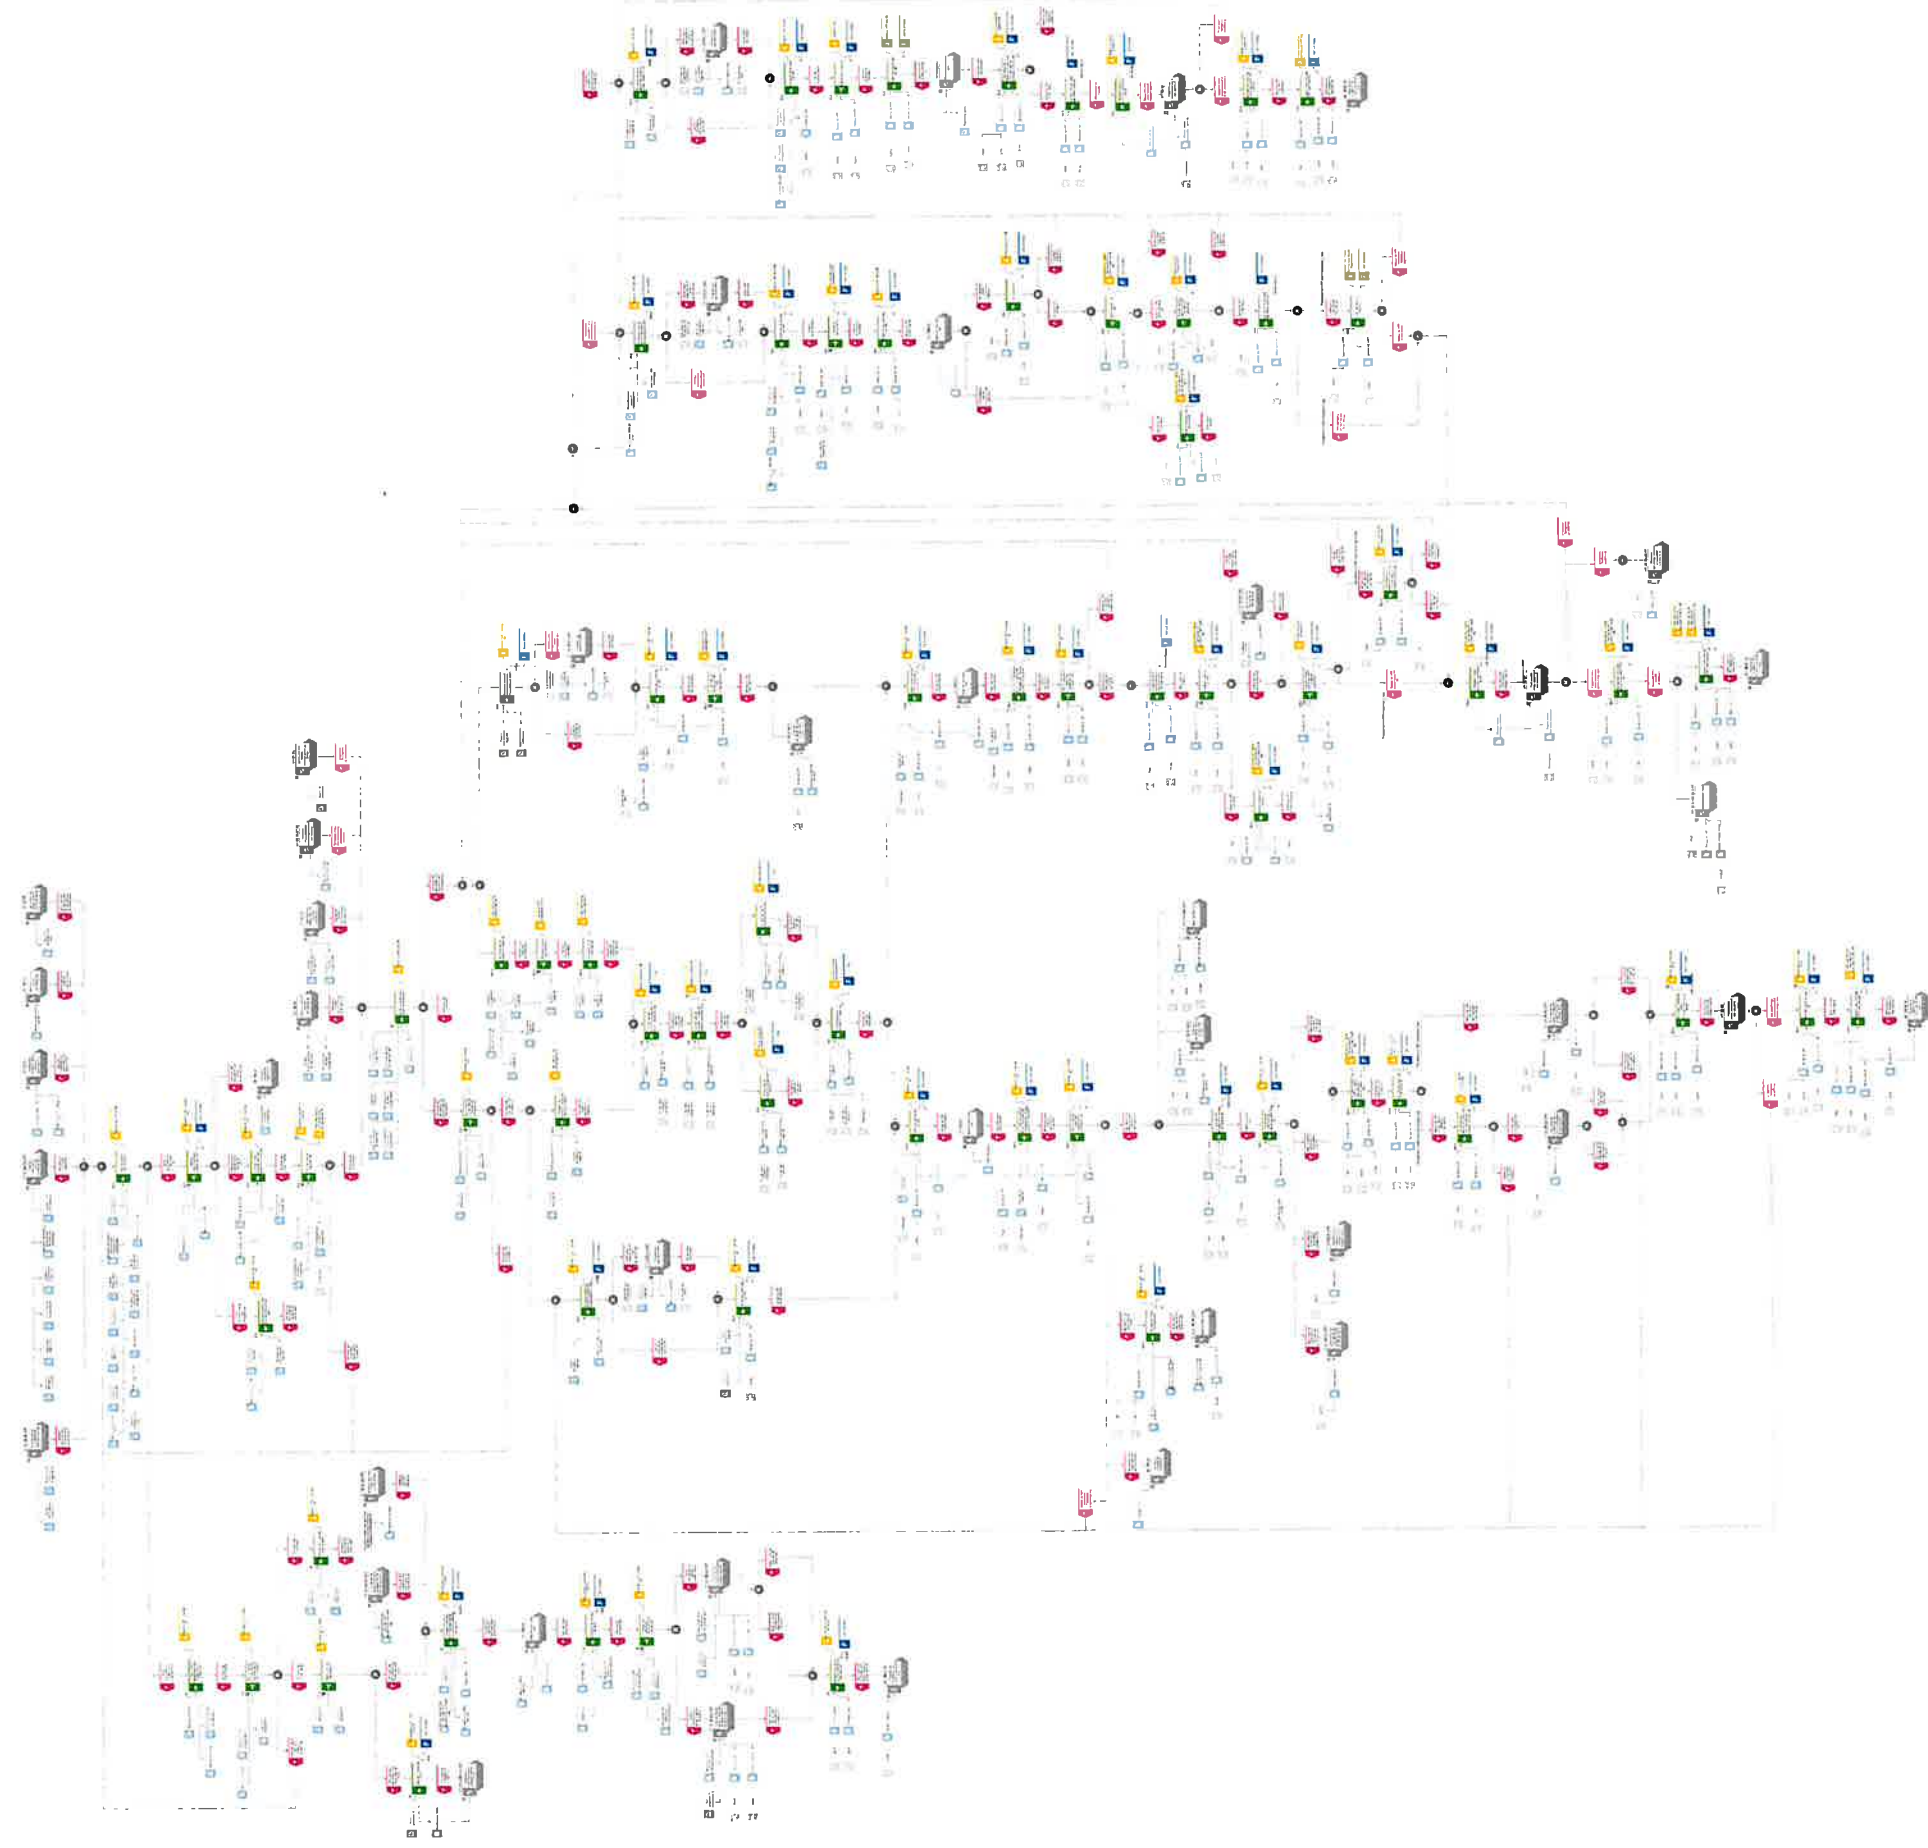

Модель бизнес-процесса «ОП-03.02.19 Управление потребностью и стоимостью (в SAP ERP)»:
ОП-03.02.19.03-ERP Управление потребностью и стоимостью ОДЦ

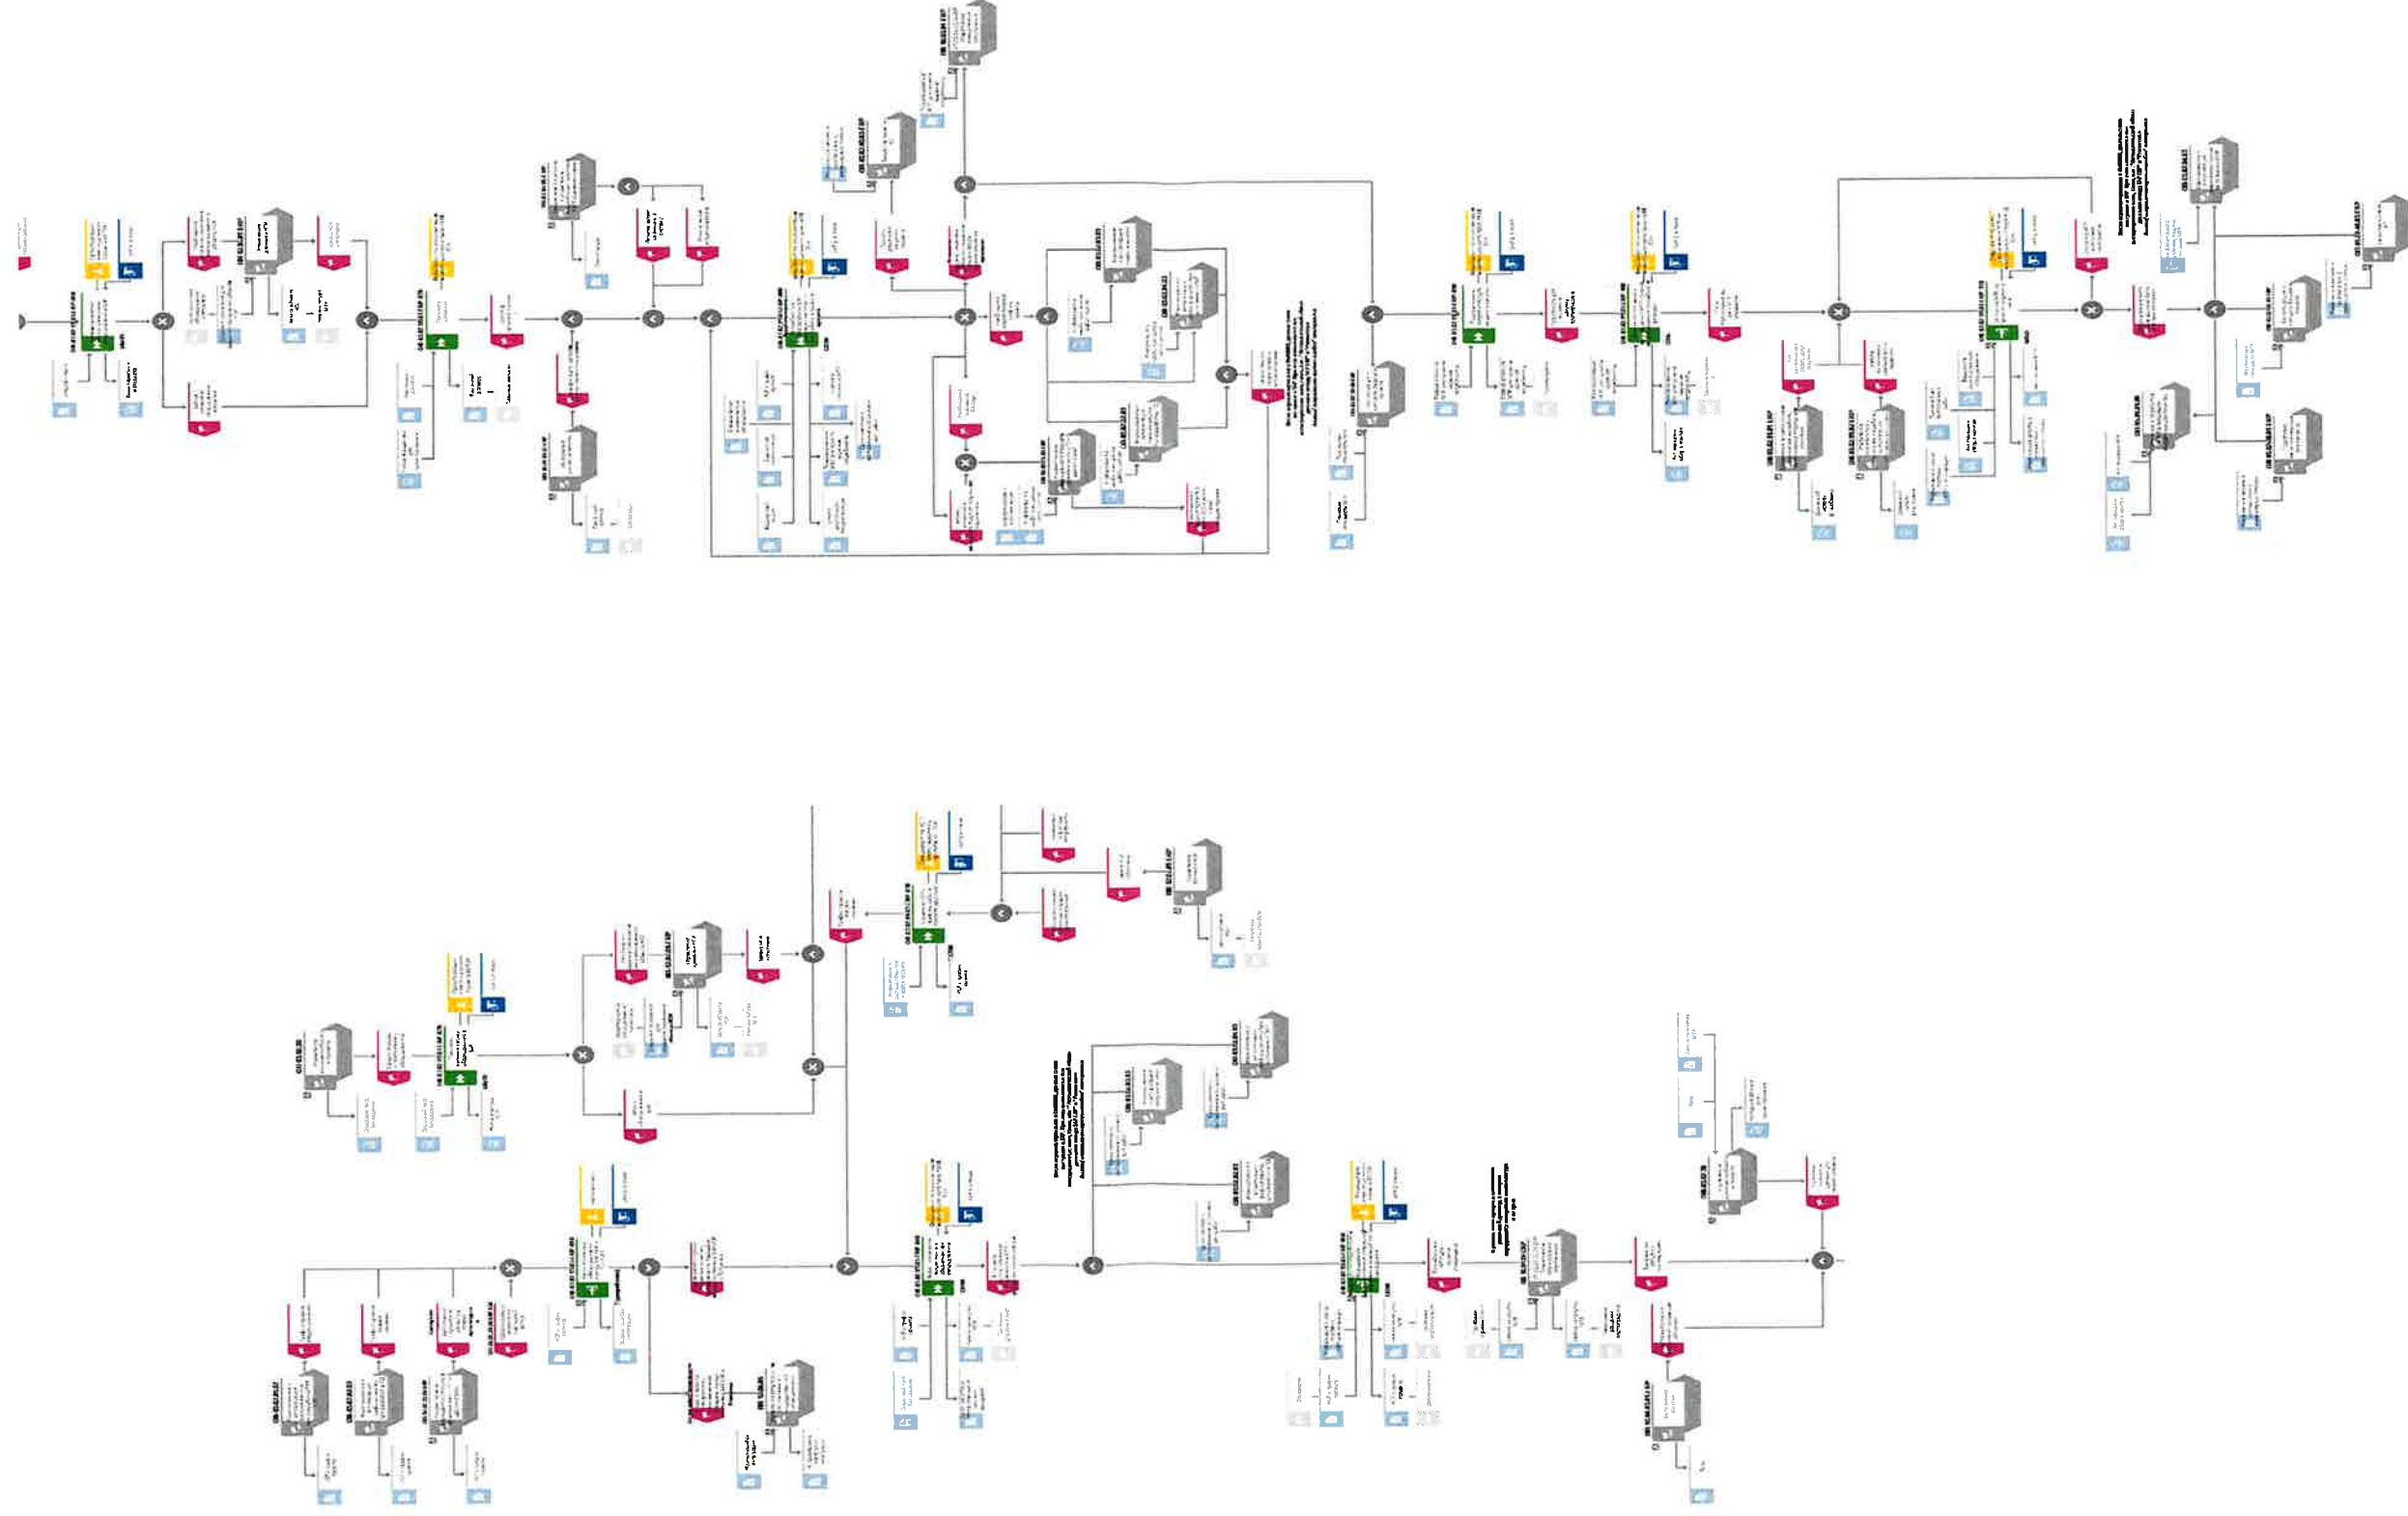

ОП-03.02.19.04-ERP Управление потребностью и стоимостью МТР (кроме ОДЦИ)

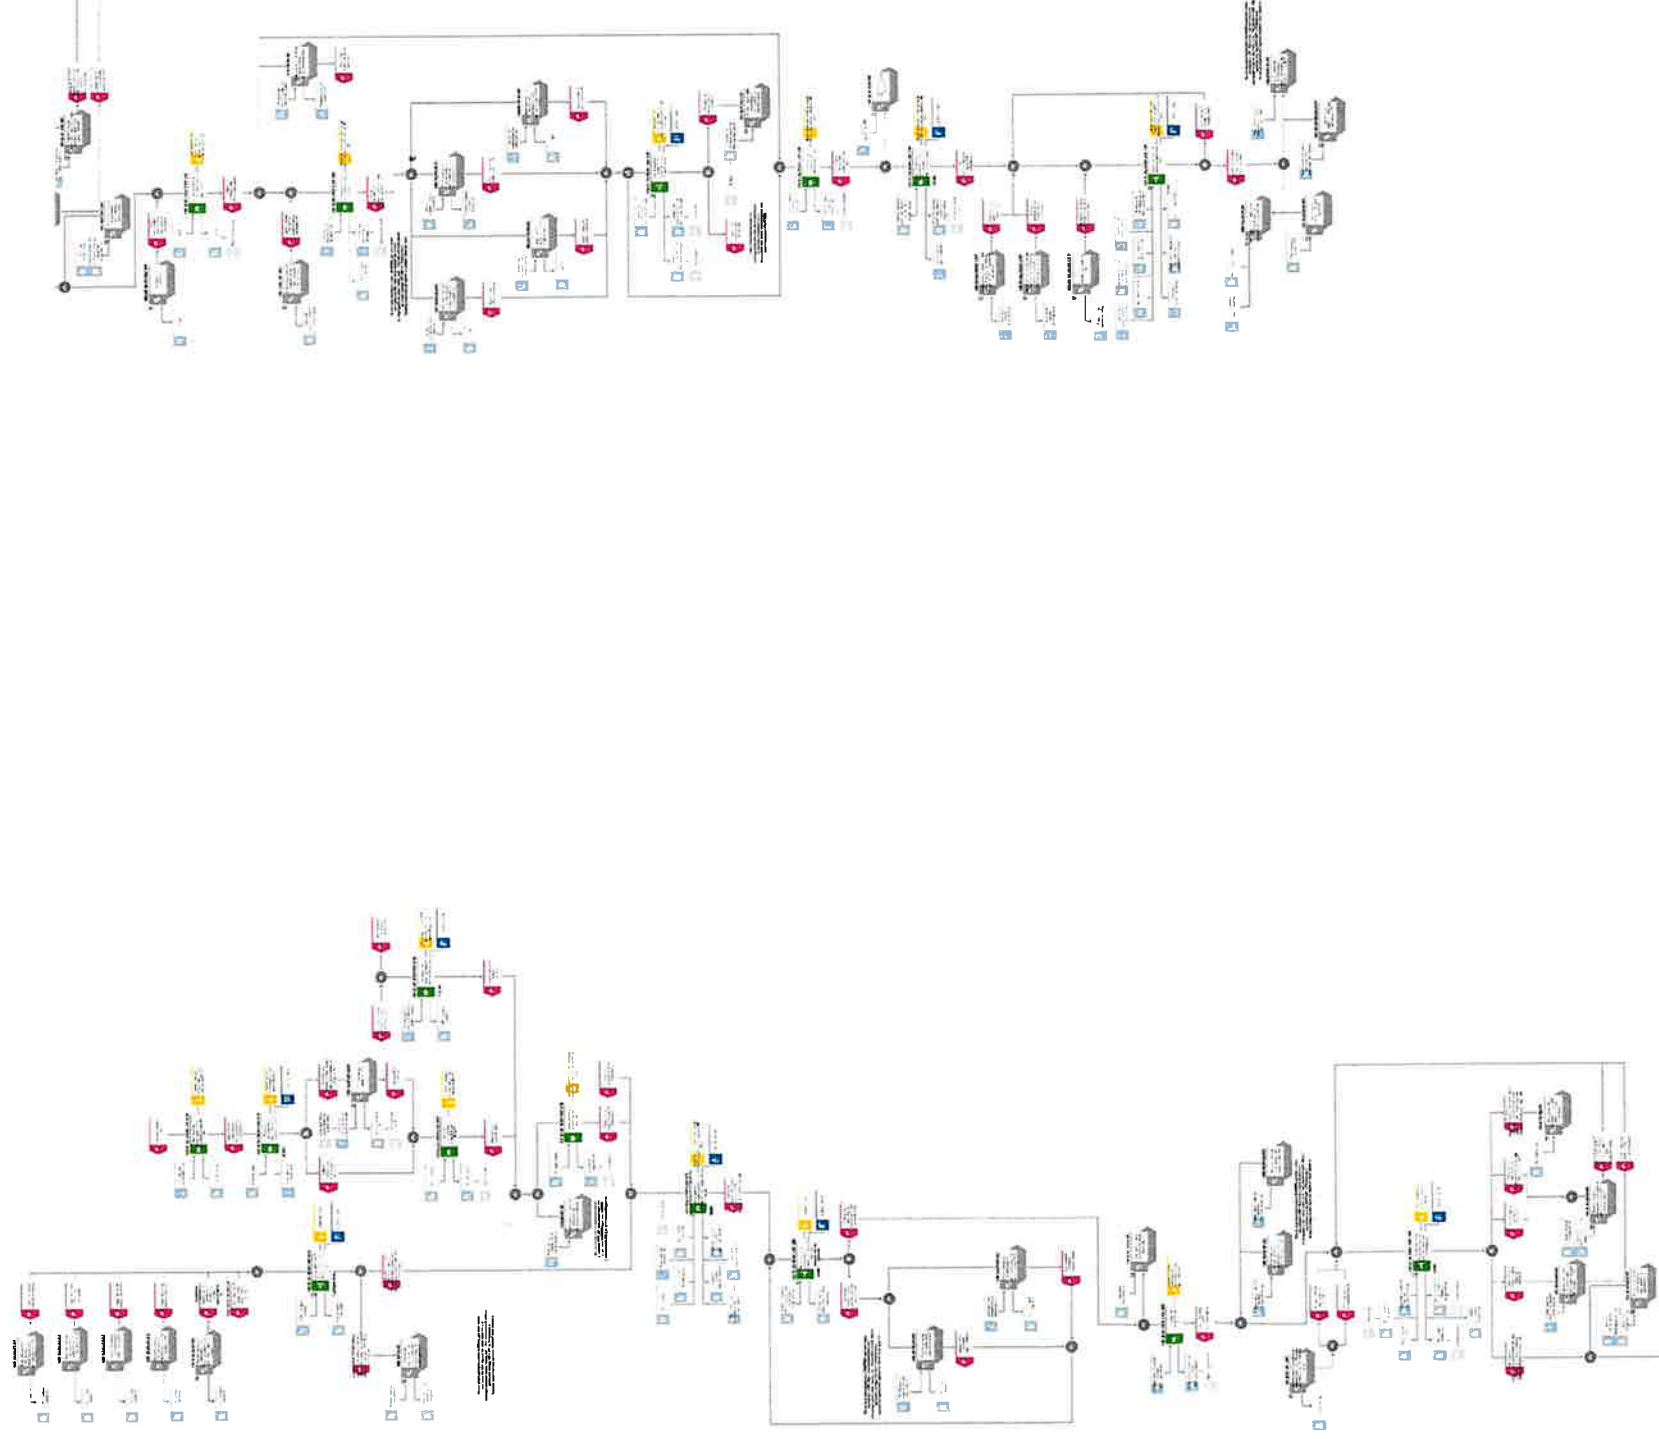

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
3. Стандарт «Управление инвестиционными проектами капитального строительства» (Приказ 124-п от 31.08.2017).
4. Регламент Компании «Управление инвестиционной деятельностью» (Приказ №220-п от 18.12.2020).
5. Регламент Компании «Формирование, согласование и утверждение технических заданий на приобретение МТР» (Приказ №131-п от 11.10.2018).
6. Регламент Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов» («проект»).
7. Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировки и контроля бюджета поддержания ПА» («проект»).
8. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»).
9. Регламент Компании «Планирование остановочных ремонтов» («проект»).
10. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»).
11. Регламент Компании «Выполнение закупки» («проект»).
12. Регламент Компании «Разработка долгосрочных календарных планов горных работ» (Приказ №135-п от 11.09.2020).
13. Регламент Компании «Управление данными НСИ» (Приказ №168-п от 28.11.2019).
14. Регламент Компании «Введение НСИ ТОиР» («проект»).
15. Регламент Компании «Управление обязательствами поставщиков МТР» («проект»).
16. Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактический учет воздействия на ПА» («проект»).
17. Регламент Компании «Ведение аналогов, применяемых для задач ТОиР». (Приказ №64-п от 25.05.2020).
18. Регламент Компании «Оперативный контроль и управление бюджетными лимитами (CAPEX)» («проект»).
19. Методические указания «Методика определения плановой и фактической стоимости жизненного цикла производственных активов» («проект»).
20. Методические указания Компании «Порядок определения и корректировки плановых сроков поставки заявляемой потребности в МТР» (Приложение №17 Приказ №81-п от 21.06.2018).
21. Регламент Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг». (Приказ 210-п от 31.12.2019).

22. Инструкция Компании «Составление технического задания на приобретение оборудования (МТР)» (Приказ №131-п от 11.10.2018).

23. Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения МТР» («проект»).

24. Инструкция по проведению входного контроля МТР в местах первичного поступления (Приказ №78-п от 04.07.2017).

25. Регламент Компании «Формирование, согласование и утверждение Технических заданий на приобретение МТР» (приказ №131-п от 11.10.2018).

26. Регламент Компании «Ведение плановых цен по МТР. Расценка работ и услуг» (проект).

27. Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения МТР» (проект).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию настоящего Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политике УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения настоящего Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками операций, описанных в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Регламента.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений*Таблица №32 «Список приложений»*

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Шаблоны документов

Справка о балансовой стоимости, нормативном и фактическом сроке службы оборудования

Справка о балансовой стоимости, нормативном и фактическом сроке службы оборудования по состоянию на _____

№ п/п	Наименование выбывающего оборудования	Инвентарный номер	Дата постановки на баланс	Балансовая стоимость оборудования, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Нормативный срок эксплуатации, мес.	Фактический срок эксплуатации, мес.	Начислено амортизации, тыс. руб.	Износ, %	Остаточная стоимость, тыс. руб.

Подпись, Ф.И.О. руководителя предприятия УО

Подпись, Ф.И.О. руководителя отдела по бухгалтерскому учету предприятия УО

Предложение по проекту ОВП (Инициатива ОВП)

Предложение по проекту ОВП		
1	Проект ОВП	Предлагаемое инициатором наименование проекта ОВП, позволяющее идентифицировать от других проектов ОВП
2	Инициатор проекта ОВП	ФИО, должность
3	Выбывающее оборудование	Полное наименование выбывающего оборудования в соответствии с БДО
4	Вид замены	Указывается вид замены: • замена по отказу • замена по целесообразности
5	Причина инициирования замены	Предпосылки и причины, которые свидетельствуют о необходимости и/или целесообразности реализации проекта ОВП, при необходимости даются ссылки на принятые по проекту решения и документы, являющиеся основанием для реализации. Все упомянутые в данном разделе документы (их копии) должны присутствовать в приложенном комплекте обосновывающих материалов.
6	Риск при отказе от замены	Описание риска при отказе от замены с оценкой вероятности наступления. Пример: «Высокая вероятность невыполнения подготовки горной массы к выемке. Снижение производственной программы по карьеру «Восточный» возможно на 0,5-1.0 млн. м ³ , что составляет до 1-2% от годового объема».
7	Срок замены	Ориентировочный срок (год и месяц) ввода нового оборудования
8	Дополнительная информация	При необходимости указываются пожелания к техническим и эксплуатационным характеристикам нового оборудования с обоснованием предложенных характеристик.
9	Согласование с Главным специалистом	Подпись и расшифровка
	Рекомендация от Главного специалиста	Рекомендации к характеристикам оборудования (при необходимости)
10	Согласование с Ответственным за эксплуатацию оборудования	Подпись и расшифровка
	Рекомендация от Ответственного за эксплуатацию оборудования	Рекомендации к характеристикам оборудования (при необходимости)

Акт осмотра технического состояния оборудования

г. _____

" ____ " _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

1. _____
2. _____
3. _____

произвела обследование технического состояния следующего оборудования:

находящегося по адресу: _____.

и составила настоящий акт осмотра технического состояния, о нижеследующем: _____

Заключение _____

Прилагаемые к акту документы: _____

Акт осмотра технического состояния оборудования составлен в 2-х экземплярах:

1. Первый экземпляр владельцу объекта _____.
2. Второй экземпляр председателю комиссии _____.

Подписи участников обследования технического состояния:

1. _____
2. _____
3. _____
