

Приложение №4**УТВЕРЖДЕНЫ**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ

**«Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание
производственных активов (с учетом капитализации затрат на ремонт основных
средств)»**

№ ПП-07 МУ-028 О УК версия 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение документа и область применения	3
2. Термины и сокращения.....	4
3. Основные положения.....	7
4. Бюджет поддержания производственных активов	12
5. Бюджет целевых программ	21
6. Контроль исполнения и отчетность бюджета воздействий на ПА.....	24
7. Нормативные ссылки	28
8. Библиография	28
9. Порядок внесения изменений	29
10. Контроль и ответственность за исполнение методических указаний	29
11. Список приложений.....	29

1. Назначение документа и область применения

Целью Методических указаний Компании «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов» (далее – Методические указания, МУ) является установление единых методологических подходов планирования бюджета воздействий на производственные активы (далее – ПА) на различных горизонтах (долгосрочный – 10 лет, среднесрочный – 3 года, годовой – 1 год), а также контроля и анализа исполнения бюджета воздействий на ПА.

Задачами МУ являются:

- установление общих требований к структуре бюджета воздействий на ПА;
- установление общих требований к формированию бюджета воздействий на ПА по каждому разделу/направлению бюджета;
- установление общих требований к контролю исполнения бюджета воздействий на ПА.

Требования МУ распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания.

МУ применяются для УК, УО в период использования интегрированной системой управления на базе SAP ERP (далее – Система).

Бизнес-процессы, при выполнении которых применяются МУ:

- ПП-07.02.01-ERP Долгосрочное планирование воздействий на ПА (мастер-план от 3-х до 10 лет);
- ПП-07.02.02-ERP Перспективное среднесрочное планирование воздействий на ПА (3-х летний период);
- ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на ПА;
- ПП-07.06.04-ERP Исполнение, корректировка и контроль бюджета воздействий на ПА.

Настоящие Методические указания связаны с бизнес-процессом «Управление производственными активами».

Настоящие Методические указания не подлежат передаче полностью или частично третьим лицам и не подлежат размещению в открытом доступе.

Настоящие Методические указания подлежат размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
SAP ERP, Система	Семейство программных продуктов компании SAP для автоматизации бизнес-процессов.
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия.
Аварийно-технический запас	Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта.
Актив (Производственный актив)	Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для Компании. К активам относятся горнодобывающие предприятия, входящие в состав Компании, и находящиеся на их балансе физические активы.
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части.
Восстановительная стоимость ОС	Сумма денежных средств, которая должна быть уплачена организацией на дату проведения переоценки, в случае необходимости замены какого-либо объекта.
Заказ ТОРО	Носитель затрат, который собирает нормативные и фактические затраты, возникшие в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования.
Капитальные затраты (вложения)	Инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию, капитализируемые ремонты действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.
Компания	Управляющая компания ООО «УК «Полюс» и Управляемые общества.
Контровка затрат	Отнесение затрат на определенный объект учета затрат (МВЗ, Заказ и т.д.).
Место возникновения затрат	Организационная единица в рамках контроллинговой единицы, представляющая четко ограниченное место, где возникают затраты.
Метод оценки на основе статистики	Метод, основанный на определении стоимости работ с использованием фактических затрат по ранее построенным или спроектированным объектам с использованием Базы данных о фактически реализованных проектах, формируемой в процессе реализации проектов.
Операционные затраты	Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части и расходные материалы.
Операция сетевого графика	Задача (пакет работ) в сетевом графике, которая имеет определенное начало и конец.
Отказ	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта. (ГОСТ 27.002-2015)

Термин	Определение
Проект ОВП	Мероприятие по приобретению оборудования вне проектов или замене изношенного оборудования без проектов капитального строительства, включая мероприятия по монтажу и демонтажу.
Проект поддержания производственных активов (проект ППА)	Совокупность мероприятий, направленных на восстановление действующих мощностей путем проведения планово-предупредительных ремонтов, ремонтов по состоянию, аварийно-восстановительных работ, замен и модернизации оборудования.
Ремонт	Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и по восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. (ГОСТ 18322-2016)
Сетевой график	Объединенная группа операций (работ) и материалов/оборудования. Операции сетевых графиков связываются между собой отношениями сроков и формируют календарно-сетевой график проекта, сетевые графики регистрируются в разрезе СПП-элементов. Детальные, плановые и фактические затраты отражаются на операциях сетевых графиков.
Стандарт Компании «Управление производственными активами»	Документ, устанавливающий, каким образом цели организации будут преобразованы в цели управления активами, подход к разработке планов управления активами и роль системы управления активами в обеспечении достижения целей управления активами.
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. (ГОСТ 18322-2016)
Управляющая компания (УК)	ООО «УК Полюс» – общество, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа в отношении Управляемых обществ
Управляемое общество (УО)	В рамках настоящих Методических указаний под управляемыми обществами принимаются: АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которого переданы Управляющей компании на основании действующего договора.
Целевая программа (ЦП)	Соответствующие единым целям и критериям объединённые в одну программу проекты. Целевые программы инициируются УК и реализуются на нескольких УО. Направлениями целевых программ являются (включая, но не ограничиваясь): • стандартизация и унификация; • снижение техногенных рисков; • повышение энергоэффективности; • приведение в соответствие экологическим стандартам и требованиям ОТиПБ.

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
CAPEX	Капитальные затраты
MCB	Maintenance Cost Budgeting
ОРЕХ	Операционные затраты
АТЗ	Аварийно-технический запас
БП и ТП	Блок производства и технической политики

Сокращение	Расшифровка
БФиС	Блок финансов и стратегий
ВПС	Вспомогательные производственные средства
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ГТК	Горно-транспортный комплекс
ЗИП	Запчасти, инструменты и принадлежности
ЗЧ	Запасная часть
КИП	Контрольно-измерительные приборы
КР	Капитальный ремонт
МВЗ	Место возникновения затрат
МОЛ	Материально ответственное лицо
МТР	Материально-технические ресурсы
МУ	Методические указания
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОС	Основное средство
ОСГ	Операция сетевого графика
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
ОФ	Оборотный фонд
ПА	Производственный актив
ПИР	Проектно-изыскательские работы
ПНР	Пуско-наладочные работы
ППА	Поддержание производственных активов
ПСД	Проектно-сметная документация
РБП	Расходы будущих периодов
РИД	Регламент управления инвестиционной деятельностью
РПМ	Регулярно-потребляемые материалы
СМР	Строительно-монтажные работы
СПП	Структурный план проекта
ТЗР	Транспортно-заготовительные расходы
ТКП	Технико-коммерческое предложение
ТО	Техническое обслуживание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТОП	Тотальная оптимизация производства
ТР	Текущий ремонт
УА	Управление производственными активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
УСО	Услуги сторонних организаций
ЦЗ	Центр затрат
ЦП	Целевая программа
ЦРММ	Центральная ремонтно-механическая мастерская
ЦФО	Центр финансовой ответственности
ЭПБ	Экспертиза промышленной безопасности

3. Основные положения

Деятельность по управлению бюджетом воздействий на ПА включает в себя:

- планирование затрат – процесс определения оптимального объема затрат на поддержание ПА для обеспечения требуемого уровня технического состояния и надежности, безопасности ПА при максимальной операционной эффективности активов;
- исполнение бюджета – процесс реализации мероприятий программы поддержания ПА;
- анализ исполнения бюджета воздействий на ПА – определение причин отклонений и доведение информации об исполнении бюджетов до заинтересованных лиц. Процесс включает сбор фактической информации об исполнении бюджета Компании и план-факт анализ;
- корректировку бюджета – уточнение и пересмотр запланированных объемов работ¹ (затрат) по результатам фактического выполнения работ.

Бюджет воздействий на ПА формируется в следующих горизонтах планирования:

- Долгосрочный бюджет воздействий на ПА (10 лет) – укрупненный план операционных и капитальных затрат на поддержание ПА, в стоимостном выражении на период до 10 лет. Долгосрочный бюджет воздействий на ПА является инструментом формирования потребностей в воздействиях на ПА, цель которого обеспечить исполнение стратегических планов Компании в рамках жизненного цикла активов с соблюдением требуемого уровня надежности и безопасности, а также обеспечить максимальную эффективность ПА.
- Среднесрочный бюджет воздействий на ПА (3 года) – уточненный план операционных и капитальных затрат первых трех лет долгосрочного бюджета воздействий на ПА с описанием воздействий на ПА (мероприятия ТОиР, обследования и диагностики, ЭПБ) и конкретных проектов (инициатив) ОВП и проектов ЦП в стоимостном выражении.
- Годовой бюджет воздействий на ПА – детальный план операционных и капитальных затрат на первый год планирования в рамках среднесрочного бюджета воздействий на ПА с описанием воздействий на ПА (мероприятия ТОиР, обследования и диагностики, ЭПБ), сформированных по заказам ТОРО и операциям сетевых графиков в системе SAP S/4HANA, и конкретных этапов

¹ Корректировка состава и объема работ производится в соответствии с Методическими указаниями Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

реализации проектов ЦП и проектов ОВП в стоимостном выражении.

Планирование бюджета воздействий на ПА осуществляется в следующей последовательности²:

- формирование долгосрочного бюджета воздействий на ПА;
- формирование среднесрочного бюджета воздействий на ПА;
- формирование годового бюджета воздействий на ПА;
- согласование бюджета воздействий на ПА на всех горизонтах планирования (одновременно);
- утверждение бюджета воздействий на ПА на всех горизонтах планирования (одновременно).

Порядок и сроки планирования бюджета воздействий на ПА устанавливаются распоряжением старшего вице-президента по операционной деятельности УК о начале подготовки к бюджетному планированию функциональных блоков операционной деятельности. Распоряжение доводится до Управляющих директоров УО через СЭД. На основании распоряжения управляющие директора организуют выпуск приказа по УО. Ключевые сроки завершения формирования бюджета воздействий на ПА и защиты на Бюджетном комитете определяются приказом Генерального директора УК в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование».

МУ не рассматривают проекты, реализуемые в соответствии с Регламентом Компании «Управление инвестиционной деятельностью» либо Регламентом Компании «Программа ТОП (Тотальная оптимизация производства)». Проекты, инвестиционные заявки которых отклонены из-за несоответствия критериям РИД, могут быть включены в бюджет воздействий на ПА в случае возможности финансового обеспечения и согласования с Техническим комитетом УК.

В рамках подготовки к планированию бюджета на основании стратегии Компании и Стандарта Компании «Управление производственными активами» ежегодно устанавливается соотношение операционных и капитальных затрат (например, 60% и 40% соответственно).

Планирование и контроль реализации проектов, включённых в титул бюджета, осуществляется в разрезе освоения и финансирования. По капитализируемым проектам дополнительно осуществляется планирование и контроль показателя ввода объекта в эксплуатацию.

² Бюджет воздействий на ПА формируется на основе запланированных воздействий на ПА. Планирование воздействий на ПА осуществляется в соответствии с Методическими указаниями Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика».

В Системе формируются следующие виды бюджета воздействий на ПА:


- Плановый бюджет – бюджет планируемых затрат всех видов воздействий в годовом, среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования. Формируется в соответствии с разделами 4 и 5.
- Фактический бюджет – бюджет, отражающий фактически понесенные затраты годового бюджета по результатам отчетного периода (месяц, квартал, год). Формируется в соответствии с разделом 6.1.
- Прогнозный бюджет – бюджет, включающий в себя фактически понесенные затраты за рассматриваемый отчетный период (квартал) и плановый прогноз исполнения до конца текущего года с учетом корректировок.

Бюджет воздействий на ПА в Системе формируется по СПП-элементам снизу-вверх. Нижний уровень СПП-элементов консолидирует затраты по заказам ТОРО, производственным заказам (в части затрат на МТР для производства изделий собственными силами) и ОСГ с детализацией по видам затрат. Высший уровень СПП-элемента консолидирует затраты по СПП-элементам нижнего уровня. Детальный порядок структурирования СПП-элементов приведен в разделах 4 и 5.

По всем капитализируемым проектам и ремонтам, реализуемым в рамках бюджета воздействий на ПА, в Системе присваивается категория капитальных вложений.

Бюджет воздействий на ПА включает в себя бюджет ППА и бюджет ЦП. Бюджет воздействий на ПА включает затраты, запланированные на заказах ТОРО и ОСГ (за исключением затрат на ФОТ и ТЗР) (Рисунок №1). Сопоставление видов затрат ТОРО с видами затрат Контроллинга представлено в Приложении №2.

Рисунок №1 «Схема включения затрат в бюджет воздействий на ПА»

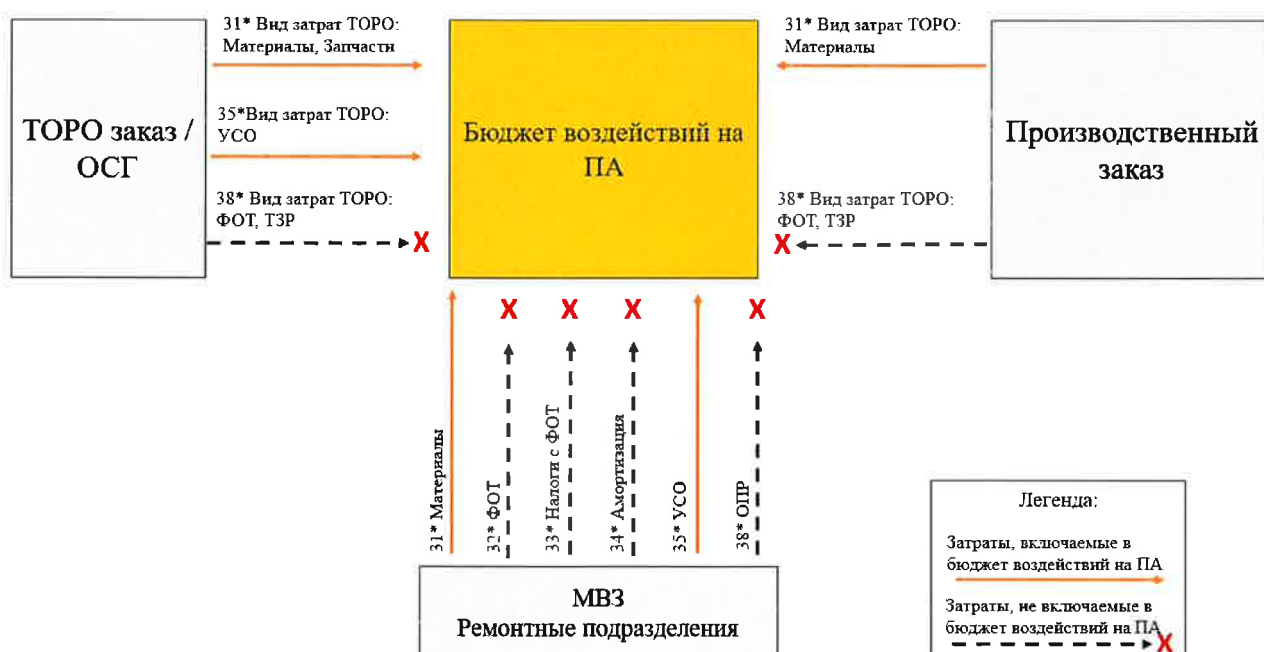

Бюджет ППА

Бюджет ППА направлен на обеспечение работоспособного состояния ПА Компании путём проведения замены оборудования, планово-предупредительных работ, ремонтов по состоянию и аварийно-восстановительных работ. В соответствии с требованиями Стандарта Компании «Управление производственными активами» бюджет ППА направлен на обеспечение максимальной эффективности ПА при соблюдении оптимального баланса между производительностью, затратами и рисками, связанными с ПА.

Бюджет ППА включает в себя следующие разделы:

- Раздел 1 «Проекты производственного ОВП 1 группы». В раздел входят проекты ОВП следующих типов: проекты эксплуатационной службы, проекты ремонтной службы. Формирование проектов 1 раздела осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)». Проекты 1 раздела подлежат капитализации. Проекты первого раздела формируются на ОСГ.
- Раздел 2 «Работы по регламенту и по техническому состоянию». В раздел входят проекты ППА, включающие в себя ремонты, запланированные на основе технического состояния оборудования, планово-предупредительные ремонты (в т.ч. остановочные ремонты, ТО), периодические и другие обязательные работы, в том числе диагностическое обследование, техническое освидетельствование ГПМ и ЭПБ (продление срока службы ПА), а также затраты на обеспечение компонентами и поддержание неснижаемого уровня РПМ. Проекты 2 раздела могут капитализироваться при соответствии критериям капитализации в соответствии с «Унифицированной учетной политикой для целей бухгалтерского учета». Проекты 2 раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.
- Раздел 3 «Резерв». Проекты, входящие в 3 раздел, создаются для каждого УО. В проектах 3 раздела формируется сумма резерва, возникающая в результате возникновения экономии бюджета, с разделением по капитализируемым и не капитализируемым затратам. Сумма резерва в дальнейшем может быть распределена по другим разделам бюджета ППА, в рамках OPEX или CAPEX.
- Раздел 4 «Прочие работы и потребности». В раздел входят проекты ППА, не связанные с производством непосредственно. К данному разделу относятся мероприятия по КИП и метрологии, а также затраты на прочие работы. Проекты 4 раздела могут капитализироваться при соответствии критериям капитализации в соответствии с «Унифицированной учетной политикой для целей бухгалтерского учета». Проекты 4 раздела формируются по заказам ТОРО и на ОСГ.

Бюджет ЦП³

Бюджет ЦП является инструментом БП и ТП УК в рамках развития ремонтных мощностей и унификации ПА с целью технического совершенствования, повышения стабильности работы и надежности ПА, внедрения новых технологий, не влияющих на увеличение производственной мощности.

Бюджет ЦП включает в себя перечень проектов с группировкой по признакам принадлежности к ЦП (например, «экологическая безопасность», «энергоэффективность» и т.д.). В бюджет ЦП входят проекты, соответствующие целям и критериям формирования ЦП, но не удовлетворяющие критериям Регламента Компании «Управление инвестиционной деятельностью» или Регламента Компании «Программа ТОП (Тотальная оптимизация производства)».

С целью приоритизации затрат и других ресурсов (МТР, персонал, ВПС), необходимых для реализации проектов, проводится их ранжирование. Ранжирование проектов и перераспределение выделенных средств на реализацию проектов между разными бюджетами ЦП или ППА недопустимо. При возникновении нераспределенных средств (экономия и возможный профицит бюджета) перераспределение в рамках одного бюджета (ППА или ЦП) происходит следующим образом:

- при реализации бюджета ППА средства аккумулируются на СПП-элементах «Резерв OPEX» и «Резерв CAPEX». Решение об использовании средств принимает Технический комитет УО;
- при реализации бюджета ЦП средства аккумулируются на СПП-элементе «Резерв ЦП». Резерв ЦП формируется по каждой ЦП отдельно. Решение об использовании средств принимает владелец ЦП.

Все корректировки бюджета ППА или бюджета ЦП без увеличения лимита проводятся за счёт перераспределения средств через резерв.

³ Планирование целевых программ в Системе осуществляется после реализации соответствующего функционала в рамках развития. В данных МУ описан целевой процесс управления целевыми программами.

4. Бюджет поддержания производственных активов

4.1. Общие требования к формированию бюджета ППА

В соответствии с разделом 3 бюджет ППА включает в себя следующие разделы:

- Раздел 1 «Проекты производственного ОВП 1 группы».
- Раздел 2 «Работы по регламенту и техническому состоянию».
- Раздел 3 «Резерв».
- Раздел 4 «Прочие работы и потребности».

Оценка стоимости проектов по каждому разделу производится в соответствии с разделом 4.2.

Управление затратами и сроками по мероприятиям поддержания ПА осуществляется по проектам ППА. Отдельные проекты ППА соответствуют элементам структурного плана проекта (СПП-элементам) бюджета ППА.

Структурный план проекта (СПП) представляет собой модель проекта, операции которого представлены в иерархическом виде. СПП-элементы описывают конкретную задачу проекта, которая должна быть выполнена в рамках предусмотренного периода времени. Каждый отдельный СПП-элемент может выполнять роль объекта контроля с возможностью планирования и отслеживания затрат, лимитов и сроков.

Каждый проект ППА должен отвечать следующим требованиям:

- определены конкретные цели, которые должны быть достигнуты;
- определены сроки реализации, контрольные точки и бюджет проекта;
- определён ответственный руководитель проекта, который отвечает за достижение целей;
- проект не соответствует критериям ранжирования инвестиционных проектов или мероприятий ТОП.

Критериями выделения проекта ППА являются:

- привязка работ к одному объекту ПА или группе однотипных ПА;
- измеримость конечного результата (количественные и качественные показатели результата проекта, установленные в ходе его планирования и реализации);
- границами проекта выступает структурная единица УО, в отношении которой ведётся планирование и учёт затрат (ЦЗ/ЦФО)⁴;
- однотипные мероприятия по ремонту нескольких ЕО одного вида могут быть

⁴ Пример:

- ЦЗ Карьер Взрывание (Механика)

сгруппированы в один проект по территориальному или производственному признаку;

- один проект может принадлежать только одному ЦФО, в свою очередь, затраты по одному ЦФО могут относиться к нескольким ЦЗ.

При создании структуры СПП соблюдаются следующие правила⁵:

- Для 1 раздела бюджета ППА:
 - СПП-элемент 1-го уровня создается в соответствии с проектом из КСУ НСИ и служит для агрегирования данных по проекту.
 - СПП-элемент 2-го уровня создается по объекту лимитирования ТОТС в АСКИ в разрезе месторождений. СПП-элемент создается на конкретный год. Не допускается создание одного СПП-элемента на несколько лет.
 - СПП-элемент 3-го уровня создается в рамках одного МВЗ.
 - СПП-элемент 4-го уровня соответствует наименованию приобретаемого оборудования в соответствии с заявкой на ОВП.
- Для остальных разделов бюджета ППА:
 - СПП-элемент 1-го уровня создается в соответствии с критериями выделения проекта ППА в разрезе ОПЕХ и САРЕХ. СПП-элемент создается на конкретный год. Не допускается создание одного СПП-элемента на несколько лет.
 - СПП-элементы 2-го уровня создаются только для САРЕХ и представляют собой разделение на капитализируемый ремонт (в разрезе месторождения) и закупку компонентов.

Пример структуры СПП-элементов приведен в Таблице №1.

⁵ При необходимости могут быть созданы дополнительные уровни СПП-элементов (например, с целью разделения работ по ППР и работ по техническому состоянию).

Таблица №1 «Пример структуры СПП-элементов»

Типовая структура	Пример
1 раздел «Производственное ОВП 1 группы»	
Определение проекта – Проект из КСУ НСИ ❖ 1 ур. СПП-элемент – Проект из КСУ НСИ ➤ 2 ур. СПП-элемент – Объект лимитирования ТОТС из АСКИ ▪ 3 ур. СПП-элемент – Группировка по МВЗ • 4 ур. СПП-элемент – Оборудование	Определение проекта – ОВП 1 группы ПА Красноярск ❖ 1 ур. СПП-элемент – ОВП 1 группа ПА Красноярск ➤ 2 ур. СПП-элемент – ТС. ОВП 1 группа ПА Красноярск 2021 ▪ 3 ур. СПП-элемент – ЦТТ. Парк больших бульдозеров • 4 ур. СПП-элемент – Бульдозер гусеничный D375A-6, Komatsu
2 раздел «Работы по регламенту и техническому состоянию»	
Определение проекта – Группировка по ЦЗ/ЦФО ❖ 1 ур. СПП-элемент – Группировка по ЦЗ/ЦФО и типу затрат ➤ 2 ур. СПП-элемент (для CAPEX) – Капитализируемый ремонт / Закупка компонента	Определение проекта – Группировка по ЦЗ/ЦФО ❖ 1 ур. СПП-элемент – ЦЗ Бурение (механика CAPEX) ➤ 2 ур. СПП-элемент – ЦЗ Бурение (механика, капитализируемый ремонт) ➤ 2 ур. СПП-элемент – ЦЗ Бурение (механика, закупка компонента) ❖ 1 ур. СПП-элемент – ЦЗ Бурение (механика OPEX)
3 раздел «Резерв»	
Определение проекта – Резерв ❖ 1 ур. СПП-элемент – Резерв OPEX ❖ 1 ур. СПП-элемент – Резерв CAPEX	Определение проекта – Резерв ❖ 1 ур. СПП-элемент – Резерв OPEX ❖ 1 ур. СПП-элемент – Резерв CAPEX
4 раздел «Прочие работы и потребности»	
Определение проекта – Группировка по ЦЗ/ЦФО ❖ 1 ур. СПП-элемент – Группировка по ЦЗ/ЦФО и типу затрат ➤ 2 ур. СПП-элемент (для CAPEX) – Капитализируемый ремонт / Закупка компонента	Определение проекта – АСУТП ❖ 1 ур. СПП-элемент – АСУТП (CAPEX) ❖ 1 ур. СПП-элемент – АСУТП (OPEX) Определение проекта – Прочие (энергетика) ❖ 1 ур. СПП-элемент – Прочие (энергетика CAPEX) ➤ 2 ур. СПП-элемент – Прочие (энергетика, капитализируемый ремонт) ➤ 2 ур. СПП-элемент – Прочие (энергетика, закупка компонента) ❖ 1 ур. СПП-элемент – Прочие (энергетика OPEX)

Ранжирование проектов ППА производится независимо по разделам бюджета в соответствии с разделом 4.4.3 Методических указаний Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика»:

- проекты 1 раздела бюджета ППА ранжируются между собой в рамках раздела бюджета ППА;
- проекты ППА 2 и 4 разделов бюджета ППА между собой не ранжируются. Ранжируются заказы ТОРО и сетевые графики в рамках одного проекта ППА (СПП-элемента). Ранжированию не подлежат заказы ТОРО на регламентные работы (запланированные по нормативу ППР);
- проекты 3 раздела бюджета ППА не ранжируются.

Долгосрочный бюджет ППА формируется в соответствии со структурой СПП-элементов на основе:

- Политики Компании «Управление производственными активами» / Стандарта Компании «Управление производственными активами»;
- целевых программ, содержащих требования по вводу/замене оборудования;
- программы капитального строительства;
- долгосрочного плана воздействий на ПА;
- типовых ремонтных циклов;
- плана по операционным затратам в части ТОиР из модели оценки проектов по вводу нового оборудования;
- имеющейся статистики проведения вручную запланированных воздействий на ПА за прошлые годы;
- нормативного срока службы/паркового ресурса/нормативного пробега.

Долгосрочный бюджет ППА формируется путем моделирования в SAP MCB мероприятий ТОиР и замене ПА в соответствии с разделом 4.2 Методических указаний «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика» и оценки их стоимости, а также включения объема затрат на основании статистики по работам, выполняемым не по нормативу.

На долгосрочном горизонте планирования допускается погрешность в расчетах стоимости мероприятий до 30%.

Среднесрочный бюджет ППА формируется в соответствии со структурой СПП-элементов на основе:

- сформированного долгосрочного бюджета ППА;
- среднесрочного бюджета ППА, утвержденного в рамках прошлой бюджетной кампании;
- среднесрочного плана воздействий на ПА;
- утвержденного графика проектов ОВП;
- типовых ремонтных циклов;
- плана по операционным затратам в части ТОиР из модели оценки проектов по вводу нового оборудования;
- имеющейся статистики проведения вручную запланированных воздействий на ПА за прошлые годы;
- нормативного срока службы/паркового ресурса/нормативного пробега.

Среднесрочный бюджет ППА формируется путем моделирования в SAP MCB мероприятий ТОиР в соответствии с разделом 4.3 Методических указаний Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ

по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика» и оценки их стоимости, а также включения проекта ОВП на основании сетевых графиков и включения объема затрат на основании статистики по работам, выполняемым не по нормативу.

Первый плановый год среднесрочного бюджета ППА актуализируется после формирования годового бюджета ППА.

На среднесрочном горизонте планирования допускается погрешность в расчетах стоимости мероприятий до 20%.

Годовой бюджет ППА формируется в Системе на основе заказов ТОРО и операций сетевых графиков, которые присвоены к СПП-элементам последнего уровня в соответствии с разделом 4.4 Методических указаний Компании «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика». При формировании годового бюджета в SAP MCB осуществляется агрегация стоимости заказов ТОРО и операций сетевых графиков с группировкой по СПП-элементам.

В рамках формирования бюджета ППА ежегодно вне Системы производится расчет ориентиров по затратам на ППА на первый и второй год планирования на основе планов производства в разрезе переделов продукции с учетом нормативов по удельным ремонтным затратам на единицу продукции. Детальный расчет ориентиров производится в соответствии с установленным в Компании порядком формирования бюджетных ориентиров на ТОиР. Ориентиры на первый и второй год должны пересчитываться ежегодно в рамках формирования бюджета. Долгосрочный бюджет ППА не лимитируется. Рассчитанные ориентиры заносятся в SAP MCB и доводятся до УО в срок, установленный распоряжением старшего вице-президента по операционной деятельности УК.

4.2. Планирование стоимости проектов бюджета поддержания ПА

4.2.1. Планирование проектов ОВП

На долгосрочном горизонте планирования бюджета ППА планирование стоимости проектов производится без создания сетевых графиков по следующему алгоритму:

- определение потребности в проектах ОВП на основе долгосрочного плана воздействий на ПА;
- определение стоимости проектов ОВП одним из следующих способов:
 - на основании статистических данных по стоимости проектов ОВП (фактические ведомости объемов работ, сформированные по результатам реализации проектов ОВП с идентичными ПА, схожими условиями эксплуатации и техническими местами) и приведение в цены текущего года с помощью макропараметров;

- на основании восстановительной стоимости ОС (если в рамках проекта ОВП планируется замена на аналогичное оборудование);
 - на основе анализа рынка и экспертной оценки (в случае отсутствия статистических данных и восстановительной стоимости ОС);
 - на основании результатов закупочных процедур (запрос ТКП);
 - на основании укрупненного сметного расчета (при необходимости).
- индексация стоимости проектов ОВП на последующие годы с помощью макропараметров.

На среднесрочном и годовом горизонте планирования бюджета ППА стоимость проектов ОВП включается в бюджет согласно сетевым графикам по результатам согласования заявки на ОВП на Техническом комитете УО и принятия решения о включении проекта ОВП в годовой или среднесрочный бюджет ППА. После согласования заявки на ОВП на Техническом комитете УО в системе SAP создается структура СПП-элементов на данный проект. Формирование и согласование заявки на ОВП Техническим комитетом УО и создание структуры СПП-элементов осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».

4.2.2. Планирование затрат на работы по регламенту и по техническому состоянию

Планирование затрат на среднесрочном и долгосрочном горизонте производится в Системе:

- для работ по ППР:
 - путем моделирования в SAP MCB одним из следующих методов: «Расчет средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей» или «Расчет на основании технологических карт». Детальное описание методов представлено в Приложении 3 настоящих Методических указаний.
 - на основе плана по операционным затратам в части ТОиР (вне системы) из модели оценки проектов по вводу нового оборудования (при отсутствии данных для моделирования) по следующему алгоритму:
 - на основании сформированной Бюджетной модели проекта в соответствии с Регламентом Компании «Планирование и контроль бюджета инвестиционного проекта капитального строительства» определяются плановый год ввода нового оборудования и объемы операционных затрат в части ТОиР на каждый год эксплуатации оборудования;
 - полученные объемы операционных затрат в части ТОиР заносятся вручную на соответствующие СПП-элементы укрупненно на каждый год, охватываемый границами бюджета;
 - при отсутствии типовых данных для моделирования и операционных затрат в части ТОиР в Бюджетной модели проекта на каждый год закладывается сумма на ТОиР в размере 2% от стоимости проекта по вводу нового оборудования

(доля может быть изменена по решению Технического комитета УО);

- для работ, выполняемых не по нормативу:
 - на основании имеющейся статистики проведения вручную запланированных воздействий на ПА за прошлые годы по следующему алгоритму:
 - по историческим заказам ТОРО в системе SAP формируется выборка работ ТОиР, запланированных вручную (например, ТОиР по техническому состоянию дробилки Lokotrack LT140E);
 - на основании полученной выборки рассчитывается среднегодовая стоимость вручную запланированных воздействий на ПА за прошедшие 3 года;
 - полученное значение индексируется на прогнозные годы с помощью макропараметров и заносится на соответствующий СПП-элемент;
 - в случае отсутствия статистики оценка стоимости работ производится экспертно.

Прогнозные затраты на ЭПБ (в том числе мероприятия по подготовке ПА к проведению ЭПБ и к эксплуатации после проведения ЭПБ) в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования определяются в соответствии с графиком проведения ЭПБ, по результатам текущего заключения ЭПБ, а также на основе требований законодательства и нормативно-технической документации. Расчет прогнозных затрат на ЭПБ производится только при наличии данных о следующей дате проведения ЭПБ следующим образом:

- определяются затраты на ЭПБ в текущих ценах в соответствии с «Методикой определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности»;
- определяются затраты на мероприятия по подготовке ПА к проведению ЭПБ и к эксплуатации ПА после проведения ЭПБ на основании статистических данных с последующим приведением стоимости в текущие цены на основании макропараметров, установленных Компанией;
- затраты, определенные в предыдущих пунктах, суммируются и приводятся на прогнозный год с помощью макропараметров, установленных Компанией.

Планирование затрат на ТОиР на планируемый год производится на основе заказов ТОРО, сформированных в системе SAP S/4HANA:

- для работ, выполняемых хозяйственным способом стоимость определяется в соответствии с п. 4.2.2.1.
- для работ, выполняемых подрядным способом стоимость определяется в соответствии с п. 4.2.2.2.

В случае, если воздействие проводится по договору сервисного обслуживания, стоимость воздействия определяется на основании действующего договора. Если срок

действия договора заканчивается на планируемый год, то стоимость определяется путем индексирования суммы с договора текущего года с помощью установленных в Компании макропараметров.

4.2.2.1. Планирование затрат на выполнение работ хозяйственным способом

Плановые затраты заказа ТОРО/ ОСГ на выполнение работ хозяйственным способом включают в себя стоимость трудозатрат ремонтного персонала и стоимость МТР. Стоимость трудозатрат ремонтного персонала рассчитывается, но не включается в бюджет ППА.

Для планирования затрат на выполнение работ хозяйственным способом в сформированном заказе ТОРО/ ОСГ должны быть определены исполнитель работ, трудоемкость и плановое потребление МТР (при этом в стоимость работ не планируются МТР, включенные в перечень РПМ).

Плановые затраты заказа ТОРО/ ОСГ определяются посредством калькуляции на основании плановых тарифов (для трудозатрат) и плановых цен (для МТР).

4.2.2.2. Планирование затрат на выполнение работ подрядным способом

Плановые затраты заказа ТОРО/ ОСГ на выполнение работ подрядным способом определяются одним из следующих способов:

- осмечивание дефектных ведомостей, которое может проводиться сметным отделом в соответствии с действующим в Компании порядком формирования стоимости ТОиР либо сторонней организацией (с последующей проверкой со стороны заказчика);
- на основании ТКП, сформированным по дефектным ведомостям или ТЗ на проектирования (для ПИР);
- на основании договора (при наличии действующего договора на сервис по абонентской плате или договора с тарифами на услуги подрядной организации);
- калькуляция заказа ТОРО/ ОСГ (при наличии в Системе плановых тарифов на работы подрядной организации);
- по основании категорийной стратегии.

Для планирования затрат на выполнение работ подрядным способом в заказе ТОРО/ ОСГ должен быть определен способ выполнения операции – подрядный (услуга). В систему вводятся плановые стоимости услуг, которые также включают стоимости МТР.

Скан образцы сметных расчетов и других необходимых документов, обосновывающих стоимость услуги, должны быть прикреплены к соответствующим заказам ТОРО либо СПП-элементам соответствующего проекта.

4.2.3. Планирование резерва бюджета ППА

Резерв бюджета ППА формируется на уровнях УО и УК отдельно и включает в себя.

- резерв OPEX;
- резерв CAPEX.

Резерв бюджета ППА УО на этапе планирования формируется с нулевой стоимостью. Резерв пополняется за счет экономии бюджета (на СПП-элементах других разделов бюджета ППА) в рамках исполнения. Решение об использовании средств из резерва принимает Технический комитет УО с уведомлением Технического директора УК.

Резерв бюджета ППА УК планируется только на следующий год при условии наличия протокольного решения о формировании резерва УК в функциональном блоке БП и ТП. Принятие решения о формировании резерва УК осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование». Решение об использовании средств из резерва принимает Вице-президент БП и ТП УК.

4.2.4. Планирование затрат на прочие работы и потребности

Планирование затрат на прочие работы и потребности на среднесрочном и долгосрочном горизонтах производится путём перемножения соответствующих затрат утвержденного (текущего) годового бюджета на макропараметры, установленные Компанией.

На годовом горизонте планирование затрат на мероприятия по КИП и метрологии и прочие воздействия, производится на заказах ТОРО или ОСГ, сформированных в системе SAP S/4HANA. Оценка стоимости заказа ТОРО производится аналогично п. 4.2.2.1-4.2.2.2.

Объем затрат на обеспечение компонентом планируется на СПП-элементе «Закупка компонента». Объем затрат определяется на основании потребностей в компоненте и плановых цен. Потребность в компоненте планируется на ОСГ в соответствии с Методическими указаниями «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика».

5. Бюджет целевых программ⁶

5.1. Общие требования к формированию бюджета ЦП

Целевая программа – соответствующие единым целям и критериям объединенные в одну программу проекты, реализуемые на нескольких УО. Направлениями ЦП являются (включая, но не ограничиваясь):

- стандартизация и унификация;
- энергоэффективность;
- промышленная, пожарная безопасность и охрана труда;
- экология.

Целью формирования ЦП является приведение ПА к требованиям, нормам и правилам законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов, а также обеспечение унификации ПА и внедрения в практику Компании передовых технических решений в области управления ПА.

Целевые программы декомпозируются на уровне УО на целевые программы УО (далее – ЦП УО). Формирование и утверждение целевой программы на уровне УК и УО осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Управление целевыми программами».

ЦП УО декомпозируются на проекты ЦП УО. Проекты ЦП УО – конкретные мероприятия, соответствующие критериям включения в состав ЦП и реализуемые в рамках одного УО. Каждый проект ЦП должен отвечать следующим требованиям:

- соответствие проекта критериям формирования ЦП. Критерии включения проектов в состав ЦП формируются для каждой ЦП в индивидуальном порядке и зависят от ее назначения;
- определены конкретные цели, которые должны быть достигнуты;
- определены сроки реализации, контрольные точки и бюджет проекта;
- определен ответственный руководитель проекта, который отвечает за достижение целей;
- проект не соответствует критериям ранжирования инвестиционных проектов или мероприятий ТОП.

Один проект ЦП может принадлежать только одному ЦФО, в свою очередь, затраты по одному ЦФО могут относиться к нескольким МВЗ.

Проекты бюджета ЦП формируются на ОСГ проекта.

⁶ Планирование целевых программ в Системе осуществляется после реализации соответствующего функционала в рамках развития. В данных МУ описан целевой процесс управления целевыми программами.

Для каждого проекта ЦП УО формируется отдельный бюджет. Бюджет ЦП УО представляет собой агрегированные бюджеты проектов ЦП, входящих в состав ЦП УО.

Ранжирование проектов ЦП производится в Системе в рамках одной ЦП, к которой относится проект. Ранжирование между разными ЦП не допускается. Критерии ранжирования проектов по ЦП зависят от типа ЦП. Решение о критериях ранжирования, переносе или корректировке стоимости проекта ЦП принимает владелец ЦП.

Планирование и контроль затрат проектов ЦП производится в системе SAP ERP с использованием СПП-элементов.

При создании структуры СПП соблюдаются следующие правила:

- СПП-элемент 1-го уровня создается в соответствии с проектом и служит для агрегирования данных по проекту. СПП-элемент создается на конкретный год. Не допускается создание одного СПП-элемента на несколько лет;
- СПП-элементы 2-го уровня включают в себя этапы реализации соответствующего проекта ЦП.

Структура СПП-элементов приведена в Таблице №2.

Таблица №2 «Структура СПП-элементов»

Типовая структура	Пример структуры
❖ СПП-элемент – Проект (ЦП №) ➤ СПП-элемент – Этапы проекта	❖ СПП-элемент – Проект по модернизации газоочистных установок (ЦП 1) ➤ СПП-элемент – ПИР

5.2. Планирование проектов бюджета целевых программ

Планирование проектов ЦП осуществляется на период реализации ЦП. В зависимости от горизонта планирования проекты ЦП планируются в следующей детализации:

- долгосрочный горизонт – планирование проекта единым титулом;
- среднесрочный горизонт – планирование проекта с детализацией до стадий реализации проекта (ПИР, СМР, ПНР);
- годовой горизонт – планирование этапа проекта, на котором будет находиться проект в планируемый год: разработка ПСД (проведение ПИР), проведение СМР или ПНР, с детализацией до конкретных операций.

Стоимость реализации проекта ЦП на долгосрочном горизонте определяется на основе ТКП и экспертной оценки.

Стоимость реализации ПИР на среднесрочном горизонте определяется на основе ТКП. Стоимость проведения СМР и ПНР оценивается экспертно, также допускается укрупненная оценка (например, силами проектной организации).

На годовом горизонте осуществляется планирование затрат на реализацию этапа проекта, на котором проект будет находиться в планируемом году. Стоимость реализации ПИР определяется на основании смет на ПИР или ТКП (в том числе по результатам проведенных процедур в соответствии с Регламентом Компании «Ведение плановых цен», а также в соответствии с Регламентом Компании «Выполнение закупки»). Стоимость проведения СМР и ПНР уточняется из среднесрочного бюджета ЦП по результатам разработки ПСД (проведения ПИР).

Проекты, требующие подготовки ПСД, утверждаются в два этапа:

- Этап подготовки проектов (реализации ПИР / подготовка ПСД). На данном этапе утверждается бюджет, сроки реализации ПИР / подготовки ПСД (бюджеты последующих этапов проекта приводятся оценочно силами управления по капитальному строительству).
- Этап реализации проектов (СМР и ПНР). В рамках этапа утверждается бюджет проекта, распределение освоения, финансирования по месяцам, сроки реализации последующих этапов проекта.

Реализация последующих этапов проекта не может быть включена в годовой бюджет ЦП при отсутствии разработанной ПСД. Обоснованным исключением являются работы, выполняемые «под ключ», по согласованию с Техническим комитетом УК. По результатам разработки ПСД реализация дальнейших этапов проекта может быть инициирована в том же году в рамках процедуры плановой корректировки, при условии, что в последующий период закладывался этап реализации данного проекта, либо на следующий год в рамках процедуры годового планирования.

В ходе уточнения этапов реализации проекта (СМР и ПНР) после подготовки ПСД (проведения ПИР), проект может не соответствовать критериям включения в целевую программу. В этом случае вне Системы формируется инвестиционная заявка, а проект реализуется в соответствии с РИД.

Проекты, подходящие по критериям для включения в ЦП, но не вошедшие в программу планируемого периода по приоритету реализации или финансирования, должны быть учтены на этапе следующего цикла планирования.

Более детальный порядок формирования и утверждения бюджета ЦП УО представлен в Регламенте Компании «Управление целевыми программами».

По результатам формирования бюджета ЦП по всем УО, которые были включены в ЦП, может быть сформирован резерв ЦП на уровне УК по согласованию с БФиС в соответствии с Регламентом Компании «Бюджетное планирование».

6. Контроль исполнения и отчетность бюджета воздействий на ПА

6.1. Анализ фактической реализации бюджета поддержания ПА и целевых программ⁷

Расчет фактических затрат по бюджетам ППА и ЦП производится в системе SAP ERP:

- по результатам месяца;
- по результатам квартала (используется в том числе для планирования следующего финансового года);
- в ходе закрытия финансового года.

Анализ фактических затрат осуществляется по проектам ППА, реализуемым по заказам ТОРО (после технического и коммерческого закрытия заказа ТОРО) или на ОСГ, а также по проектам ЦП, реализуемых на ОСГ.

Техническое закрытие заказа ТОРО – подтверждение ответственным специалистом заказчика в системе факта приемки работ. Тем самым подтверждается факт выполнения объемов работ, трудозатрат, стоимость работ и количество использованных МТР. После расчета фактических затрат заказов ТОРО, при необходимости, в системе формируется отчет в разрезе плановых и фактических затрат заказов ТОРО.

Коммерческое закрытие заказов ТОРО осуществляется ответственным сотрудником бухгалтерии после того как фактические затраты заказа ТОРО рассчитаны и распределены на объекты контроллинга (МВЗ), заказ технически закрыт (все работы ТОРО выполнены). После коммерческого закрытия заказа ТОРО все проводки по ним запрещаются.

Факт по каждому виду затрат определяется в системе SAP ERP проведенными за истекший период бухгалтерскими проводками с континировкой затрат на соответствующие заказы ТОРО, либо СПП-элементы проектов.

В рамках анализа факта по бюджету освоения учитываются бухгалтерские проводки в соответствии с «Унифицированной учетной политикой для целей бухгалтерского учета для компаний группы Полюс». Ниже приведены примеры бухгалтерских проводок (с подтверждением первичными документами):

- в части затрат на МТР – проводки списания МТР со склада подрядчика либо со склада МОЛ на заказ ТОРО либо на ОСГ проекта;
- в части затрат на услуги подрядных организаций – проводки затрат по оказанным услугам в объемах, подтвержденных актами выполненных работ на заказ ТОРО либо ОСГ проекта;

⁷ Анализ фактической реализации целевых программ в Системе осуществляется после реализации соответствующего функционала в рамках развития. В данных МУ описан целевой процесс управления целевыми программами.

- в части затрат на услуги собственных подразделений – проводки фактических затрат на заказ ТОРО либо на ОСГ проекта;
- в части затрат на капитализируемые ремонты – проводки фактических затрат на карточку РБП;
- в части затрат на закупку компонентов – проводки оприходования основных средств.

На основании данных о фактических и плановых затратах по проекту за истекший период, в системе SAP ERP формируется план-факт аналитика в разрезе любого из СПП-элементов (с детализацией по видам затрат) с целью анализа данных по превышению плановых значений по затратам.

В случае формирования профицита на проектах ППА по закрытым заказам ТОРО или ОСГ, по закрытию отчетного периода (месяц) сэкономленные денежные средства со всех СПП-элементов автоматически переносятся на СПП-элемент «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» в зависимости от типа затрат. В случае невыполнения запланированных воздействий на ПА в текущем году и переноса на следующий год, затраты по ним также переносятся на следующий год и не учитываются как экономия на СПП-элементе текущего года.

Активный контроль и корректировка лимитов

Исполнение бюджета воздействий на ПА осуществляется с активным контролем бюджета по каждому СПП-элементу в целом, без разделения по статьям затрат. Под активный контроль попадают затраты на МТР, оборудование и УСО. Под активный контроль не попадают затраты на ТЗР, ФОТ (в т.ч. налоги, резервы).

При каждом сохранении заказа ТОРО либо ОСГ производится активный контроль лимитов на соответствующем СПП-элементе. В случае исчерпания бюджетных лимитов на СПП-элементе, система SAP ERP (активный контроль) не позволяет исполнять воздействия, континированные на этот СПП-элемент (не позволяет деблокировать заказы ТОРО либо ОСГ на месячном горизонте). В этом случае производится корректировка заказа ТОРО либо ОСГ в соответствии с Методическими указаниями «Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирование с использованием в качестве ресурса подрядчика» либо инициируется корректировка бюджетных лимитов. В первом случае после корректировки заказа ТОРО либо ОСГ производится перерасчет затрат на заказе ТОРО либо ОСГ и проверяется на соответствие бюджетным лимитам, во втором – возможны следующие сценарии корректировки бюджетных лимитов:

- перераспределение лимитов без увеличения общего лимита на УО:
 - перенос лимитов с другого СПП-элемента в рамках одного направления – сценарий возможен только для проектов ППА;

- запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УО (в случае наличия средств на СПП-элементе);
- увеличение лимитов на УО:
 - запрос ресурсов из СПП-элемента «Резерв OPEX» или «Резерв CAPEX» на уровне УК (в случае наличия средств на СПП-элементе).

Формирование и согласование запроса на корректировку лимита осуществляется в соответствии с Регламентом Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

Аналитика бюджета

Анализ бюджета ППА и ЦП на предмет план-факт-прогнозной аналитики включает в себя следующие направления:

- Плановый бюджет – бюджет планируемых затрат всех видов воздействий в годовом, среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования. Формируется в соответствии с разделами 4 и 5.
- Фактический бюджет – бюджет, отражающий фактически понесенные затраты годового бюджета по результатам отчетного периода (месяц, квартал, год).
- Прогнозный бюджет – бюджет, включающий в себя фактически понесенные затраты за рассматриваемый отчетный период (месяц, квартал) и плановый прогноз исполнения до конца текущего года с учетом плановых и внеплановых корректировок.

План-факт аналитика может формироваться в следующих разрезах:

- по месяцам/годам;
- по СПП-элементам;
- по типу затрат – OPEX, CAPEX;
- по виду затрат;
- по УО;
- по MB3;
- по способу выполнения работ – хозяйственный способ, подрядный способ.

План-факт аналитика долгосрочного и среднесрочного бюджетов ППА осуществляется по результатам освоения годового бюджета поддержания ПА. На основе проведенного анализа принимаются решения о корректировке состава, сроков и объемов воздействий в долгосрочной и среднесрочной перспективах.

В Системе возможно формирование план-факт отчетности по необходимости в любой текущий момент времени. При этом выводимая в отчеты информация будет иметь характеристики полноты и актуальности, обусловленные дискретностью ввода/загрузки в Систему исходных данных.

6.2. Отчетность по исполнению бюджета воздействий на ПА

В ходе контроля исполнения бюджета воздействий на ПА формируются следующие виды отчетности:

- план-факт-прогноз бюджета воздействий на ПА по освоению в разрезе СПП-элементов и типов затрат;
- план-факт-прогноз бюджета воздействий на ПА по финансированию в разрезе СПП-элементов и типов затрат;
- план-факт-прогноз бюджета воздействий на ПА по вводу ОС в разрезе СПП-элементов.

План освоения, финансирования и ввода ОС в момент планирования базируется на актуальной версии структуры СПП-элементов.

План освоения состоит из значений выделенных сумм затрат по статьям затрат на плановый период (год) в разбивке по периодам (месяцам).

Планирование освоения осуществляется на основе годового бюджета воздействий на ПА. Сумма и период (месяц) освоения бюджета определяется на основе:

- заказов ТОРО (для планируемых работ по заказам ТОРО);
- стоимости этапа проекта и сетевого графика проекта.

Освоение планируется в период (месяц), в рамках которого планируется активирование работ по сетевому графику проекта или техническое закрытие заказа ТОРО.

План финансирования состоит из значений платежей по видам затрат (ПИР, СМР, ПНР, Оборудование, МТР и УСО) на плановый период (год) в разбивке по периодам (месяцам).

Планирование финансирования осуществляется на основе плана освоения по видам затрат, а также условий контрактации с контрагентами (наличие авансовых платежей, условий закрытия этапа работ, гарантийных обязательств). В случае отсутствия условий контрактации с контрагентами план финансирования формируется путем прибавления срока базовой отсрочки платежа, принятой в Компании, к сроку освоения (например, отсрочка платежа на 2 месяца от плана освоения).

План ввода состоит из сумм капитализируемых затрат на плановый период (год) в разбивке по периодам (месяцам).

Планирование ввода ОС осуществляется только по капитализируемым затратам на основе плана освоения (источник полной стоимости капитальных затрат) и сетевого графика проекта (источник сроков ввода ОС).

Отчетность исполнения бюджета воздействий на ПА формируется:

- для БП и ТП в разрезе СПП и групп статей затрат;
- для БФИС в разрезе по всем статьям затрат по ЦФО и МВЗ.

7. Нормативные ссылки

1. ГОСТ 27.002-2009. Надежность в технике. Термины и определения.
2. ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения.
3. Регламент Компании «Бюджетное планирование» (Приказ №61-п от 21.05.2020).
4. Регламент Компании «Программа ТОП (Тотальная оптимизация производства)» (Приказ №80-п от 17.05.2021).
5. Регламент Компании «Управление инвестиционной деятельностью» (Приказ №220-п от 18.12.2020).
6. Регламент Компании «Планирование и контроль бюджета инвестиционного проекта капитального строительства» (Приказ №3-п от 15.01.2021).
7. Регламент взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» и управляемых обществ в процессе формирования, выдачи и пополнения аварийно-технического запаса (АТЗ) (Приказ №151-п от 16.10.2017).
8. Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП) («проект»).
9. Регламент Компании «Управление целевыми программами» (проект).
10. Регламент Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов» (проект).
11. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» (проект).
12. Регламент Компании «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания производственных активов» (проект).
13. Регламент Компании «Договорная работа» (Приказ №5-п от 18.01.2021).
14. Методические указания Компании «Порядок формирования аварийно-технического запаса для оборудования горно-транспортного комплекса» (Приказ №73-п от 26.07.2019).
15. Методические указания Компании «Порядок формирования аварийно-технического запаса для оборудования, участвующего в основном технологическом процессе ЗИФ» (Приказ №200-п от 13.12.2019).
16. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
17. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
18. Унифицированная учетная политика для целей бухгалтерского учета.

8. Библиография

1. Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности, Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №97 от 14.02.2012.

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию МУ является Технический департамент УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в МУ принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения МУ после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Методических указаний

10.1. Контроль выполнения требований Методических указаний

Контроль за соблюдением требований настоящих Методических указаний в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процессов/процедур, для исполнения которых разработаны настоящие Методические указания, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований настоящих Методических указаний.

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Методических указаний в организациях Компании.

11. Список приложений

Таблица №3 «Список приложений»

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	
2	Сопоставление видов затрат Контроллинга и видов затрат ТОО	
3	Методы моделирования плановых затрат в SAP MCB	

Приложение №1

Шаблоны документов

№	Наименование документа	Документ	Способ формирования
1.	Долгосрочный бюджет ППА	 Долгосрочный бюджет ППА (2).xlsx	В системе
2.	Среднесрочный бюджет ППА	 Среднесрочный бюджет ППА (2).xlsx	В системе
3.	Годовой бюджет ППА	 Годовой бюджет ППА (2).xlsx	В системе
4.	Долгосрочный бюджет ЦП	 Долгосрочный бюджет ЦП.xlsx	Вне системы ⁸
5.	Среднесрочный бюджет ЦП	 Среднесрочный бюджет ЦП.xlsx	Вне системы ⁸
6.	Годовой бюджет ЦП	 Годовой бюджет ЦП.xlsx	Вне системы ⁸
7.	Отчет по исполнению бюджета ППА	 План-факт бюджета ППА.xlsx	В системе
8.	Отчет по исполнению бюджета ЦП	 План-факт бюджета ЦП.xlsx	Вне системы ⁸

⁸ До автоматизации функционала планирования и реализации целевых программ в Системе.

Приложение №2

Сопоставление видов затрат Контроллинга и видов затрат ТОРО



Сопоставление
видов затрат.xlsx

Приложение №3

Методы моделирования плановых затрат в SAP MCB

В SAP MCB представлены 2 метода моделирования плановых затрат:

1. Расчет на основании технологических карт
2. Расчет средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей

Метод «Расчет на основании технологических карт»

Стоимость воздействия определяется на основании технологической карты, связанной с планом ТОРО, из которого смоделирован план воздействий на ПА, и плановых цен и тарифов.

Метод «Расчет средней стоимости воздействий в разрезе ЕО/моделей»

Средняя стоимость ремонта ЕО определяется по следующей формуле:

$$\text{Ср стоим ремонта ЕО} = \frac{\text{Сумма затрат за текущий год в рамках одного ЕО и вида воздействия}}{\text{Количество одного вида воздействия в рамках одного ЕО за текущий год}}$$

При отсутствии рассчитанной средней стоимости на ЕО из долгосрочного плана воздействий применяется средняя стоимости ремонта по модели. Для этого определяется перечень ЕО, у которых такая же модель оборудования, как у искомого. Далее расчет средней стоимости осуществляется по следующей формуле:

$$\text{Ср стоим ремонта ЕО} = \frac{\text{Сумма затрат за текущий год в рамках найденных ЕО и одного вида воздействия}}{\text{Количество одного вида воздействия в рамках найденных ЕО за текущий год}}$$

В определении средней стоимости участвуют плановые заказы ТОРО со статусами СГГС, УТВГ, УТВМ, УТВН. Если заказ ТОРО закрыт (статус ЗАКР или ТЗКР), то по нему учитываются фактические затраты по категориям бюджета, иначе – плановые затраты.

Также к средней стоимости по ЕО/модели рассчитывается доля затрат внеплановых заказов ТОРО по следующей формуле:

$$\text{Доля внеплановых заказов ТОРО} = \frac{\text{Сумма затрат внеплановых заказов ТОРО}}{\text{Сумма затрат внеплановых заказов ТОРО} + \text{Сумма затрат плановых заказов ТОРО}}$$
