




УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.4

Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании

часть 4 ЭТАПЫ 3-6. Запуск годовой программы ППА



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 ЭТАП 1. Формирование заказов ТОРО на основе регламентов ППР	
4 ЭТАП 2. Включение заказов ТОРО в годовой план-график воздействий на ПА	6
7 Подведение итогов	16
8 Связанные документы	33
8 Вопросы для закрепления материала	33
8 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения этого учебного модуля обучающийся:


ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Условия размещения потребности в МТР с учётом даты потребности в них и срока поставки (Lead Time).
2. Статусную схему согласования заказов.
3. Порядок и алгоритм балансировки работ между службами.
4. Порядок и алгоритм балансировки мощностей рабочих мест.
5. Свои действия по завершению формирования программы.

ЭТАП 3. Планирование МТР с длительным сроком поставки



ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

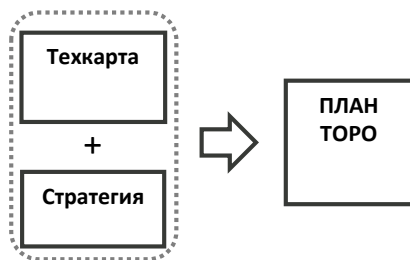

РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)




Какие МТР нужны в первую очередь, чтобы выполнить работы в срок?

РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.


ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый и второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР и услуги с длительным сроком поставки на критичные работы.


ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.


ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

ЭТАП 3. ПЛАНИРОВАНИЕ МТР С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ПОСТАВКИ

Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения

Варианты заказов запасных частей с длительным сроком поставки



Планировщик

Утверждение бюджета происходит в декабре. С учётом сроков поставки (Lead Time) запасных частей мы можем не обеспечить их наличие к требуемому времени, если закажем их после согласования бюджета.

Что необходимо делать в такой ситуации?

Мы формируем отчёт по обеспеченности, в котором подсвечены позиции с длительным сроком поставки и заказы в статусе «СРОЧН», который говорит о том, что материалы заказаны не в Lead Time.

Формируем отчёт по заказам первого квартала планируемого года, анализируем материалы на предмет необходимости их закупа. Направляем отчёт в УК в разрезе № заказа - ЕК МТР для согласования и передачи в закуп.

Из годового отчёта по обеспеченности выделяем заказы в статусе «СРОЧН», формируем по ним отчёты и отправляем в УК по той же схеме для согласования и передачи в закуп. Далее формируем отчёт по срокам поставки в разрезе материалов, выбираем материалы со сроком поставки плюс минус 365 дней. Формируем по ним отчёт и так же отправляем в УК, для согласования и передачи в закуп.

После передачи первоочередных потребностей в МТР и УСО в закупку (заказы ТОРО и сетевые графики на 1 квартал, а также с МТР длительного срока поставки) запрещается удаление/корректировка заказов ТОРО и сетевых графиков с данными потребностями.


Согласование потребности в МТР выполняется Главным специалистом ТОиР УК при помощи «Отчета о доступности материала» для конкретных потребностей заказов ТОРО или сетевых графиков, в сроки указанные в графике годового планирования.



ЭТАП 4. КОРРЕКТИРОВКА ППА С УЧЁТОМ ПОСЛАНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА И УТВЕРЖДЁННЫХ ЛИМИТОВ

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов


ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

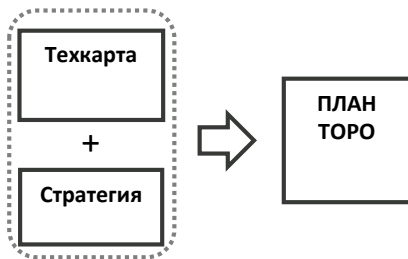

РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.


ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.


ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны некритичные работы из программы ППА.

ЭТАП 5. Балансировка мощностей

Какие работы должны быть выполнены обязательно?

От каких работ возможно отказаться с минимальными последствиями для производства?

РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей и ВПС между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА



ПЛАН-ГРАФИК
ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ПА
НА 1 год

РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



Бюджетный комитет рассмотрел предварительный бюджет и сформировал бюджетное послание с уточнёнными затратами.

Нам надо подготовить уточнённую программу ППА.

Понятно. Я буду ждать предложений по корректировкам программы от бюджетного комитета и, после их получения, буду вносить изменения в годовую программу.



Планировщик

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



Директор по УПА собирает руководителей направления надежности, исполнения, планирования и бюджетирования для принятия решения по исполнению поручения бюджетного послания. Итоги собрания спускаются планировщикам для внесения изменений в систему.

Согласование изменённых заказов в системе производится в соответствии со статусной схемой.

По итогам корректировки производится установка статусов:

- УТВП (утверждён в программе бюджета)
- ТКБЕ (утверждён техническим комитетом БЕ)
- УТВГ (утверждён в годовой программе)

Буду вносить в систему изменения, принятые техническим комитетом, и отправлять их на согласование согласно статусной схеме.




Планировщик

ЭТАП 5. БАЛАНСИРОВКА МОЩНОСТЕЙ

ЭТАП 5. Балансировка мощностей




ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

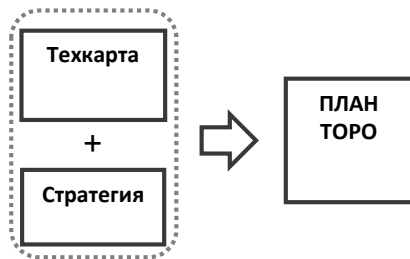

РЕЗУЛЬТАТ:

В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.


ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)



РЕЗУЛЬТАТ:

Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.


ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:

Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.


ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:

Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.

ЭТАП 5. Балансировка мощностей



РЕЗУЛЬТАТ:

Сбалансированы: доступность исполнителей между службами и подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА

Как максимально эффективно организовать работы?



РЕЗУЛЬТАТ:

Программа ППА на каждую ЕО согласована по утвержденной схеме.

Балансировка мощностей



Цель балансировки — возможность выполнения утверждённой годовой программы и перераспределение ресурсов.

По пересмотренной после замечаний годовой программе необходимо провести балансировку заказов ТОРО на предмет:

- Синхронизации работ со смежными службами/подразделениями (выполняется для взаимозависимых ПА, которые относятся к разным службам/подразделениям).
- Балансировки мощностей персонала на уровне подразделений (производится для заказов ТОРО, выполняемых хоз способом).

Я уже выполнял требуемые действия по балансировке на этапе формирования годовой программе (Шаг 3 и Шаг 5).

Теперь я повторю их снова, так как были внесены изменения в годовую программу.



Планировщик


Балансировка мощностей



Калькуляция заказов ТОРО и информирование технического комитета

Плановые тарифы, цены на МТР, работы и услуги или объем ресурсов (материальных, трудовых) могли за время внесения коррективов измениться. Для корректного отражения затрат в бюджете проведем массовую перекалькуляцию заказов.

Если после перекалькуляции стоимость заказов увеличилась, то проинформирую техкомитет для принятия решения.




Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД – планируется, заказ включен в годовую программу ППА)

Перекалькуляция заказов ТОРО

Информирование о изменении технического комитета

Заказ ТОРО (ПЛАН, ГОД, ПКАЛ – планируется, заказ включен в годовую программу ППА, предварительная калькуляция проведена)

ДАЛЕЕ




ЭТАП 6. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ ПРОГРАММЫ ППА

ЭТАП 6. Согласование и утверждение Годовой программы ППА




ЭТАП 1. Актуализация планов ТОРО и формирование предварительного графика ППР

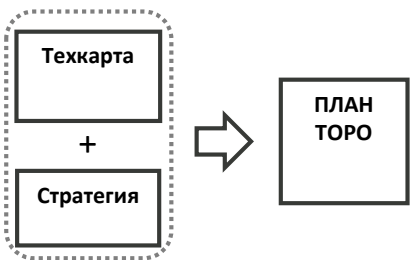


РЕЗУЛЬТАТ:
В системе учтены все ЕО.
Все планы ТОРО включены в предварительный план-график.
Рассчитан КТГ.

ЭТАП 2. Формирование годовой программы ППА (с учётом предварительных ориентиров)




РЕЗУЛЬТАТ:
Выбраны необходимые воздействия (созданы заказы ТОРО). Определены МТР и исполнители. Рассчитана стоимость. Программа ППА отправлена на согласование.

ЭТАП 3. Планирование МТР и услуг на первый второй квартал а так же позиций с длительным сроком поставки/исполнения



РЕЗУЛЬТАТ:
Заказаны МТР с длительным сроком поставки на критичные работы.

ЭТАП 4. Корректировка ППА с учётом послания бюджетного комитета и утверждённых лимитов



РЕЗУЛЬТАТ:
Затраты на ППА и КТГ соответствуют установленным лимитам.
Убраны не критичные работы из программы ППА.


ЭТАП 5. Балансировка мощностей



Учтены интересы и возможности всех заинтересованных сторон?
Переходим к оперативному планированию?

РЕЗУЛЬТАТ:
Сбалансирована доступность исполнителей и ВПС между службами, подразделениями и время воздействий.

ЭТАП 6. Итоговое согласование (Итерация 2) и утверждение Годовой программы ППА



РЕЗУЛЬТАТ:
Программа ППА на каждую ЕО согласована по статусной схеме.

Согласование и утверждение годовой программы ППА

Шаг 1. Завершение планирования годовой программы ППА

По результатам проверки и балансировки всех ресурсов на заказах ТОРО Планировщик с помощью АРМ Планировщика ТОиР устанавливает на заказах ТОРО или сетевых графиках статус «СГПЛ» и уведомляет по электронной почте Старшего планировщика ТОиР о завершении планирования годовой программы ППА.



Согласование и утверждение годовой программы ППА




Шаг 2. Согласование годовой программы ППА

Последовательность согласования Программа ППА:

- согласование Старшим планировщиком ТОиР – на заказах ТОРО и сетевых графиках устанавливается статус «ССПЛ – согласовано Старшим планировщиком ТОиР». Срок рассмотрения и согласования – не более 3 рабочих дней;
- согласование Главным специалистом ТОиР УО – на заказах ТОРО устанавливается статус «СГГС – согласовано Главным специалистом ТОиР». Срок рассмотрения и согласования – не более 3 рабочих дней;
- согласование Специалистом ПТО – на заказах ТОРО устанавливается статус «ПТОГ – согласован ПТО в годовой программе ППА». Срок передачи данных по КТГ устанавливается в соответствии графиком годового планирования. Срок рассмотрения и согласования – не более 15 рабочих дней после передачи данных по КТГ;
- согласование Директором по УА УО – после согласования годовой программы ППА, на заказах ТОРО Старшим планировщиком ТОиР устанавливается статус «ГИП – согласован главным инженером». Срок рассмотрения и согласования устанавливается в соответствии графиком годового планирования.

Все замечания к программе согласующими лицами выдаются в рамках очного рассмотрения УК либо в рабочем порядке. Для внесения изменений Планировщик ТОиР устанавливает на заказах ТОРО статус «КОРР – требует корректировки» и выполняет требуемые корректировки с последующим повторным согласованием годовой программы ППА.

После согласования программы (Итерация 2) производится срез данных в системе и заказы блокируются для изменений. Дальнейшая корректировка заказов возможна только в рамках оперативного планирования Января.

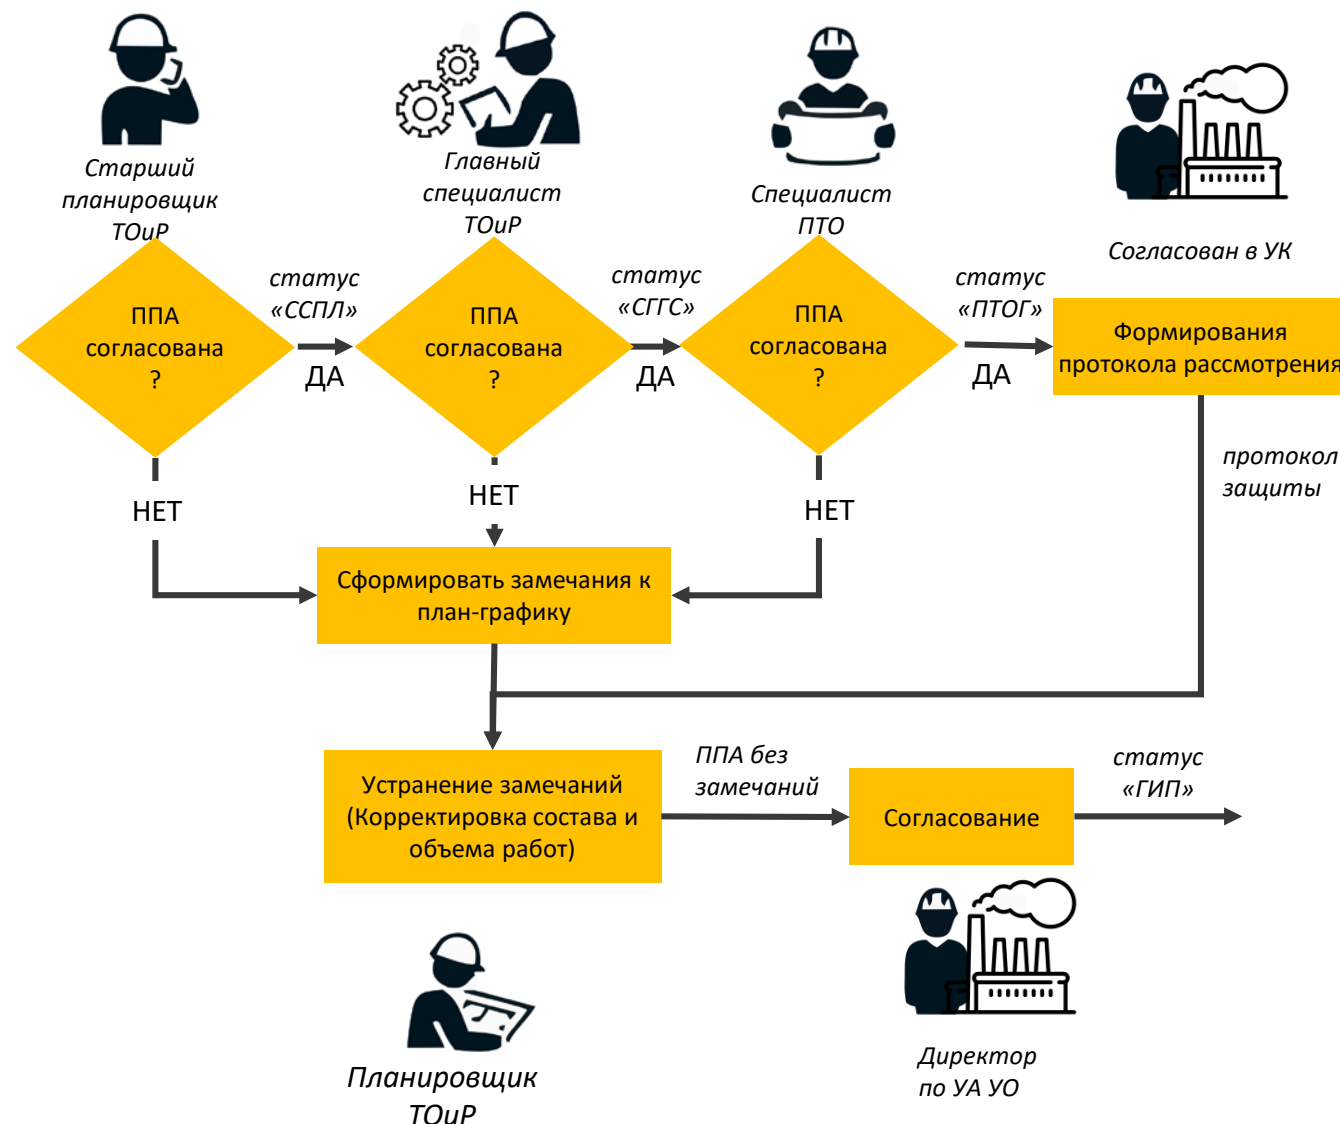

Согласование и утверждение годовой программы ППА




Шаг 2. Согласование годовой программы ППА

Старший планировщик ТОиР, главный специалист ТОиР, Специалист ПТО проверяют:

- Устранение замечаний протокола защиты программы ППА в УК.
- Исполнение поручений бюджетного послания.
- Соответствие предварительным ориентирам бюджета.

При выявлении замечаний формирует лист замечаний к план-графику и возвращает Планировщику ТОиР УО на корректировку/перепланирование.

В случае отсутствия замечаний, Старший планировщик ТОиР УО согласовывает план-график воздействий на ПА и устанавливает для заказов ТОРО статус «ССПЛ - Согласовано старшим планировщиком ТОиР УО».

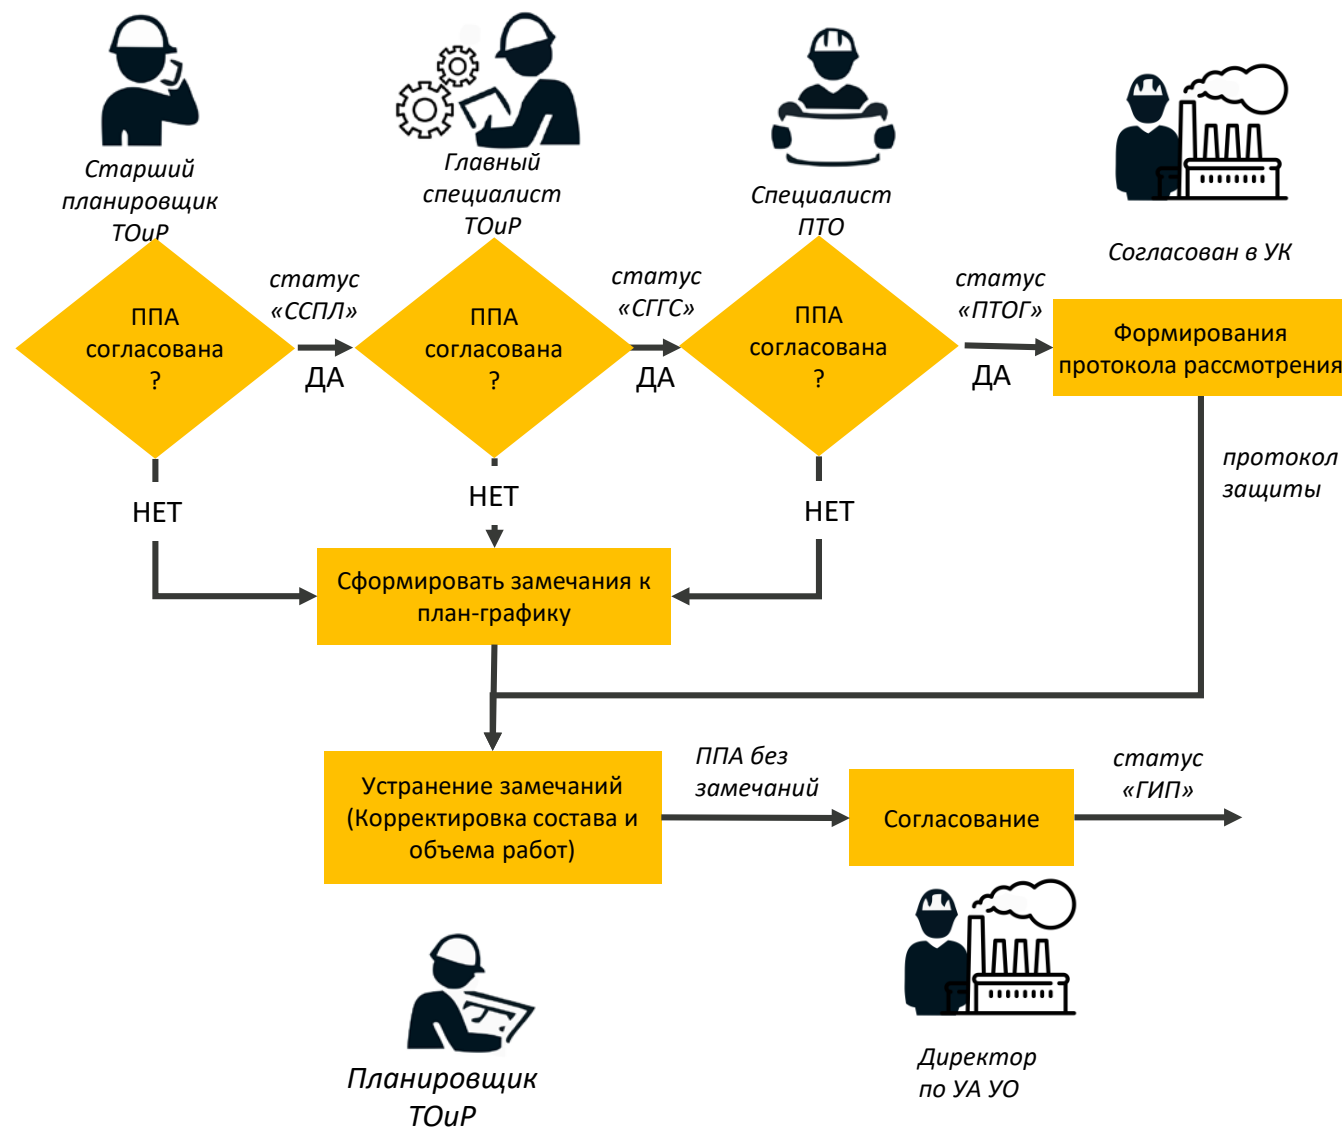

Согласование и утверждение годовой программы ППА



Шаг 4. Уточнение годовой программы ППА после утверждения бюджета


По результатам утверждения программы ППА фиксируются лимиты бюджета на СПП-элементах и осуществляются следующие действия:

Проставляется статусы ГИП,ГОД,УТВП, УТВГ на всех заказах включенных в программу.

Данные передаются в систему МСВ для согласования с финансовым блоком.

При согласовании МСВ на заказах устанавливается статус ТКБЕ и фиксируется срез годового бюджета. Снимается блокировка заказов.

Процесс годового планирования считается завершенным, программа ППА переводится в процесс оперативного планирования и исполнения.

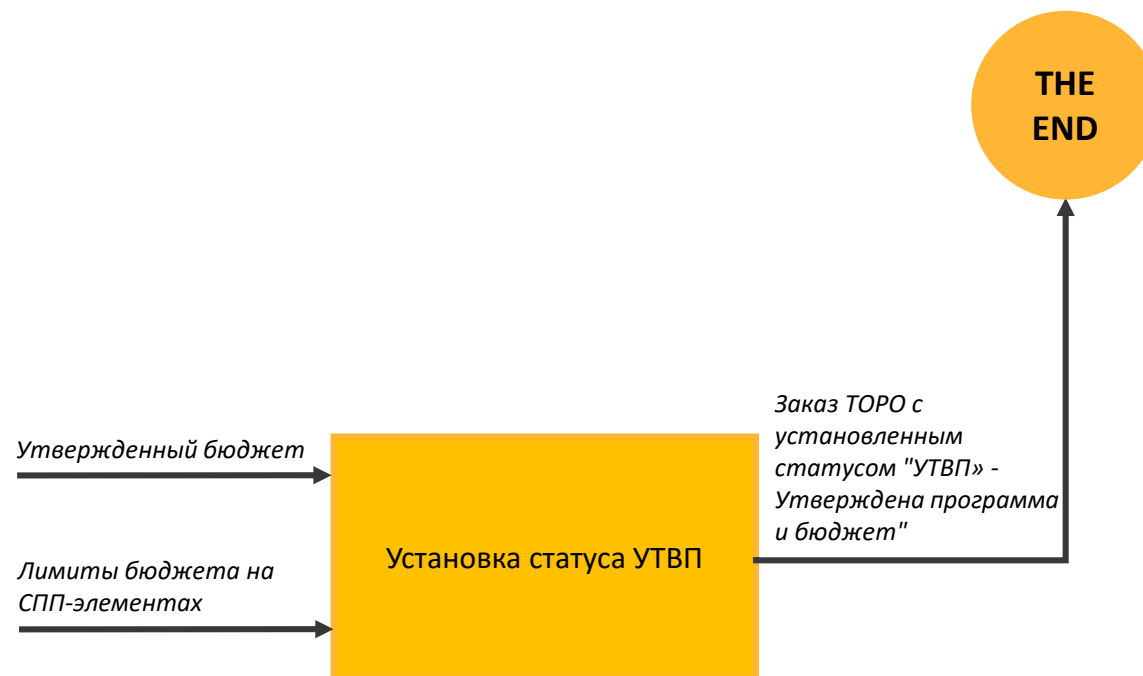



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов





ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



...

1. ...



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0
2	Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebdda4fc4ae4dc0

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТООИР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.4 «Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании».
ЧАСТЬ 2. Формирование годовой программы и бюджета ППА»
